

被災跡地の地区別進捗管理表

資料7

令和元年9月30日現在

○土地利用方針図の見直し（実現化方策の策定）を行う地区


[凡例] ● 実施済（あり） ○ 実施中 — 該当なし（なし） △ 検討中

No.	地区名	状況					土地利用方針図の改定作業										計画に位置付けた事業			
		H23利用方針	復興組織の有無	提言書等	土地買取	土地集約	復興組織の検討状況			素案作成	素案合意(※1)	懇談会	素案修正	議会説明	公表	事業数	実施調整(※2)	事業着手	事業完了	着手(完了)済の主な事業
							準備	検討	まとめ											
1	地ノ森（新田）	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業
2	下船渡	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業
3	細浦	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	2	2	1	広場整備事業、道路新設改良事業
4	小河原	●	●	—	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	産業用地整備事業
5	泊里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	1	1	0	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	
6	碁石	●	●	●	●	○														
7	赤崎	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	0	0	
8	綾里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	2	2	1	道路改良事業、広場整備事業
9	甫嶺	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	3	1	道路新設改良事業、道路取付改良、校舎利活用事業
10	泊	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	2	2	2	道路改良事業、広場整備事業	
11	浦浜	●	●	●	●	○														
12	崎浜	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	消防屯所の整備箇所検討

(※1) 復興組織の合意状況 (※2) 財源の確保、実施所管課の調整、復興組織とのすり合わせ等

○土地利用方針図の見直しを行わない地区

No.	地区名	状況					備考
		H23利用方針	復興組織の有無	提言書等	土地買取	土地利用	
13	盛	●	—	—	●	○	譲渡・貸付
14	赤土倉	—	—	—	—	—	
15	蛸ノ浦	●	—	●	●	○	譲渡・貸付
16	長崎	●	—	●	—	—	
17	合足	●	—	●	—	—	
18	小路	—	—	—	—	—	
19	野々前・白浜	●	—	●	—	—	
20	砂子浜	●	—	●	—	—	
21	小石浜	●	—	●	●	—	譲渡・貸付
22	小壁	—	—	—	—	—	
23	吉浜	●	—	—	●	—	譲渡・貸付
24	扇洞	●	—	—	—	—	
25	根白	—	—	—	—	—	
26	千歳	●	—	—	—	—	

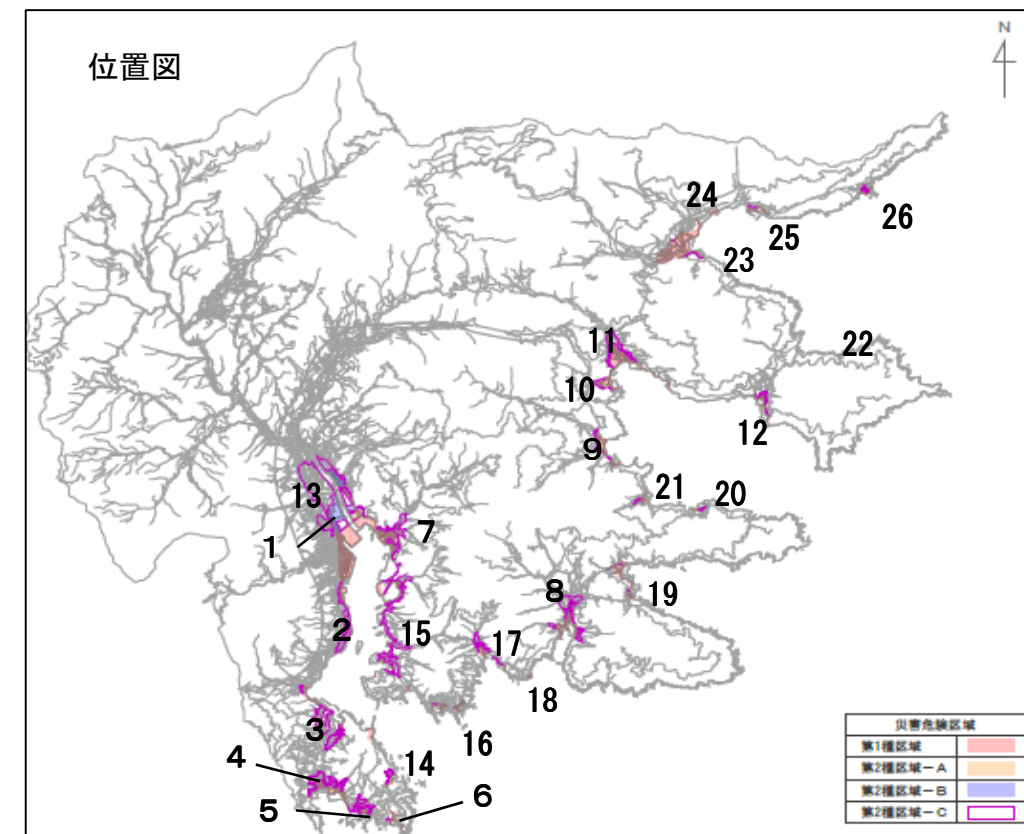

被災跡地土地利用実現化方針に位置づけた事業（予定を含む）の状況について

【凡例】

事業名のハッチ
 : 市が実施主体の被災跡地を利用した復旧・復興事業
 : その他の復旧・復興事業
 : 住民・企業が主体の取組

見込区分（目安）
 A : 実施中、実現の見込み大
 B : 実現の可能性はあるが時期等調整
 C : 見込みがたっていない

進捗
● : 実施済
○ : 実施中
 - : 該当なし

令和元年9月30日現在

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗（市）					進捗（地域）			現在の状況	活用する移転元地（㎡）	概算事業費（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		（平成31年度）令和元年度		（平成32年度）令和2年度		担当課等			
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施	完了				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月						
						設計		工事		設計		工事																				
地ノ森（新田）	1	市	内水排水対策事業	地ノ森（新田）地区 道路、橋梁、小水路の嵩上げ	A	●	●	●	○	-	-	-	・復興交付金（一件審査）配分済 ・測量設計 H28.9 完了 工事施工中 ・公共残土により民有地の嵩上げを実施済 ・県道整備施工中（車道の嵩上げ完了、歩道一部残し）	-	402,858		設計		工事									建設課				
	2	市	内水排水対策事業	下船渡地区 小水路の嵩上げ	A	●	●	○	-	-	-	-	・復興交付金（一括配分）配分済 ・県道整備に合わせて工程を調整	-	92,425				設計		工事							建設課				
下船渡	3	県	復興関連道路整備事業 （県道丸森権現堂線）	L=2,100m、W=6.0(11.5, 16.0)m	-	-	-	-	-	-	-	・カメイタンク下～久保田鉄工付近 用地測量・買収等を経て、H30.4から工事着手 ・久保田鉄工以南、現道拡幅を主とする線形に計画変更 →3月に地権者説明会を開催。下船渡駅以南対象の 説明会では出席者から計画変更に対する意見あり →6/26、7/25に公民館役員等と意見交換	-	-					※カメイタンク下～久保田鉄工付近 設計		工事							土木C （道路整備課）				
																											土木C （道路整備課）					
細浦	4	市	コミュニティ広場の整備	A=約0.3ha 四阿、ベンチ、水飲み場等	A	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金（一括配分）配分済 ・約0.3haの用地を確保（土地交換は約263㎡） ・交換不能な民有地1筆は買収済 ・測量設計 H30.7 完了 ・工事 H31.3 完了	2,907	44,717					設計	工事					●H31.3月完了	土地利用課					
	5	市	避難路の整備	避難路の新設（陸間からの避難階段） L=25m、W=2.0m	B	○	-	-	-	-	-	-	・陸間整備（R2年度）と調整を図り整備 ・復興交付金の再協議を予定（R1年度）	-	11,333												↓陸間整備と調整	設計	工事	土地利用課		
	6	県	海岸保全施設整備事業 （細浦漁港分）	防潮堤・水門	-	-	-	-	-	-	-	-	・陸間整備の前倒しを検討 →陸間整備はR2年度整備で確定とのこと	-	-	工事												水産振興C （漁港管理課）				
	7	市	嵩上げの検討	水路改修・道路の嵩上げ	C	○	-	-	-	-	-	-	・復興庁から周辺土地利用の確度を示すよう指示あり →H30年度 再度民有地の意向調査を実施済 ・一体利用区域（細浦A）について市内企業の利用意向 R1.7.24 地権者説明 7.26 津波補助金採択内定 県による土砂の仮置きは撤去済み（R1.9） 企業では10月の交付決定を受け、用地買収着手予定 内水排水対策として復興庁協議中	-	107,736															設計	工事	土地利用課
	8	市	市道の整備	峰岸防集団地からまちづくり連携道路への 接続道路整備	A	●	●	●	○	-	-	-	・復興交付金（一括配分）配分済 ・用地測量済・工事施工中（H31.1～）	-	99,452						設計	工事							建設課			
9	地域	朝市の運営・広場の維持管理	復興朝市の継続運営・広場の維持管理 （※No.4にかかる地域の取組）	-	-	-	-	-	-	○	○	・H31.4.1～ 細浦地区再生協議会が指定管理 ・H31.4.28 お披露目会・復興朝市の運営も継続	-	-														朝市の継続運営	広場の維持管理	地域		
小河原	10	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3.2ha	A	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金（一括配分）配分済 ・測量設計 H29.6 完了 ・敷地造成工事 H30.1 完了 ・その2工事（防火水槽）H30.3 完了	18,548	101,516					設計	工事						●H30.3月完了	土地利用課				
	11	企業	誘致企業の施設整備	大規模施設園芸 ・トマトの施設栽培 ・高度環境制御栽培施設 ・施設面積 約1.7ha（作付 約1.5ha）	-	-	-	-	-	-	-	-	・産地PU補助決定済・当初契約を解除、再契約 ・H30.4 施設建設開始 ・H31.3 市、県の完了検査を実施済 ・R1.6 定植作業実施 ・R1.8 出荷開始（8月の実績：80.2トン）	-	-													施設整備	●H31.3月完了	企業		
泊里・基石	12	市	避難路の整備	避難路の復旧 （赤道の復旧改良）	C	○	-	-	-	-	-	-	・復興交付金、社総交とも非該当 ・単費整備を検討する必要あり ・緊急防災・減災事業債を財源検討	-	12,000														※財源調整中・スケジュール未定	土地利用課		
	13	市	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	基石浜背後地を盛土整地し、駐車場として 利用（盛土材は県と市の工事発生土を 利用、水路等の処理は県工事負担を想定）	A	○	-	●	○	-	-	-	・県の財源で整備予定（残土処理事業での対応） ・測量設計済、国立公園許可済（土砂受入可能） ・地域主体で6/16～17に第2回モニターツアーを実施済 ・防潮堤工事（岩手県）と水道工事の発生土を受入中 →土砂入れはR1.12完了予定	-	0					設計								工事（土砂搬入）		（工程再調整）	土地利用課	
	14	市	津波資料としての地層の保存	過去津波の痕跡資料 過去に大学教授が取り出した地層（博物館に 保管）の展示	B	○	-	-	-	-	-	-	・上記の駐車場整備と合わせて地域と協議 ・既存資料の活用であり、基本的に財源は不要	-	0														調整	土地利用課		
	15	市	多目的広場の整備	地域が地権者から土地の借受け等を行 い、広場として利用 A=約1.0ha	-	-	-	-	-	-	○	○	・地域が継続検討中 ・民有地の利用意向、状況を踏まえた区域設定が必要	-	-															地域の取組	地域	
	16	地域	蓮田の管理	鎮魂や自然学習のための蓮田 民地を借り受けた地域による整備・管理	-	-	-	-	-	-	●	●	・地域において整備済 ・適切な手入れ、管理を継続中	-	-															地域の取組	地域	
	17	地域	椿の葉集荷場・椿畑の整備	椿利用のための集荷場・畑の整備 将来的に実や葉を活用した産業創出を模 索	-	-	-	-	-	-	○	○	・買取地約600㎡を先行整備 ・椿学習の一環で中学校2校で70本のヤブツバキを植樹 ・適切な手入れ、管理を継続中	2,000	-															地域の取組	地域	
18	地域	避難路の整備	地域による避難路整備 （市は資材を提供）	-	-	-	-	-	-	●	○	・計画3路線のうち1路線を整備済 （市から資材提供） ・今後、地域では段階的な整備を予定	-	-															地域の取組（1路線を先行整備）	地域		

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗(市)				進捗(地域)			現在の状況	活用する移転元地(m ²)	概算事業費(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(平成31年度)令和元年度		(平成32年度)令和2年度		担当課等	
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施				完了	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月		10~3月
																	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月					
赤崎	19	市	スポーツ交流ゾーンの検討(用地整備)	防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの整備 A=約4.3ha	B	○	○							29,213	未定									検討・調整・用地確保	設計	工事	土地利用課		
	20		スポーツ施設の整備検討(施設整備)	施設整備の検討・方針決定 関係団体・市民の合意形成	C	○										未定									検討・調整			生涯学習課	
	21		赤崎復興市の常設化	買い物や交流の場として、復興市を常設化するための施設等整備	C	○										未定									(市民の合意形成・議会説明等)	設計	工事	土地利用課	
	22		防災交流拠点の整備	震災の教訓を踏まえ、広く防災を学べる場として防災交流拠点を整備 漁村センターの改修整備を予定	A	○	○									未定									検討・調整	設計	工事	防災管理室 土地利用課	
	23	地域	スポーツ交流ゾーンの活用	スポーツ交流ゾーンの活用促進につながる取組の検討	-	-	-	-	-	○					-	-												地域	
	24		赤崎復興市の運営	赤崎復興市の開催運営	-	-	-	-	-	○					-	-												地域	
	25		防災交流拠点の運営	防災交流拠点の運営と維持管理 体験プログラムの検討・実施	-	-	-	-	-	○					-	-												地域	
綾里	26	市	緑化広場の整備	A=約0.2ha	A	●	●	●						2,273	42,719													土地利用課	
	27		市道開墾線道路改良事業	拡幅改良 L=430m、W=約5.5m	A	●	●	●	●	●						90,896													建設課
	28	市	市道黒土田線道路改良事業	道路の嵩上げ L=125m、W=6.0m	C	○									21,489													水産課	
	29	県	漁港関係施設等災害復旧事業(綾里漁港海岸)	防潮堤等の整備	-	-	-	-	-	-	-																	水産振興C(漁港復旧課)	
	30	市	市道港田浜線道路改良事業	拡幅改良 L=180m、W=6.0m	C	○									56,000													土地利用課	
	31	市	漁業集落防災機能強化事業	水産施設用地・集落道の整備	-	●	●	●	○	○					4,967	132,686												水産課	
	32	市	市道石浜線・石浜海岸線道路改良事業	拡幅改良 L=未定、W=未定	A	●	●	○							未定													土地利用課 建設課	
	33	地域	緑化広場の維持管理	広場の維持管理 (※No.26にかかる地域の取組)	-	-	-	-	-	○	○																	地域	
甫嶺	34	市	市道甫嶺横断線道路新設改良事業	迂回路となる道路を新設 L=720m、W=5.0m	A	●	●	●	○						440,000													建設課	
	35		住民協働による拠点の検討・運営	閉校となった旧甫嶺小学校を改修整備し、宿泊交流機能等を持った(仮称)甫嶺復興交流推進センターを開設する。▽主な取組 ・地域活動、交流イベントの企画運営 ・地元や来訪者への貸室 ・宿泊サービス ・テナント貸室(連携民間企業が入居)	B	○	●								191,252	検討													新産業戦略室 土地利用課 学校教育課
	36		農業的土地利用への誘導(先行誘導地)	農業のための土地利用への誘導	-	●	-	-	-	-	-	-																	土地利用課
	37	避難路の整備(既設の取付改良)	主要地方道への取付勾配改良	A	●	●	●	●	●						19,011													水産課	
	38	地域	三陸鉄道との協働による植樹帯の整備	甫嶺駅前への植樹帯整備	-	-	-	-	-	○	○																		地域
	39		蕎麦栽培	共同菜園 蕎麦を共同で栽培 イベント化	-	-	-	-	-	●	●	●																	地域
	40		ピオトープ	甫嶺駅海側を自然体験場と位置付け	-	-	-	-	-	○																			地域
	41		見晴台	矢作川河口付近への見晴台整備	-	-	-	-	-	○						1,100													地域
42	シーカヤック活動拠点		シーカヤック体験場と位置付け	-	-	-	-	-	-	-	-																	地域	

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗(市)					進捗(地域)			現在の状況	活用する移転元地(m ²)	概算事業費(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(平成31年度)令和元年度		(平成32年度)令和2年度		担当課等		
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施	完了				4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月		4~9月	10~3月
浦浜・泊	43	市	浦浜川東側添線道路改良事業	津波等時に溢水しないよう嵩上げ L=200m	A	●	●	●	●	●	-	-	-	・社総交(復興)採択済 ・測量設計 H29.3 完了 ・工事 H30.3 完了	400	70,000			設計		工事	●H30.3月完了							建設課		
	44		沖田シミア沢線改良事業	道路改良 L=145m、橋梁復旧	C	○						-	-	-	・復興交付金、社総交(復興)とも非該当 ・H28.8 地元要望→車道橋要望は地元の総意 ・仮橋の暫定使用にあたり、県から受け継ぎ済 ・今後、通行量調査を実施の上、本設の可否検討を予定 →4/19、7/5に実施済み 分析結果に基づき対応検討中	-	153,117					仮橋利用(本設の可否検討) (R1年度 通行量調査を実施済)								土地利用課	
	45		浦浜地区多目的広場整備事業	A=2,400m ² トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場等の整備	A	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金(一件審査)配分済 ・工事 H30.4 完了 ・指定管理 H30.5 開始(浦浜泊連絡協議会) ・オープニングイベントを開催済(H30.5.27) ・イベント利用が増加 →イベントに合わせ地域がマルシェ等を開催	2,400	54,450			設計		工事	●H30.4月完了							土地利用課		
	46	市	漁業集落防災機能強化事業(浦浜地区・嵩上げ)	県道・主要地方道の背後地の嵩上げ	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金配分済 ・工事(H26.12~H29.9) ・H29.9 完了	-	564,239	工事					●H29.9月完了							水産課		
	47		漁業集落防災機能強化事業(浦浜地区・水産施設用地)	水産施設用地の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金配分済 ・工事(H29.12~H30.5) ・H30.5 完了	3,770	30,244			設計		工事	●H30.5月完了							水産課		
	48		漁業集落防災機能強化事業(泊地区・水産施設用地)	水産施設用地の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金配分済 ・工事(H29.11~H30.6) ・H30.6 完了	4,202	116,293			設計		工事	●H30.6月完了							水産課		
	49	地域	雄滝・雌滝の遊歩道づくり	泊防集団地から雄滝・雌滝へ通じる遊歩道づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・地域で継続して取組中 ・今後も1~2回/年の整備が行われる予定 ・地域主体の取組として定着	-	-	地域の取組												地域		
	50		三陸駅~大王杉観光ルートづくり	まちづくりの軸とする観光ルートづくり	-	-	-	-	-	-	○			・検討を継続中	-	-	地域の取組												地域		
	51	県	まちづくり連携道路整備事業(主要地方道大船渡線三陸線)	L=1,000m、W=6.0(10.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・H27 着工 ・H28 道路改良工、舗装工 ・H29.9 完成	-	-	工事					●H29.9月完了							土木C (復興まちづくり課)		
	52	地域	原っぱの整備	地域が主体となり被災跡地を原っぱとして活用	-	-	-	-	-	-	○			・検討を継続中 ・植栽などに取組中	2,000	-			地域の取組										地域		
	53	県	まちづくり連携道路整備事業(一般県道崎浜港線)	L=700m、W=6.0(10.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・H27 着工 ・H28 道路改良工、舗装工 ・H29.9 完成	-	-	工事					●H29.9月完了							土木C (復興まちづくり課)		
	54	地域	四阿の設置	鎮魂・憩場として未音崎(みねざき) 眺望台を整備	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・地域において未音崎(みねざき)眺望台を整備済 ・適切に維持管理を継続中	-	-	地域の取組		●H27.7月完了										地域		
	55		商店街整備	さんりくの園跡地へ商業店舗を集積	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・浦浜サイコー商店街として整備済 ・現在はイベント支援などの取組	-	-	地域の取組		●H27.7月完了									地域			
	56		ポプラの橋広場の整備	※浦浜地区多目的広場として整備	※浦浜地区多目的広場として整備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※浦浜地区多目的広場として整備	-	-	●浦浜地区多目的広場へ振り替え											地域		
57	結いの道		泊地区の集落を結ぶ歩道づくり	泊地区の集落を結ぶ歩道づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・ウッドチップの敷設を実施中(継続) →東海大の支援プロジェクト →H30年度は第3期工事(150mの砂利敷)完了	-	-			地域の取組									地域			
58	結っ小屋	地域の小さな拠点(集会所)づくり	地域の小さな拠点(集会所)づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・H27年度に建設(移設)済 ・適切な管理が継続されている	-	-	●H27.4月完了											地域				
崎浜	59	市	コミュニティ広場の整備	憩いや交流の場としての広場整備	-	●	-	-	-	-	-	-	・用地が確保できず取りやめ ・取りやめは地域と協議済 ・旧小学校跡地への機能配置を検討予定	-	-	※取りやめ(用地集約不可能)												土地利用課			
	60		消防屯所の整備箇所検討	旧崎浜小学校校庭への整備検討 木造平屋建 建築面積 91.91m ²	A	●	●	●	●	●	-	-	-	・用地測量 H29.12 完了 ・H30.10 完了	-	23,320			検討(地域調整)		測量	工事	●H30.10月完了						消防署		
	61	地域	コミュニティ広場の維持管理	広場の維持管理	-	-	-	-	-	-	-	-	※取りやめ (機能移設により再検討を予定)	-	-	※取りやめ(用地集約不可能)												地域			
	62		浜らいの運営	地域集会施設の運営	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・適切に維持管理を継続中 (旧小学校への移設を検討予定)	-	-	地域の取組												地域		
63	市	漁業集落防災機能強化事業(水産施設用地・集落道)	水産施設用地・集落道の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金一部配分済 ・H29.3 1期工事完了 R1.9 2期工事完了	3,772	251,984	設計		工事									●R1.9月完了	水産課			
浦浜	64	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約0.9ha	A	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金(一括配分)配分済 ・測量設計 H30.12 完了 工事 R1.6.19 完了 ・企業による地域向け説明会を開催済(R1.7.31) ・企業に対して事業用地を貸付済(使用貸借契約)	9,188	50,876					調整	設計	工事	●R1.6月完了					新産業戦略室 土地利用課		
	65	企業	企業の施設整備	イチゴの周年施設栽培 ・イチゴ生産・担い手育成拠点施設 ・施設面積 約0.5ha	-	-	-	-	-	-	-	-	・R1年度分(1期工事)の地方創生推進交付金 採択済 →施設整備は2ヶ年構想 ・1期工事は作業棟・栽培棟・育苗棟など整備予定 ・地鎮祭実施済(R1.9.14)	-	-									施設整備	施設整備			企業			
全地区	66	市	移転元地の譲渡・貸付	防集買取地の譲渡・貸付	-	-	-	-	-	-	-	-	・買取済 829筆 246,046m ² ・譲渡貸付 165筆 48,843m ² (約20%) ・民有地を含めた被災跡地の有効活用取組中	48,843	-			段階的に公募→譲渡貸付										土地利用課			

活用する(予定を含む)移転元地(m²) 計 135,583

被災跡地（防集買取地）の譲渡・貸付け状況

令和元年9月30日現在

地区	買取状況						土地利用の状況								未利用・未活用の状況							
	買取対象		買取予定		買取済 A		譲渡 ①		貸付 ②		土地利用 ③		合計 B ①+②+③		公募中 ④		調整中 ⑤		合計 C ④+⑤			
	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)		
土地利用計画策定地区 (1-2)	大船渡	77	17,927	77	17,927	77	17,927	12	2,641	19	4,348	9	1,590	40	8,579	23	5,882	16	3,465	39	9,347	
	下船渡																					
	細浦	85	25,690	85	25,690	85	25,690	3	718	23	6,425	8	2,824	34	9,967	30	10,088	25	5,633	55	15,721	
	小河原	163	43,703	163	43,703	163	43,703			26	9,449	78	17,911	104	27,360	55	14,736	8	1,607	63	16,343	
	泊里									2	553	1	515	3	1,068	11	5,658	2	414	13	6,072	
	基石	16	7,140	16	7,140	16	7,140															
	赤崎	204	63,242	204	63,242	186	55,628	1	212	41	12,712			42	12,924	16	3,845	128	38,859	144	42,704	
	綾里	65	16,362	65	16,362	65	16,362	1	230	3	602	30	7,109	34	7,941	26	6,261	7	2,160	33	8,421	
	泊	29	13,447	29	13,447	29	13,447					9	4,994	9	4,994	17	7,668	3	785	20	8,453	
	甫嶺	18	6,561	18	6,561	18	6,561			2	295			2	295	16	6,266			16	6,266	
	浦浜	105	36,792	105	36,792	105	36,792	1	250	11	3,988	38	13,002	50	17,240	42	12,875	13	6,677	55	19,552	
	崎浜	39	9,880	39	9,880	39	9,880			6	2,020	21	5,561	27	7,581	12	2,299			12	2,299	
小計	801	240,744	801	240,744	783	233,130	18	4,051	133	40,392	194	53,506	345	97,949	248	75,578	202	59,600	450	135,178		
その他の地区 (1-4)	盛	9	2,247	9	2,247	9	2,247	5	981	1	99			6	1,080	6	1,167			6	1,167	
	赤土倉																					
	蛸ノ浦	32	9,389	32	9,389	32	9,389	1	415	7	2,905			8	3,320	25	6,070			25	6,070	
	長崎																					
	合足																					
	小路																					
	野々前・白浜																					
	砂子浜																					
	小石浜	1	516	1	516	1	516									1	516			1	516	
	小壁																					
	吉浜	4	764	4	764	4	764									4	764			4	764	
	扇洞																					
根白																						
千歳																						
小計	46	12,916	46	12,916	46	12,916	6	1,396	8	3,004	0	0	14	4,400	36	8,517	0	0	36	8,517		
合計	847	253,660 (25.4ha)	847	253,660 (25.4ha)	829	246,046 (24.6ha)	24	5,447 (0.5ha)	141	43,396 (4.3ha)	194	53,506 (5.4ha)	359	102,349 (10.2ha)	284	84,095 (8.4ha)	202	59,600 (6.0ha)	486	143,695 (14.4ha)		

※ 土地利用の主な事業
 大船渡地区……津波復興拠点事業
 細浦地区……広場整備事業
 小河原地区……産業用地整備事業
 綾里地区……漁業集落防災機能強化事業、広場整備事業
 泊地区……漁業集落防災機能強化事業
 浦浜地区……漁業集落防災機能強化事業、広場整備事業、
 産業用地整備事業
 崎浜地区……漁業集落防災機能強化事業

貸付内訳
 工事関係 86件 25,685㎡
 工事以外 55件 17,711㎡

(注1) 買取り後に分筆や分割利用を行っている土地があるため、土地利用の合計(B)と未利用・未活用の合計(C)の合算値が、買取済(A)の筆数及び面積と一致しない地区がある。

(注2) 「譲渡」は売却したもの、「貸付」は有償及び無償(公共的団体)で貸しているもの、「土地利用」は市事業等で使用しているもの、「公募中」は譲渡・貸付の希望者を募集しているもの、「調整中」は公共工事等での利用候補地となっているもの、利用に適さないもの(接道なし)など。
