
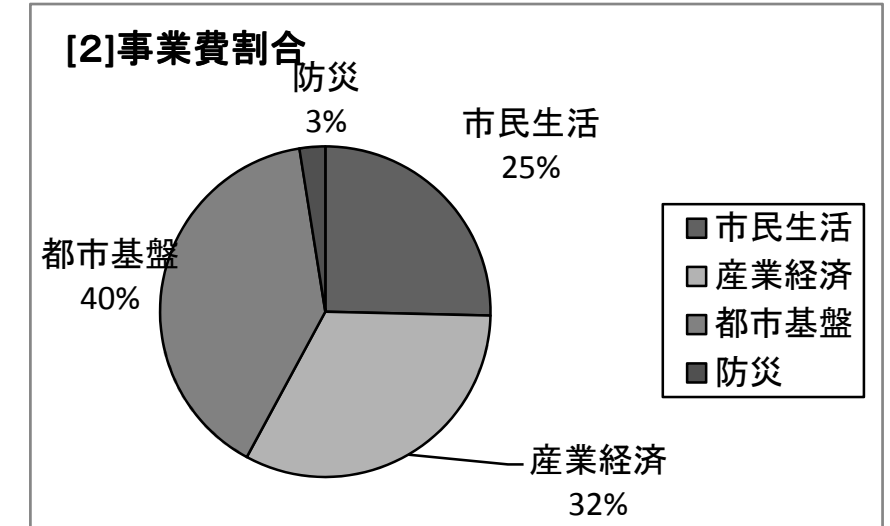


# 大船渡市復興計画事業の進捗状況

令和元年9月30日現在

## [1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		143	
着手済	(1)	113	34
	(2)		45
	(3)		5
	(4)		29
検討中		0	
未着手		0	
計		256	
整理・統合等		20	

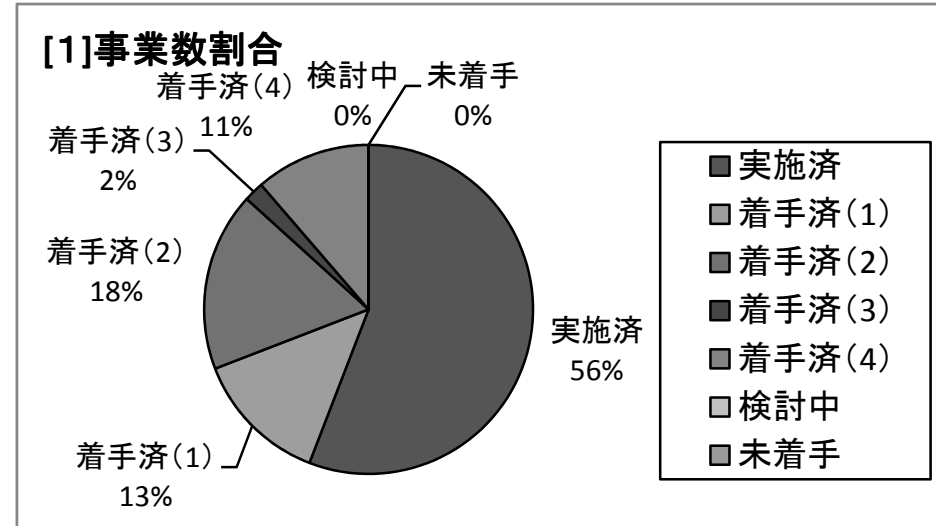

### ※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

## [2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画(百万円)														
		財源内訳(百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	令和2年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	105,061	48,599	9,758	2,265	33,900	10,539	18,178	17,398	23,558	11,640	13,700	13,382	3,060	1,815	1,464	866
産業・経済の復興	134,552	47,316	61,279	3,470	15,978	6,509	9,870	19,059	29,460	22,166	15,462	10,762	7,880	4,497	7,072	8,324
都市基盤の復興	163,937	32,260	86,379	3,310	31,113	10,875	3,915	10,483	17,914	21,821	19,956	28,387	26,503	15,228	14,907	4,823
防災まちづくり	10,392	2,118	24	69	6,452	1,729	131	2,173	2,415	4,554	414	365	144	99	63	34
合計	413,942	130,293	157,440	9,114	87,443	29,652	32,094	49,113	73,347	60,181	49,532	52,896	37,587	21,639	23,506	14,047
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							154,554(37.3%)			162,609(39.3%)			96,779(23.4%)			

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成30年度)→: 376,389百万円÷総事業費: 413,942百万円=90.9%

※着手済事業の(1)・(2)の平成31年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=91.4%

参考(前回調査時)

(H31.3.31現在)	414,116	130,328	158,121	9,107	87,042	29,518	32,094	49,112	73,273	60,191	49,531	52,898	37,585	23,563	23,671	12,198
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							154,479(37.3%)			162,620(39.3%)			97,017(23.4%)			

### ■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 458億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 712億円	・港湾施設復旧事業 380億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 164億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・道路新設・改良事業 276億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・被災学校移転改築事業 112億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・湾口防波堤復旧事業 255億円	・防災行政無線整備事業 10億円
