

# 被災跡地の地区別進捗管理表

令和2年3月31日現在

○土地利用方針図の見直し（実現化方策の策定）を行う地区


[凡例] ● 実施済（あり） ○ 実施中 — 該当なし（なし） △ 検討中

No.	地区名	状況					土地利用方針図の改定作業										計画に位置付けた事業			
		H23利用方針	復興組織の有無	提言書等	土地買取	土地集約	復興組織の検討状況			素案作成	素案合意(※1)	懇談会	素案修正	議会説明	公表	事業数	実施調整(※2)	事業着手	事業完了	着手(完了)済の主な事業
							準備	検討	まとめ											
1	地ノ森（新田）	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業
2	下船渡	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業	
3	細浦	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	4	3	3	2	広場整備事業、道路新設改良事業 内水排水対策事業	
4	小河原	●	●	—	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	産業用地整備事業	
5	泊里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	1	1	0	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	
6	碁石	●	●	●	●	○														
7	赤崎	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	2	0	スポーツ交流ゾーンの整備 防災学習ネットワークの構築	
8	綾里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	5	3	3	2	道路改良事業、広場整備事業	
9	甫嶺	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	3	1	道路新設改良事業、道路取付改良、校舎利活用事業	
10	泊	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	2	2	2	道路改良事業、広場整備事業	
11	浦浜	●	●	●	●	○														
12	崎浜	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	消防屯所の整備箇所検討	
															計	25	19	18	9	

(※1) 復興組織の合意状況 (※2) 財源の確保、実施所管課の調整、復興組織とのすり合わせ等

○土地利用方針図の見直しを行わない地区

No.	地区名	状況					備考
		H23利用方針	復興組織の有無	提言書等	土地買取	土地利用	
13	盛	●	—	—	●	○	譲渡・貸付
14	赤土倉	—	—	—	—	—	
15	蛸ノ浦	●	—	●	●	○	譲渡・貸付
16	長崎	●	—	●	—	—	
17	合足	●	—	●	—	—	
18	小路	—	—	—	—	—	
19	野々前・白浜	●	—	●	—	—	
20	砂子浜	●	—	●	—	—	
21	小石浜	●	—	●	●	—	譲渡・貸付
22	小壁	—	—	—	—	—	
23	吉浜	●	—	—	●	—	譲渡・貸付
24	扇洞	●	—	—	—	—	
25	根白	—	—	—	—	—	
26	千歳	●	—	—	—	—	

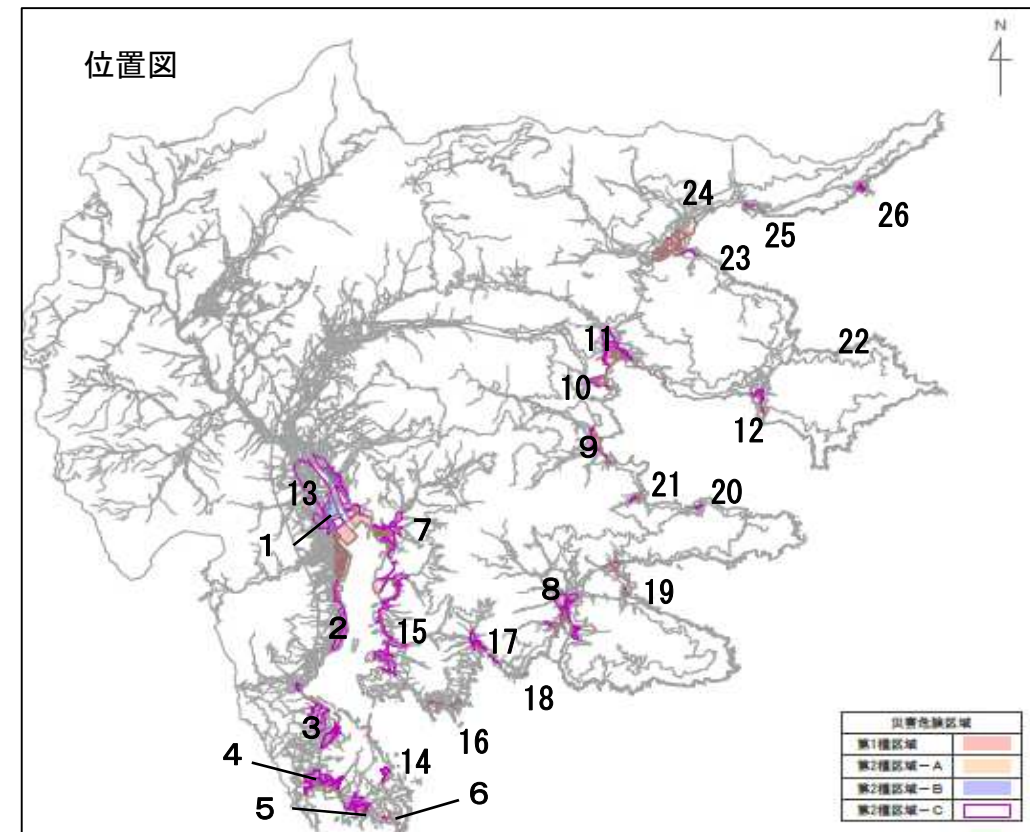

被災跡地土地利用実現化方針に位置づけた事業（予定を含む）の状況について

令和2年3月31日現在

- 事業名のハッチ  
 [凡例]  : 市が実施主体の被災跡地を利用した復旧・復興事業  
 : その他の復旧・復興事業  
 : 住民・企業が主体の取組
- 見込区分（目安）  
 A : 実施中、実現の見込み大  
 B : 実現の可能性はあるが時期等調整  
 C : 見込みがたっていない
- 進捗  
 ● : 実施済  
 ○ : 実施中  
 - : 該当なし

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗（市）					進捗（地域）			現在の状況	活用見込移転元地（㎡）	概算事業費（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		（平成31年度）令和元年度		（平成32年度）令和2年度		担当課等		
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施	完了				4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月			
地ノ森（新田）	1	市	内水排水対策事業	地ノ森（新田）地区 道路、橋梁、小水路の嵩上げ	A	●	●	●	○	-	-	-	-	-	413,858			設計		工事								(工程再調整)	建設課		
	2	市	内水排水対策事業	下船渡地区 小水路の嵩上げ	A	●	●	●	○	-	-	-	-	-	92,425					設計			工事					(工程再調整)	建設課		
下船渡	3	県	復興関連道路整備事業 (県道丸森権現堂線)	L=2,100m、W=6.0(11.5, 16.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				※カメイタンク下~久保田鉄工付近 設計										土木C (道路整備課)		
	3	県	復興関連道路整備事業 (県道丸森権現堂線)	L=2,100m、W=6.0(11.5, 16.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				※久保田鉄工~下船渡駅~ 設計										土木C (道路整備課)	
細浦	4	市	コミュニティ広場の整備	A=約0.3ha 四阿、ベンチ、水飲み場等	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	2,907	44,717													土地利用課		
	5	市	避難路の整備	避難路の新設(陸間からの避難階段) L=25m、W=2.0m	C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,333														土地利用課	
	6	県	海岸保全施設整備事業 (細浦漁港分)	防潮堤・水門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														水産振興C (漁港管理課)	
	7	市	内水排水対策事業	市道、水路の嵩上げ 約0.92ha 道路改修119m、水路改修68m	A	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	99,889															建設課 土地利用課
	8	市	市道の整備	峰岸防集団地からまちづくり連携道路への 接続道路整備	A	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	99,452															建設課
9	地域	朝市の運営・広場の維持管理	復興朝市の継続運営・広場の維持管理 (※No.4にかかる地域の取組)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-															地域	
小河原	10	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3.2ha	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	18,548	101,516														土地利用課	
	11	企業	誘致企業の施設整備	大規模施設園芸 ・トマトの施設栽培 ・高度環境制御栽培施設 ・施設面積 約1.7ha(作付 約1.5ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															企業
泊里・碁石	12	市	避難路の整備	避難路の復旧 (赤道の復旧改良)	C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000														土地利用課	
	13	市	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	碁石浜背後地を盛土整地し、駐車場として 利用(盛土材は県と市の工事発生土を 利用、水路等の処理は県工事負担を想 定)	A	●	-	●	○	-	-	-	-	-	-	0															土地利用課
	14	市	津波資料としての地層の保存	過去津波の痕跡資料 過去に大学教授が取り出した地層(博物 館に保管)の展示	B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0															土地利用課
	15	地域	多目的広場の整備	地域が地権者から土地の借受け等を行 い、広場として利用 A=約1.0ha	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-															地域
	16	地域	蓮田の管理	鎮魂や自然学習のための蓮田 民地を借受けた地域による整備・管理	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-															地域
17	地域	樺の葉集荷場・樺畑の整備	樺利用のための集荷場・畑の整備 将来的に実や葉を活用した産業創出を模 索	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	2,000															地域	
18	地域	避難路の整備	地域による避難路整備 (市は資材を提供)	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-															地域	

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗(市)					進捗(地域)			現在の状況	活用見込移転元地(m <sup>2</sup> )	概算事業費(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(平成31年度)令和元年度		(平成32年度)令和2年度		担当課等			
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施	完了				4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月				
																					4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月		4~9月	10~3月	
赤崎	19	市	スポーツ交流ゾーンの検討(用地整備)	防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの整備 A=約4.2ha	A	○	○	○							29,213	未定									検討・調整・用地確保	設計	工事	土地利用課				
	20		スポーツ施設の整備検討(施設整備)	施設整備の検討・方針決定 関係団体・市民の合意形成	C	○										-	未定									検討・調整 (市民の合意形成・議会説明等)			生涯学習課			
	21		赤崎復興市の常設化	買い物や交流の場として、復興市を常設化するための施設等整備	C	○										-	未定									検討・調整	(工程再調整)	土地利用課				
	22		防災交流拠点の整備	震災の教訓を踏まえ、広く防災を学べる場として防災交流拠点を整備 漁村センターの改修整備を予定	A	○	○									-	未定									検討・調整 構想・基本計画策定	設計	工事	防災管理室 土地利用課			
	23	地域	スポーツ交流ゾーンの活用	スポーツ交流ゾーンの利用促進につながる取組の検討	-	-	-	-	-	○					-	-													地域			
	24		赤崎復興市の運営	赤崎復興市の開催運営	-	-	-	-	-	○	○				-	-													地域			
25	防災交流拠点の運営		防災交流拠点の運営と維持管理 体験プログラムの検討・実施	-	-	-	-	-	○	○				-	-													地域				
綾里	26	市	緑化広場の整備	A=約0.2ha	A	●	●	●	●	●					2,273	34,471 土木 28,286 建築 6,185											調整	測量設計	工事	●R2.3完了	土地利用課	
	27		市道開墾線道路改良事業	拡幅改良 L=430m、W=約5.5m	A	●	●	●	●	●					-	90,896											設計	工事	●H30.9完了	建設課		
	28	市	市道港黒土田線道路改良事業	道路の嵩上げ L=125m、W=6.0m	C	○									-	21,489												調整	(工程再調整)	水産課 土地利用課		
	29	県	漁港関係施設等災害復旧事業(綾里漁港海岸)	防潮堤等の整備	-	-	-	-	-	-					-	-	設計	工事												水産振興C (漁港復旧課)		
	30	市	市道港田浜線道路改良事業	拡幅改良 L=180m、W=6.0m	C	○									-	56,000											調整	(工程再調整)	土地利用課			
	31	市	漁業集落防災機能強化事業	水産施設用地・集落道の整備	-	●	●	●	○	○					4,967	100,910											設計	工事	工程再調整	工事	●R2.2完了	水産課
	32	市	市道石浜線・石浜海岸線道路改良事業	拡幅改良 L=160m、W=4.8~6.9m	A	●	●	●	○						-	32,450											設計	工事	(工程再調整)	建設課 土地利用課		
	33	地域	緑化広場の維持管理	広場の維持管理 (※No.26にかかる地域の取組)	-	-	-	-	-	○	○				-	-												検討(整備後に維持管理)		指定管理開始	地域	
甫嶺	34	市	市道甫嶺横断線道路新設改良事業	迂回路となる道路を新設 L=720m、W=5.0m	A	●	●	●	○					-	353,105												設計	用地・調整	工事	(工程再調整)	建設課	
	35		住民協働による拠点の検討・運営	閉校となった旧甫嶺小学校を改修整備し、宿泊交流機能等を持った(仮称)甫嶺復興交流推進センターを開設する。 ▽主な取組 ・地域活動、交流イベントの企画運営 ・地元や来訪者への貸室 ・宿泊サービス ・テナント貸室(連携民間企業が入居)	A	○	○	○							-	181,774	検討											調査	設計	工事	(工程再調整)	新産業戦略室 土地利用課
	36		農業的土地利用への誘導(先行誘導地)	農業のための土地利用への誘導	-	●	-	-	-	-	-					-	-															土地利用課
	37	地域	避難路の整備(既設の取付改良)	主要地方道への取付勾配改良	A	●	●	●	●						-	19,011												設計	工事	●H31.3完了	水産課	
	38		三陸鉄道との協働による植樹帯の整備	甫嶺駅前への植樹帯整備	-	-	-	-	-	○	○				-	-													地域の取組		地域	
	39		蕎麦栽培	共同菜園 蕎麦を共同で栽培 イベント化	-	-	-	-	-	●	●	●				-	-												地域の取組		地域	
	40		ピオトープ	甫嶺駅海側を自然体験場と位置付け	-	-	-	-	-	○					-	-													地域の取組		地域	
41	見晴台	矢作川河口付近への見晴台整備	-	-	-	-	-	○	○				1,100	-													※再度検討中・スケジュール未定		地域			
42	シーカヤック活動拠点	シーカヤック体験場と位置付け	-	-	-	-	-	-	-				-	-															地域			

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗(市)				進捗(地域)			現在の状況	活用見込移転元地(m <sup>2</sup> )	概算事業費(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(平成31年度)令和元年度		(平成32年度)令和2年度		担当課等			
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施				完了	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月		10~3月	4~9月	10~3月
浦浜・泊	43	市	浦浜川東側添線道路改良事業	津波等時に溢水しないよう嵩上げ L=200m	A	●	●	●	●	●	-	-	-	・社総交(復興)採択済 ・測量設計 H29.3 完了 ・工事 H30.3 完了	400	70,000			設計		工事	●H30.3 完了							建設課		
	44		沖田シミア沢線改良事業	道路改良 L=145m、橋梁復旧	C	○									・H28.8 地元要望→車道橋要望は地元の総意 ・通行量調査→R1.4.19、R1.7.5 実施済 ・本設の取りやめ(仮橋の継続使用)について地元(地区公民館)と協議済 R2.3.11	-	-					仮橋利用							土地利用課		
	45		浦浜地区多目的広場整備事業	A=2,400m <sup>2</sup> トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場等の整備	A	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金(一件審査)配分済 ・工事 H30.4 完了 ・指定管理 H30.5 開始(浦浜泊連絡協議会) ・オープニングイベントを開催済(H30.5.27) ・イベント利用が増加 →イベントに合わせ地域がマルシェ等を開催	2,400	54,450			設計		工事	●H30.4 完了							土地利用課		
	46	市	漁業集落防災機能強化事業(浦浜地区・嵩上げ)	県道・主要地方道の背後地の嵩上げ	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金配分済 ・工事(H26.12~H29.9) ・H29.9 完了	-	564,239	工事							●H29.9 完了						水産課	
	47		漁業集落防災機能強化事業(浦浜地区・水産施設用地)	水産施設用地の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金配分済 ・工事(H29.12~H30.5) ・H30.5 完了	3,770	30,244			設計		工事	●H30.5 完了						水産課			
	48		漁業集落防災機能強化事業(泊地区・水産施設用地)	水産施設用地の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-	・復興交付金配分済 ・工事(H29.11~H30.6) ・H30.6 完了	4,202	116,293			設計		工事	●H30.6 完了						水産課			
	49	地域	雄滝・雌滝の遊歩道づくり	泊防集団地から雄滝・雌滝へ通じる遊歩道づくり	-	-	-	-	-	●	●	●	・地域で継続して取組中 ・今後も1~2回/年の整備が行われる予定 ・地域主体の取組として定着	-	-	地域の取組												地域			
	50		三陸駅~大王杉観光ルートづくり	まちづくりの軸とする観光ルートづくり	-	-	-	-	-	○	○		・検討を継続中 ・植栽や大王杉周辺の遊歩道整備に取組中	-	-			地域の取組										地域			
	51	県	まちづくり連携道路整備事業(主要地方道大船渡線三陸線)	L=1,000m、W=6.0(10.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	・H27 着工 ・H28 道路改良工、舗装工 ・H29.9 完成	-	-	工事							●H29.9 完了					土木C(復興まちづくり課)			
	52	地域	原っぱの整備	地域が主体となり被災跡地を原っぱとして活用	-	-	-	-	-	○	○		・検討を継続中 ・植栽などに取組中	2,000	-					地域の取組									地域		
53	県	まちづくり連携道路整備事業(一般県道崎浜港線)	L=700m、W=6.0(10.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	・H27 着工 ・H28 道路改良工、舗装工 ・H29.9 完成	-	-	工事							●H29.9 完了					土木C(復興まちづくり課)				
54	地域	四阿の設置	鎮魂・憩場として未音崎(みねざき)眺望台を整備	-	-	-	-	-	●	●	●	・地域において未音崎(みねざき)眺望台を整備済 ・適切に維持管理を継続中	-	-	地域の取組	●H27.7 完了											地域				
55		商店街整備	さんりくの園跡地へ商業店舗を集積	-	-	-	-	-	●	●	●	・浦浜サイコー商店街として整備済 ・現在はイベント支援などの取組	-	-	地域の取組	●H27.7 完了											地域				
56		ポプラの樹広場の整備	※浦浜地区多目的広場として整備	-	-	-	-	-	-	-	-	※浦浜地区多目的広場として整備	-	-	●浦浜地区多目的広場へ振り替え											地域					
57		結いの道	泊地区の集落を結ぶ歩道づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・ウッドチップの敷設を実施中(継続) →東海大の支援プロジェクト →H30年度は第3期工事(150mの砂利敷)完了	-	-			地域の取組					●H31.3 完了				地域				
58	結っ小屋	地域の小さな拠点(集会所)づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●	・H27年度に建設(移設)済 ・適切な管理が継続されている	-	-	●H27.4 完了											地域					
崎浜	59	市	コミュニティ広場の整備	憩いや交流の場としての広場整備	-	●	-	-	-	-	-	・用地が確保できず取りやめ ・取りやめは地域と協議済 ・旧小学校跡地への機能配置を検討予定	-	-	※取りやめ(用地集約不可能)											土地利用課					
	60		消防屯所の整備箇所検討	旧崎浜小学校校庭への整備検討 木造平屋建 建築面積 91.91m <sup>2</sup>	A	●	●	●	●	●	-	-	・用地測量 H29.12 完了 ・H30.10 完了	-	23,320			検討(地域調整)		測量	工事	●H30.10 完了					消防署				
	61	地域	コミュニティ広場の維持管理	広場の維持管理	-	-	-	-	-	-	-	※取りやめ (機能移設により再検討を予定)	-	-	※取りやめ(用地集約不可能)											地域					
	62		浜らいの運営	地域集会所の運営	-	-	-	-	-	-	-	-	・適切に維持管理を継続中 (旧小学校への移設を検討予定)	-	-	地域の取組											地域				
63	市	漁業集落防災機能強化事業(水産施設用地・集落道)	水産施設用地・集落道の整備	A	●	●	●	●	●	-	-	・復興交付金一部配分済 ・H29.3 1期工事完了 R1.9 2期工事完了	3,772	251,984	設計		工事							●R1.9 完了		水産課					
浦浜	64	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約0.9ha	A	●	●	●	●	-	-	・R1.6.19 敷地造成工事完了 ・R1.9.13 企業へ事業用地を貸付(使用貸借契約) ・R2.3.13 企業と事業用定期借地権設定契約を締結	9,188	50,876							調整	設計	工事	●R1.6 完了			新産業戦略室 土地利用課				
	65	企業	企業の施設整備	イチゴの周年施設栽培 ・イチゴ生産・担い手育成拠点施設 ・施設面積 約0.5ha	-	-	-	-	-	-	-	・R1.9.14 地鎮祭 ・R2.3.30 1期工事(栽培棟・育苗棟など)完了 ・R2.4.1 定植作業開始 ・R2.7. 2期工事(栽培棟3棟)着工予定(～R2.12)	-	-											施設整備	●R2.3 完了		施設整備	企業		
全地区	66	市	移転元地の譲渡・貸付	防集買取地の譲渡・貸付	-	-	-	-	-	-	-	・買取済 843筆 252,638m <sup>2</sup> ・譲渡貸付 182筆 55,128m <sup>2</sup> (約22%) ・民有地を含めた被災跡地の有効活用に取組中	55,399	-					段階的に公募→譲渡貸付									土地利用課			

活用する(予定を含む)移転元地(m<sup>2</sup>) 計 142,139

### 被災跡地（防集買取地）の譲渡・貸付け状況

地区	買取状況						土地利用の状況						未利用・未活用の状況									
	買取対象		買取予定		買取済 A		譲渡 ①		貸付 ②		土地利用 ③		合計 B ①+②+③		公募中 ④		調整中 ⑤		合計 C ④+⑤			
	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)		
土地利用方針図の改定を行う12地区	大船渡	77	17,927	77	17,927	77	17,927	12	2,641	20	4,749	8	1,179	40	8,569	19	5,150	19	4,208	38	9,358	
	下船渡																					
	細浦	85	25,690	85	25,690	85	25,690	3	718	25	6,961	8	2,824	36	10,503	30	10,370	23	4,815	53	15,185	
	小河原	163	43,703	163	43,703	163	43,703	2	944	28	10,165	78	17,911	108	29,020	50	13,151	8	1,532	58	14,683	
	泊里	16	7,140	16	7,140	16	7,140			2	553	1	515	3	1,068	11	5,658	2	414	13	6,072	
	基石																					
	赤崎	201	62,759	201	62,759	200	62,220	1	212	43	12,981	65	25,447	109	38,640	14	3,176	77	20,403	91	23,579	
	綾里	65	16,362	65	16,362	65	16,362	1	230	14	4,835	30	7,109	45	12,174	18	3,628	4	560	22	4,188	
	泊	29	13,447	29	13,447	29	13,447					9	4,994	9	4,994	17	7,668	3	785	20	8,453	
	甫嶺	18	6,561	18	6,561	18	6,561			2	295			2	295	16	6,266			16	6,266	
	浦浜	105	36,792	105	36,792	105	36,792	1	250	11	4,015	45	16,085	57	20,350	35	10,211	19	6,209	54	16,420	
	崎浜	39	9,880	39	9,880	39	9,880			3	1,179	21	5,561	24	6,740	14	2,881	1	260	15	3,141	
小計	798	240,261	798	240,261	797	239,722	20	4,995	148	45,733	265	81,625	433	132,353	224	68,159	156	39,186	380	107,345		
その他の地区	盛	9	2,247	9	2,247	9	2,247	5	981	1	99			6	1,080	6	1,167			6	1,167	
	赤土倉																					
	蛸ノ浦	32	9,389	32	9,389	32	9,389	1	415	7	2,905			8	3,320	25	6,070			25	6,070	
	長崎							※ 土地利用の主な事業 大船渡地区……津波復興拠点事業 細浦地区……広場整備事業 小河原地区……産業用地整備事業 赤崎地区……スポーツ交流ゾーン整備事業 綾里地区……漁業集落防災機能強化事業、広場整備事業 泊地区……漁業集落防災機能強化事業 浦浜地区……漁業集落防災機能強化事業、広場整備事業、産業用地整備事業 崎浜地区……漁業集落防災機能強化事業														
	合足																					
	小路																					
	野々前・白浜																					
	砂子浜																					
	小石浜	1	516	1	516	1	516									1	516			1	516	
	小壁																					
	吉浜	4	764	4	764	4	764									4	764			4	764	
	扇洞																					
根白																						
千歳																						
小計	46	12,916	46	12,916	46	12,916	6	1,396	8	3,004	0	0	14	4,400	36	8,517	0	0	36	8,517		
合計	844	253,177 (25.4ha)	844	253,177 (25.4ha)	843	252,638 (25.3ha)	26	6,391 (0.6ha)	156	48,737 (4.9ha)	265	81,625 (8.1ha)	447	136,753 (13.6ha)	260	76,676 (7.7ha)	156	39,186 (3.9ha)	416	115,862 (11.6ha)		

(注1) 買取り後に分筆や分割利用を行っている土地があるため、土地利用の合計(B)と未利用・未活用の合計(C)の合算値が、買取済(A)の筆数及び面積と一致しない地区がある。  
 (注2) 「譲渡」は売却したもの、「貸付」は有償及び無償(公共的団体)で貸しているもの、「土地利用」は市事業等で使用しているもの、「公募中」は譲渡・貸付の希望者を募集しているもの、「調整中」は公共工事等での利用候補地となっているもの、利用に適さないもの(接道なし)など。
