

被災跡地の地区別進捗管理表

資料 7

令和2年9月30日現在

○土地利用方針図の見直し（実現化方策の策定）を行う地区


[凡例] ● 実施済（あり） ○ 実施中 — 該当なし（なし） △ 検討中

No.	地区名	状況					土地利用方針図の改定作業										計画に位置付けた事業			
		H23利用方針	復興組織の有無	提言書等	土地買取	土地集約	復興組織の検討状況			素案作成	素案合意(※1)	懇談会	素案修正	議会説明	公表	事業数	実施調整(※2)	事業着手	事業完了	着手(完了)済の主な事業
							準備	検討	まとめ											
1	地ノ森（新田）	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業
2	下船渡	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業
3	細浦	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	4	4	2	広場整備事業、道路新設改良事業、内水排水対策事業、避難路整備事業
4	小河原	●	●	—	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	産業用地整備事業
5	泊里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	1	1	0	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	
6	碁石	●	●	●	●	○														
7	赤崎	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	2	0	スポーツ交流ゾーンの整備 防災学習ネットワークの構築
8	綾里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	3	3	3	道路改良事業、広場整備事業
9	甫嶺	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	3	2	道路新設改良事業、道路取付改良、校舎利活用事業	
10	泊	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	2	2	2	2	道路改良事業、広場整備事業	
11	浦浜	●	●	●	●	○														
12	崎浜	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	消防屯所の整備箇所検討	
															計	22	19	19	11	

(※1) 復興組織の合意状況 (※2) 財源の確保、実施所管課の調整、復興組織とのすり合わせ等

○土地利用方針図の見直しを行わない地区

No.	地区名	状況					備考
		H23利用方針	復興組織の有無	提言書等	土地買取	土地利用	
13	盛	●	—	—	●	○	譲渡・貸付
14	赤土倉	—	—	—	—	—	
15	蛸ノ浦	●	—	●	●	○	譲渡・貸付
16	長崎	●	—	●	—	—	
17	合足	●	—	●	—	—	
18	小路	—	—	—	—	—	
19	野々前・白浜	●	—	●	—	—	
20	砂子浜	●	—	●	—	—	
21	小石浜	●	—	●	●	—	譲渡・貸付
22	小壁	—	—	—	—	—	
23	吉浜	●	—	—	●	—	譲渡・貸付
24	扇洞	●	—	—	—	—	
25	根白	—	—	—	—	—	
26	千歳	●	—	—	—	—	

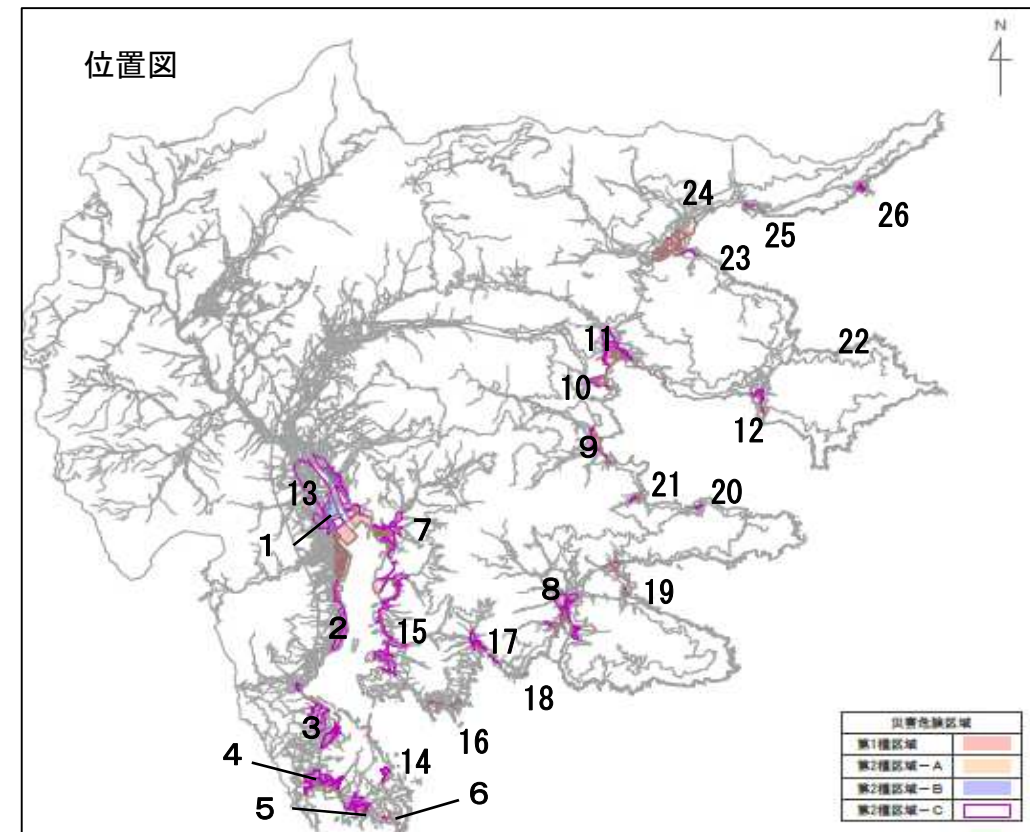

被災跡地土地利用実現化方針に位置づけた事業の状況について

事業名のハッチ
 ■ : 市が実施主体の被災跡地を利用した復旧・復興事業
 ■ : その他の復旧・復興事業
 ■ : 住民・企業が主体の取組

見込区分（目次）
 A : 実施中、実現の見込み大
 B : 実現の可能性はあるが時期等調整
 C : 見込みがたっていない

進捗
 ● : 実施済
 ○ : 実施中
 - : 該当なし

令和2年9月30日現在

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗（市）					進捗（地域）			現在の状況	活用見込移転元地（㎡）	概算事業費（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		（平成31年度）令和元年度		（平成32年度）令和2年度		担当課等	
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施	完了				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月				
																						4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月		10～3月
地ノ森（新田）	1	市	内水排水対策事業	地ノ森（新田）地区 道路、橋梁、小水路の嵩上げ	A	●	●	●	○	-	-	-	-	-	-	413,858			設計		工事									建設課
	2	市	内水排水対策事業	下船渡地区 小水路の嵩上げ	A	●	●	●	○	-	-	-	-	-	-	92,425					設計									建設課
下船渡	3	県	復興関連道路整備事業 （県道丸森権現堂線）	L=2,100m、W=6.0(11.5, 16.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					※カメイタンク下～久保田鉄工付近 設計								土木センター （道路整備課）	
	3	県	復興関連道路整備事業 （県道丸森権現堂線）	L=2,100m、W=6.0(11.5, 16.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					※久保田鉄工～下船渡駅～ 設計								土木センター （道路整備課）	
細浦	4	市	コミュニティ広場の整備	A=約0.3ha 四阿、ベンチ、水飲み場等	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	2,907	44,717													土地利用課	
	5	市	避難路の整備	避難路の新設（陸間からの避難階段） L=25m、W=2.0m	A	●	○	○	-	-	-	-	-	-	-	32,049													土地利用課	
	6	県	海岸保全施設整備事業 （細浦漁港分）	防潮堤・水門	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			工事										水産振興C （漁港管理課）	
	7	市	内水排水対策事業	市道、水路の嵩上げ 約0.92ha 道路改修119m、水路改修68m	A	●	○	●	-	-	-	-	-	-	-	99,889 うち、 測量・調査設計 30,783														建設課 土地利用課
	8	市	市道の整備	峰岸防集団地からまちづくり連携道路への 接続道路整備	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	99,452						設計								建設課
9	地域	朝市の運営・広場の維持管理	復興朝市の継続運営・広場の維持管理 （※No.4にかかる地域の取組）	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-														地域	
小河原	10	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3.2ha	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	18,548	101,516					設計								土地利用課	
	11	企業	誘致企業の施設整備	大規模施設園芸 ・トマトの施設栽培 ・高度環境制御栽培施設 ・施設面積 約1.7ha(作付 約1.5ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													企業	
泊里・碁石	12	市	避難路の整備	避難路の復旧 （赤道の復旧改良）	C	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000													土地利用課	
	13	市	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	碁石浜背後地を盛土整地し、駐車場として 利用（盛土材は県と市の工事発生土を 利用、水路等の処理は県工事負担を想 定）	A	●	-	●	○	-	-	-	-	-	-	0					設計								土地利用課	
	14	市	津波資料としての地層の保存	過去津波の痕跡資料 過去に大学教授が取り出した地層（博物 館に保管）の展示	B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0													土地利用課	
	15	地域	多目的広場の整備	地域が地権者から土地の借受け等を行 い、広場として利用 A=約1.0ha	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-													地域	
	16	地域	蓮田の管理	鎮魂や自然学習のための蓮田 民地を借受けた地域による整備・管理	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-													地域	
17	地域	樺の葉集荷場・樺畑の整備	樺利用のための集荷場・畑の整備 将来的に実や葉を活用した産業創出を模 索	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	2,000													地域		
18	地域	避難路の整備	地域による避難路整備 （市は資材を提供）	-	-	-	-	-	-	●	○	-	-	-	-													地域		

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗(市)				進捗(地域)			現在の状況	活用見込移転元地(m ²)	概算事業費(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(平成31年度)令和元年度		(平成32年度)令和2年度		担当課等						
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施				完了	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月		10~3月	4~9月	10~3月			
赤崎	19	市	スポーツ交流ゾーンの検討(用地整備)	防集移転元地を活用したスポーツ交流ゾーンの整備 A=約4.2ha	A	●	●	●	○	—	—	—	・都市計画決定告示済(R2.1.17) ・測量設計業務完了(R2.6.30) ・一部の市有地に県道盛土材を仮置き(～R2.8頃) ・R2.7.3 移転補償費53,713千円、工事費306,841千円 ・R2.8.4 工事入札 明和土木 251,900千円 9.24 本契約	29,213	437,591												検討・調整・用地確保	設計	工事	土地利用課				
	20		スポーツ施設の整備検討(施設整備)	施設整備の検討・方針決定関係団体・市民の合意形成	C	○	—	—	—	—	—	—	—	・市スポーツ施設整備検討委員会を設置 →R2.3 検討結果報告書を市長へ提出 ・市スポーツ施設整備計画基本計画検討委員会設置済 R2.5.29	—	—											検討・調整 (市民の合意形成・議会説明等)			生涯学習課				
	21		赤崎復興市の常設化	買い物や交流の場として、復興市を常設化するための施設等整備	C	○	—	—	—	—	—	—	—	・ワークショップで検討したが、維持管理(経費等)の観点から常設化は見送り	—	—											検討・調整			土地利用課				
	22	地域	防災交流拠点の整備	震災の教訓を踏まえ、広く防災を学べる場として防災交流拠点を整備漁村センターの改修整備を予定	A	○	○	○	—	—	—	—	・(仮称)防災学習センター等整備検討官民会議を開催 ①R1.11.27 ②R2.10 ③R2.1.21 ④R2.4 ⑤R2.26 ・防災学習ネットワーク構想を官民会議⑤で確認 ・漁村センターを改修し、防災学習館として整備する ・作業部会で詳細を検討 ・R2.8.12 詳細設計業務委託契約	—	未定													検討・調整 構想・基本計画策定	設計	工事	防災管理室 土地利用課			
	23		スポーツ交流ゾーンの活用	スポーツ交流ゾーンの利用促進につながる取組の検討	—	—	—	—	—	—	○	—	—	・利用促進につながるサービス等を検討中(スポーツをする環境の充実)	—	—													地域					
	24		赤崎復興市の運営	赤崎復興市の開催運営	—	—	—	—	—	—	○	○	—	・施設整備は見送り(市は継続開催)	—	—													地域					
25	防災交流拠点の運営	防災交流拠点の運営と維持管理体験プログラムの検討・実施	—	—	—	—	—	—	○	○	—	・展示内容や体験プログラムを検討中 →中学生等を対象としたプレ版を実施(継続実施予定)	—	—													地域							
綾里	26	市	緑化広場の整備	A=約0.2ha	A	●	●	●	●	●	—	—	・復興交付金配分済 ・測量設計 H31.3 完了 ・建築工事 R2.3.12 完了・土木工事 R2.3.23 完了	2,273	34,471 土木 28,286 建築 6,185													調整	測量設計	工事	●R2.3 完了	土地利用課		
	27	市	市道開墾線道路改良事業	拡幅改良 L=430m、W=約5.5m	A	●	●	●	●	●	—	—	・復興交付金(一件審査)配分済 ・測量設計 H28.11 完了・工事 H30.9 完了	—	90,896													設計	工事	●H30.9 完了	建設課			
	28	市	市道黒土田線道路改良事業	道路の嵩上げ L=125m、W=6.0m	C	○	—	—	—	—	—	—	・漁集水産用地に合わせた嵩上げを計画 →R2.7.3 仮設倉庫継続使用のため綾里地区まちづくり委員会が事業の取りやめを確認	—	21,489													調整			水産課 土地利用課			
	29	県	漁港関係施設等災害復旧事業(綾里漁港海岸)	防潮堤等の整備	—	—	—	—	—	—	—	—	・用地買収 H28.12 完了 ・工事施工中(～R3.3) ※綾里漁港分	—	—	設計	工事													水産振興センター (漁港復旧課)				
	30	市	市道港田浜線道路改良事業	拡幅改良 L=180m、W=6.0m	C	○	—	—	—	—	—	—	・復興交付金は対象外 →狭隘箇所部分改良を視野に入れ検討	—	56,000													調整	(工程再調整)		土地利用課			
	31	市	漁業集落防災機能強化事業	水産施設用地・集落道の整備	—	●	●	●	●	●	—	—	・水産用地の整備 H30.2 完了 ・2号避難路(石浜)の整備 R2.2 完了	4,967	100,910														設計	工事	工程再調整	工事	●R2.2 完了	水産課
	32	市	市道石浜線・石浜海岸線道路改良事業	拡幅改良 L=160m、W=4.8~6.9m	A	●	●	●	●	●	—	—	・社総交採択済・詳細設計 R1.9 完了 ・R1.11.29 住民説明会 ・R1.12.20 入札 ・R2.6.30 工事完了	—	32,450															設計	工事	●R2.6 完了	建設課 土地利用課	
	33	地域	緑化広場の維持管理	広場の維持管理 (※No.26にかかる地域の取組)	—	—	—	—	—	—	○	○	・R2.4.1 まちづくり委員会による指定管理開始 ・R2.7.3 まちづくり委員会総会 ・「広場まつり」をR2.10に開催予定	—	—														検討(整備後に維持管理)		指定管理開始	地域		
甫嶺	34	市	市道甫嶺横断線道路新設改良事業	迂回路となる道路を新設 L=720m、W=5.0m	A	●	●	●	○	—	—	—	・社総交(復興)採択済・測量設計 H29.3 完了 ・用地の協力が得られずルートを変更 ・工事施工中(H30.9.28～R2.12.28) 繰越	—	353,105														設計	用地・調整	工事	建設課		
	35		住民協働による拠点の検討・運営	閉校となった旧甫嶺小学校を改修整備し、宿泊交流機能等を持った(仮称)甫嶺復興交流推進センターを開設する。 ▽主な取組 ・地域活動、交流イベントの企画運営 ・地元や来訪者への貸室 ・宿泊サービス ・テナント貸室(連携民間企業が入居)	A	●	●	●	●	●	—	—	・H29.2月 越喜来地区震災復興委員会から要望 ・H30.7月 甫嶺地区復興交流推進官民会議を設置 →実務者会議で事業内容を検討 ・復興庁協議→①調査・設計 ②工事を分けるよう指示 →①調査 H31.3 完了 →①設計 R1.7.30～11.29 完了 →②復興庁と工事費協議済 ・地方創生推進交付金 採択済(R1.8.23) ・R2.9.14(繰越) 工事完了	—	181,774	検討															調査	設計	工事	新産業戦略室 土地利用課
	36		農業的土地利用への誘導(先行誘導地)	農業のための土地利用への誘導	—	●	—	—	—	—	—	—	—	・景観形成のための植樹などへ取組をシフト	—	—														土地利用課				
	37	市	避難路の整備(既設の取付改良)	主要地方道への取付勾配改良	A	●	●	●	●	●	—	—	・取付改良について復興交付金(一括配分)配分済 ・測量設計 H30.11 完了 ・工事 H31.3 完了	—	19,011														設計	工事	●H31.3 完了	水産課		
	38	地域	三陸鉄道との協働による植樹帯の整備	甫嶺駅前への植樹帯整備	—	—	—	—	—	—	○	○	・現在は三陸鉄道海側の植樹を優先検討 ・H30.4 桜の植樹を実施・草刈を継続実施	—	—																地域の取組	地域		
	39		蕎麦栽培	共同菜園 蕎麦を共同で栽培 イベント化	—	—	—	—	—	—	●	●	●	・H27年度から本格実施・地域の取組として定着 ・R1.11.3 蕎麦まつりを実施	—	—														地域の取組	地域			
	40		ピオトープ	甫嶺駅海側を自然体験場と位置付け	—	—	—	—	—	—	—	○	○	・段階的に検討 ・残地利用(保存)という位置づけ	—	—														地域の取組	地域			
	41		見晴台	矢作川河口付近への見晴台整備	—	—	—	—	—	—	○	○	・再検討の結果、見晴台と地元カフェを計画 →防潮堤工事後、段階整備を予定	1,100	—															※再度検討中・スケジュール未定	地域			
42	シーカヤック活動拠点		シーカヤック体験場と位置付け	—	—	—	—	—	—	—	—	—	・担い手等の関係から一旦取りやめという整理	—	—														地域					

地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗(市)				進捗(地域)			現在の状況	活用見込 移転元地 (㎡)	概算 事業費 (千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		(平成31年度) 令和元年度		(平成32年度) 令和2年度		担当課等		
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施				完了	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月		10~3月	
																														設計
浦 浜 ・ 泊	43	市	浦浜川東側添線道路改良事業	津波等時に溢水しないよう嵩上げ L=200m	A	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●												建設課		
	44		沖田シミア沢線改良事業	道路改良 L=145m、橋梁復旧	C	○																							土地利用課	
	45		浦浜地区多目的広場整備事業	A=2,400㎡ トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場等の整備	A	●	●	●	●	●	-	-	-																土地利用課	
	46	市	漁業集落防災機能強化事業 (浦浜地区・嵩上げ)	県道・主要地方道の背後地の嵩上げ	-	●	●	●	●	●	-	-	-																水産課	
	47		漁業集落防災機能強化事業 (浦浜地区・水産施設用地)	水産施設用地の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-																	水産課
	48		漁業集落防災機能強化事業 (泊地区・水産施設用地)	水産施設用地の整備	-	●	●	●	●	●	-	-	-																	水産課
	49	地域	雄滝・雌滝の遊歩道づくり	泊防集団地から雄滝・雌滝へ通じる遊歩道づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●																地域	
	50		三陸駅～大王杉観光ルートづくり	まちづくりの軸とする観光ルートづくり	-	-	-	-	-	-	○	○																	地域	
	51	県	まちづくり連携道路整備事業 (主要地方道大船渡線三陸線)	L=1,000m、W=6.0(10.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-																土木センター (復興まちづくり課)	
	52	地域	原っぱの整備	地域が主体となり被災跡地を原っぱとして活用	-	-	-	-	-	-	○	○																	地域	
53	県	まちづくり連携道路整備事業 (一般県道崎浜港線)	L=700m、W=6.0(10.0)m	-	-	-	-	-	-	-	-	-																土木センター (復興まちづくり課)		
54	地域	四阿の設置	鎮魂・憩場として未音崎(みねざき) 眺望台を整備	-	-	-	-	-	-	●	●	●																地域		
55		商店街整備	さんりくの園跡地へ商業店舗を集積	-	-	-	-	-	-	●	●	●																地域		
56		ポプラの樹広場の整備	※浦浜地区多目的広場として整備	-	-	-	-	-	-	-	-	-																地域		
57		結いの道	泊地区の集落を結ぶ歩道づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●																地域		
58		結っ小屋	地域の小さな拠点(集会所)づくり	-	-	-	-	-	-	●	●	●																地域		
崎 浜	59	市	コミュニティ広場の整備	憩いや交流の場としての広場整備	-	●	-	-	-	-	-	-																土地利用課		
	60		消防屯所の整備箇所検討	旧崎浜小学校校庭への整備検討 木造平屋建 建築面積 91.91㎡	A	●	●	●	●	●	-	-	-															消防署		
	61	地域	コミュニティ広場の維持管理	広場の維持管理	-	-	-	-	-	-	-	-																地域		
	62		浜らいの運営	地域集会所の運営	-	-	-	-	-	-	-	-																地域		
63	市	漁業集落防災機能強化事業 (水産施設用地・集落道)	水産施設用地・集落道の整備	A	●	●	●	●	●	-	-	-																水産課		
浦 浜	64	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約0.9ha	A	●	●	●	●	-	-	-																新産業戦略室 土地利用課		
	65		産業用地の整備(その2)	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約4.76ha	A	●	●	○																				土地利用課		
	66	企業	企業の施設整備	イチゴの周年施設栽培 ・イチゴ生産・担い手育成拠点施設 ・施設面積 約0.5ha	-	-	-	-	-	-	-	-																企業		

被災跡地（防集買取地）の譲渡・貸付け状況

令和2年9月30日現在

地区	買取状況				土地利用の状況								未利用・未活用の状況							
	買取対象		買取済 A		譲渡 ①		貸付 ②		土地利用 ③		合計 B ①+②+③		公募中 ④		調整中 ⑤		合計 C ④+⑤			
	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)	筆数	面積 (㎡)		
土地利用方針図の改定を行う12地区	大船渡	77	17,927	77	17,927	18	3,534	18	3,740	4	2,275	40	9,549	27	6,936	1	1,063	28	7,999	
	下船渡																			
	細浦	85	25,690	85	25,690	11	2,094	27	7,864	8	2,286	46	12,244	44	13,444			44	13,444	
	門之浜(小河原)	163	43,703	163	43,703	3	1,156	97	25,353	5	1,147	105	27,656	62	16,043			62	16,043	
	泊里	16	7,140	16	7,140	2	119	2	553	1	516	5	1,188	13	5,952			13	5,952	
	基石																			
	赤崎	201	62,759	201	62,759	9	1464	36	12,572	79	28,990	124	43,026	83	19,727			83	19,727	
	綾里	65	16,362	65	16,362	3	1,385	12	3,771	28	5,170	43	10,326	24	6,036			24	6,036	
	泊	29	13,447	29	13,447					9	4,994	9	4,994	20	8,444			20	8,444	
	甫嶺	19	6,837	19	6,837			2	295			2	295	17	6,542			17	6,542	
	浦浜	104	36,516	104	36,516	16	6,357	25	7,344	20	7,787	61	21,488	37	11,634	14	3,402	51	15,036	
	崎浜	39	9,880	39	9,880	2	29	3	1,179	21	4,763	26	5,971	18	3,911			18	3,911	
小計	798	240,261	798	240,261	64	16,138	222	62,671	175	57,928	461	136,737	345	98,669	15	4,465	360	103,134		
その他の地区	盛	9	2,247	9	2,247	5	981				5	981	5	1,266			5	1,266		
	赤土倉																			
	蛸ノ浦	32	9,389	32	9,389	1	415	5	1,510			6	1,925	27	7,465			27	7,465	
	長崎					※ 土地利用の主な事業 大船渡地区……津波復興拠点事業 細浦地区……広場整備事業 小河原地区……産業用地整備事業 赤崎地区……スポーツ交流ゾーン整備事業 綾里地区……漁業集落防災機能強化事業、広場整備事業 泊地区……漁業集落防災機能強化事業 浦浜地区……漁業集落防災機能強化事業、広場整備事業、産業用地整備事業 崎浜地区……漁業集落防災機能強化事業														
	合足																			
	小路																			
	野々前・白浜																			
	砂子浜																			
	小石浜	1	516	1	516									1	516			1	516	
	小壁																			
	吉浜																			
	扇洞																			
根白																				
千歳	4	764	4	764									4	764			4	764		
小計	46	12,916	46	12,916	6	1,396	5	1,510	0	0	11	2,906	37	10,011	0	0	37	10,011		
合計	844	253,177 (25.3ha)	844	253,177 (25.3ha)	70	17,534 (1.8ha)	227	64,181 (6.4ha)	175	57,928 (5.8ha)	472	139,643 (14.0ha)	382	108,680 (10.9ha)	15	4,465 (0.4ha)	397	113,145 (11.3ha)		

(注1) 買取り後に分筆や分割利用を行っている土地があるため、土地利用の合計(B)と未利用・未活用の合計(C)の合算値が、買取済(A)の筆数及び面積と一致しない地区がある。
 (注2) 「譲渡」は売却したもの、「貸付」は有償及び無償(公共的団体)で貸しているもの、「土地利用」は市事業等で使用しているもの、「公募中」は譲渡・貸付の希望者を募集しているもの、「調整中」は公共工事等での利用候補地となっているもの、利用に適さないもの(接道なし)など。
