
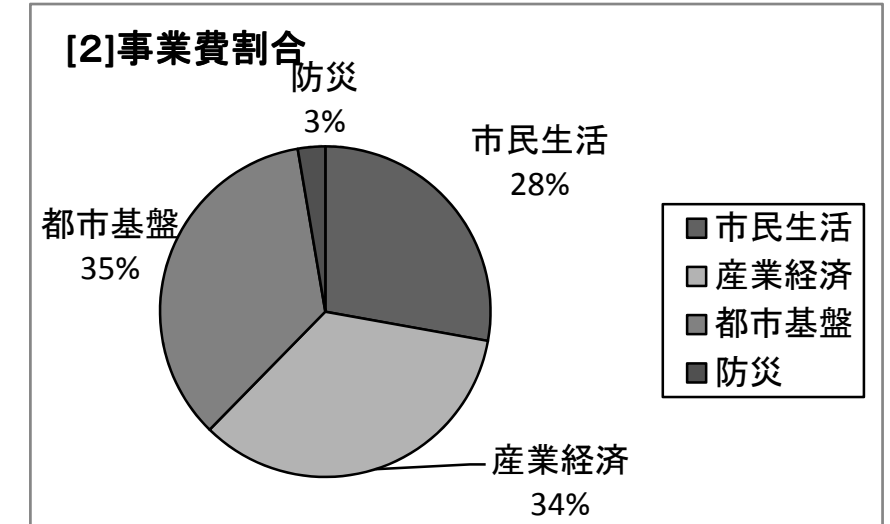


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成30年3月31日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		132	
着手済	(1)	124	35
	(2)		43
	(3)		6
	(4)		40
検討中		0	
未着手		0	
計		256	
整理・統合等		20	

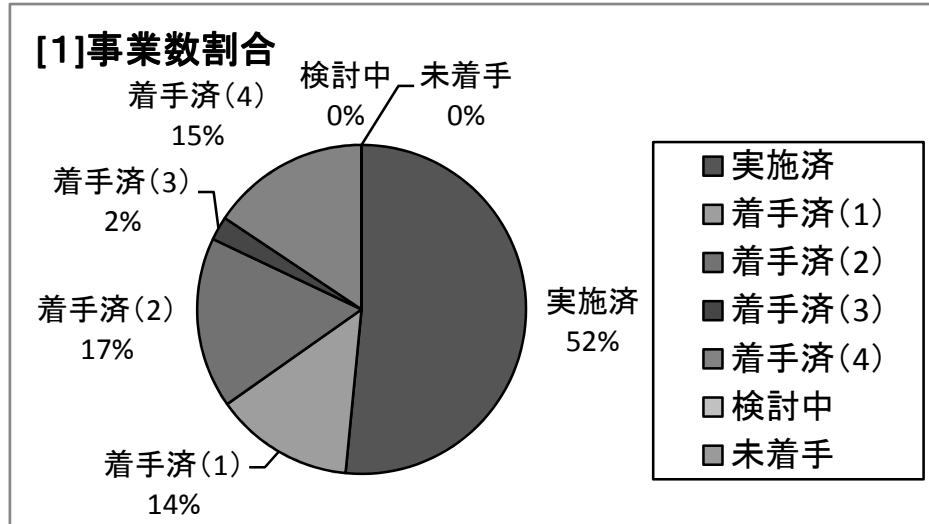

※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画(百万円)															
		財源内訳(百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
市民生活の復興	108,367	48,590	9,534	2,265	36,953	11,025	18,178	17,397	23,563	11,625	13,731	13,404	4,193	4,836	720	720	
産業・経済の復興	134,380	47,207	61,296	3,471	15,936	6,470	8,914	17,878	30,580	22,005	15,975	11,494	7,942	8,852	6,449	4,291	
都市基盤の復興	136,213	31,880	59,770	4,473	30,041	10,049	3,922	10,212	17,534	22,321	17,490	22,992	28,154	11,088	1,448	1,052	
防災まちづくり	10,401	2,122	24	68	6,439	1,748	131	2,173	2,415	4,554	414	366	144	122	41	41	
合計	389,361	129,799	130,624	10,277	89,369	29,292	31,145	47,660	74,092	60,505	47,610	48,256	40,433	24,898	8,658	6,104	
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							152,897(39.3%)			156,371(40.2%)			80,093(20.5%)				

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成29年度)→: 349,701百万円÷総事業費: 389,361百万円=89.8%

※着手済事業の(1)・(2)の平成30年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=90.6%

参考(前回調査時)

(H29.9.30現在)	381,369	129,095	124,179	10,219	88,559	29,317	31,145	47,670	74,038	60,520	47,600	48,237	40,278	20,747	8,400	2,734	
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							152,853(40.1%)			156,357(41.0%)			72,159(18.9%)				

■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 458億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 711億円	・港湾施設復旧事業 323億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 197億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・湾口防波堤復旧事業 255億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・被災学校移転改築事業 112億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・土地区画整理事業 244億円	・防災行政無線整備事業 10億円
