
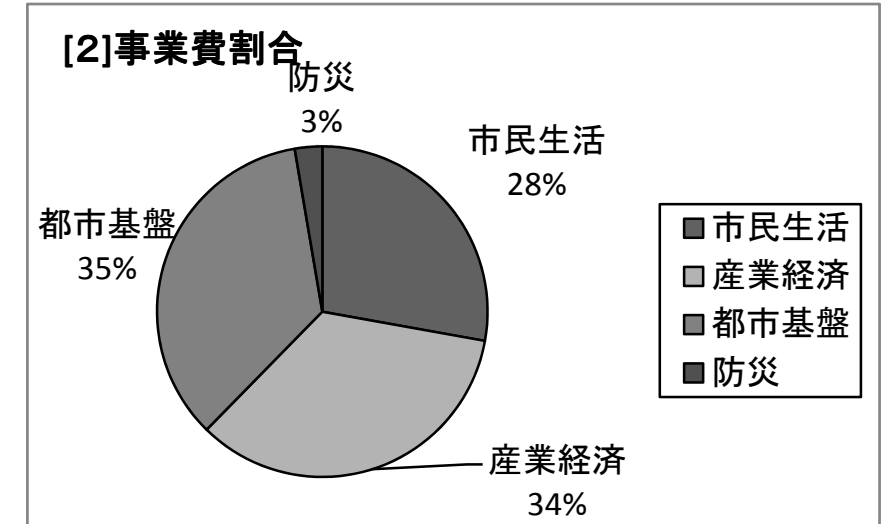


# 大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成30年3月31日現在

## [1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		132	
着手済	(1)	124	35
	(2)		43
	(3)		6
	(4)		40
検討中		0	
未着手		0	
計		256	
整理・統合等		20	

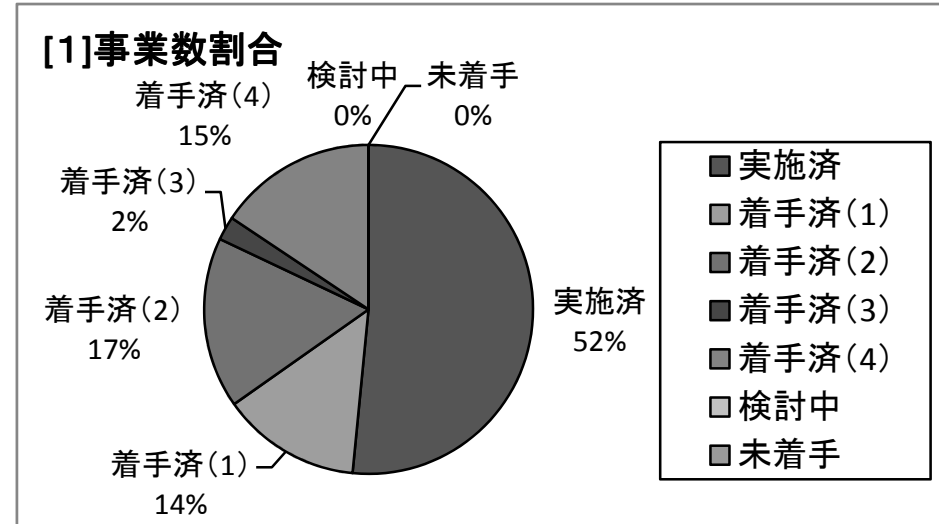

### ※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

## [2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画(百万円)															
		財源内訳(百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
市民生活の復興	108,367	48,590	9,534	2,265	36,953	11,025	18,178	17,397	23,563	11,625	13,731	13,404	4,193	4,836	720	720	
産業・経済の復興	134,380	47,207	61,296	3,471	15,936	6,470	8,914	17,878	30,580	22,005	15,975	11,494	7,942	8,852	6,449	4,291	
都市基盤の復興	136,213	31,880	59,770	4,473	30,041	10,049	3,922	10,212	17,534	22,321	17,490	22,992	28,154	11,088	1,448	1,052	
防災まちづくり	10,401	2,122	24	68	6,439	1,748	131	2,173	2,415	4,554	414	366	144	122	41	41	
合計	389,361	129,799	130,624	10,277	89,369	29,292	31,145	47,660	74,092	60,505	47,610	48,256	40,433	24,898	8,658	6,104	
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							152,897(39.3%)			156,371(40.2%)			80,093(20.5%)				

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成29年度)→: 349,701百万円÷総事業費: 389,361百万円=89.8%

※着手済事業の(1)・(2)の平成30年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=90.6%

参考(前回調査時)

(H29.9.30現在)	381,369	129,095	124,179	10,219	88,559	29,317	31,145	47,670	74,038	60,520	47,600	48,237	40,278	20,747	8,400	2,734	
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							152,853(40.1%)			156,357(41.0%)			72,159(18.9%)				


### ■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 458億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 711億円	・港湾施設復旧事業 323億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 197億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・湾口防波堤復旧事業 255億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・被災学校移転改築事業 112億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・土地区画整理事業 244億円	・防災行政無線整備事業 10億円

# 分野別の復興状況


## ①市民生活の復興

進捗状況	事業数
実施済	37
着手済(1)	5
着手済(2)	21
着手済(3)	0
着手済(4)	15
検討中	0
未着手	0
計	78
整理・統合等	0

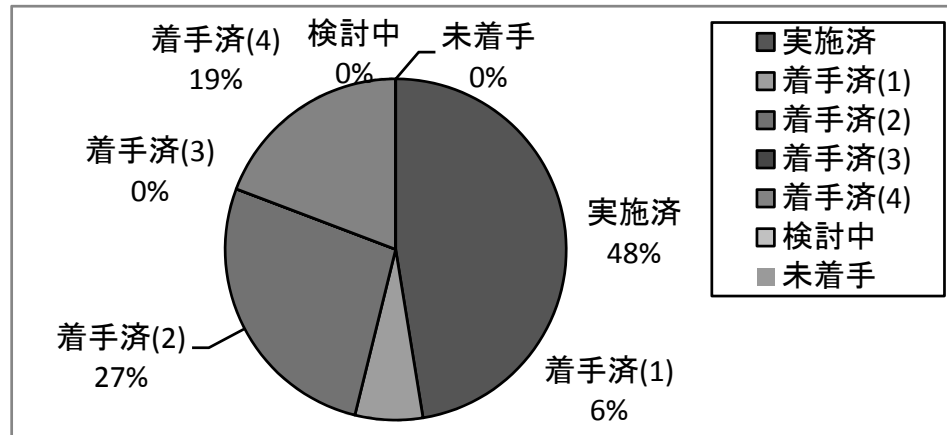


## ②産業・経済の復興

進捗状況	事業数
実施済	58
着手済(1)	19
着手済(2)	10
着手済(3)	1
着手済(4)	7
検討中	0
未着手	0
計	95
整理・統合等	14

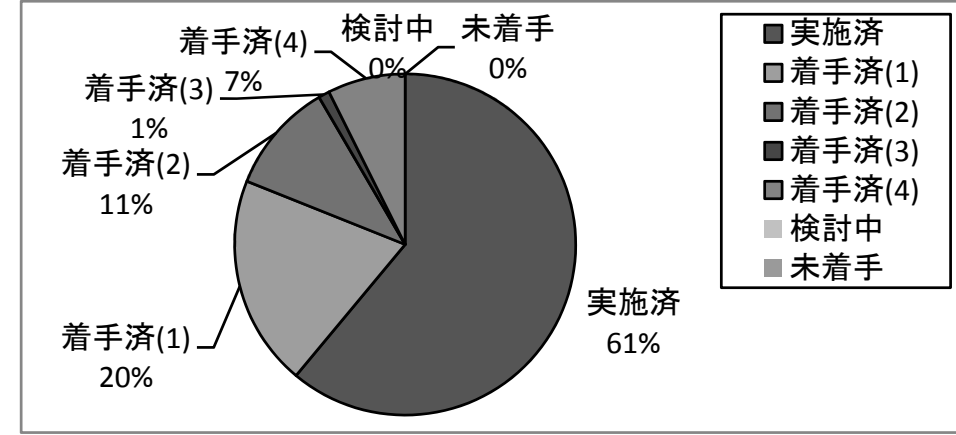


## ③都市基盤の復興

進捗状況	事業数
実施済	17
着手済(1)	3
着手済(2)	4
着手済(3)	5
着手済(4)	14
検討中	0
未着手	0
計	43
整理・統合等	4

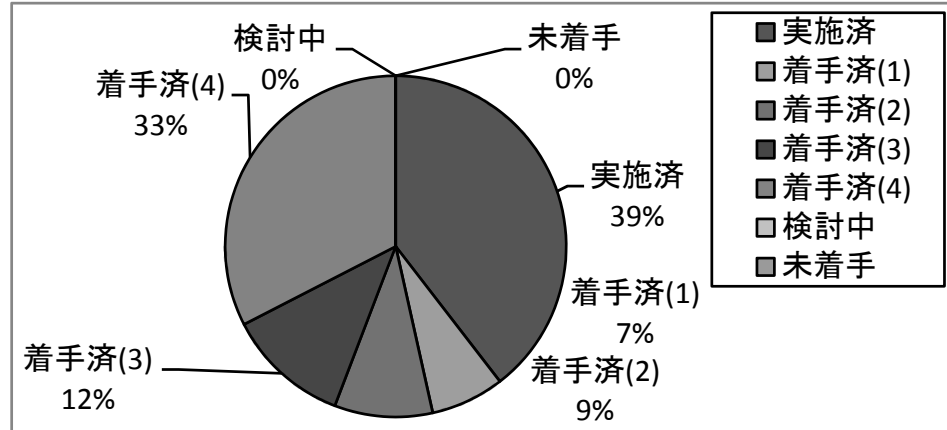

## ④防災まちづくり

進捗状況	事業数
実施済	20
着手済(1)	8
着手済(2)	8
着手済(3)	0
着手済(4)	4
検討中	0
未着手	0
計	40
整理・統合等	2

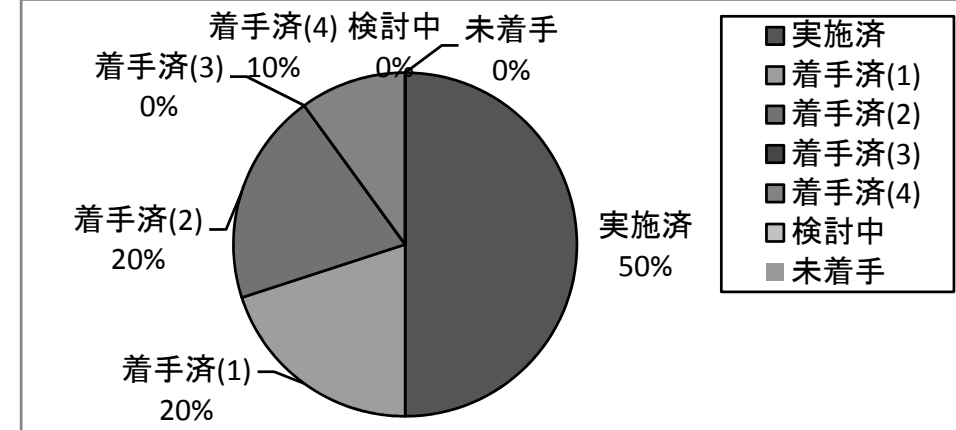


前回調査から進捗状況が変更した事業

分野	新たに「実施済」となったもの		新たに「着手済」となったもの		新たに「検討中」となったもの		新たに「整理・統合等」となったもの	
	頁	事業名	頁	事業名	頁	事業名	頁	事業名
市民生活の復興	10	被災校等体育部活動支援バス運行事業						
産業経済の復興	13	雇用調整助成金や雇用保険等の給付(「日本はひとつ」しごとプロジェクト)						
	16	農地等災害復旧事業						
	16	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)						
	16	東日本大震災農業生産対策交付金事業						
	17	海岸保全施設災害復旧事業						
都市基盤の復興	21	道路復旧事業						
防災まちづくり	34	潮位観測装置等整備事業						
合計件数	8		0		0		0	

# 復興計画事業一覧

## 復興計画事業進捗状況

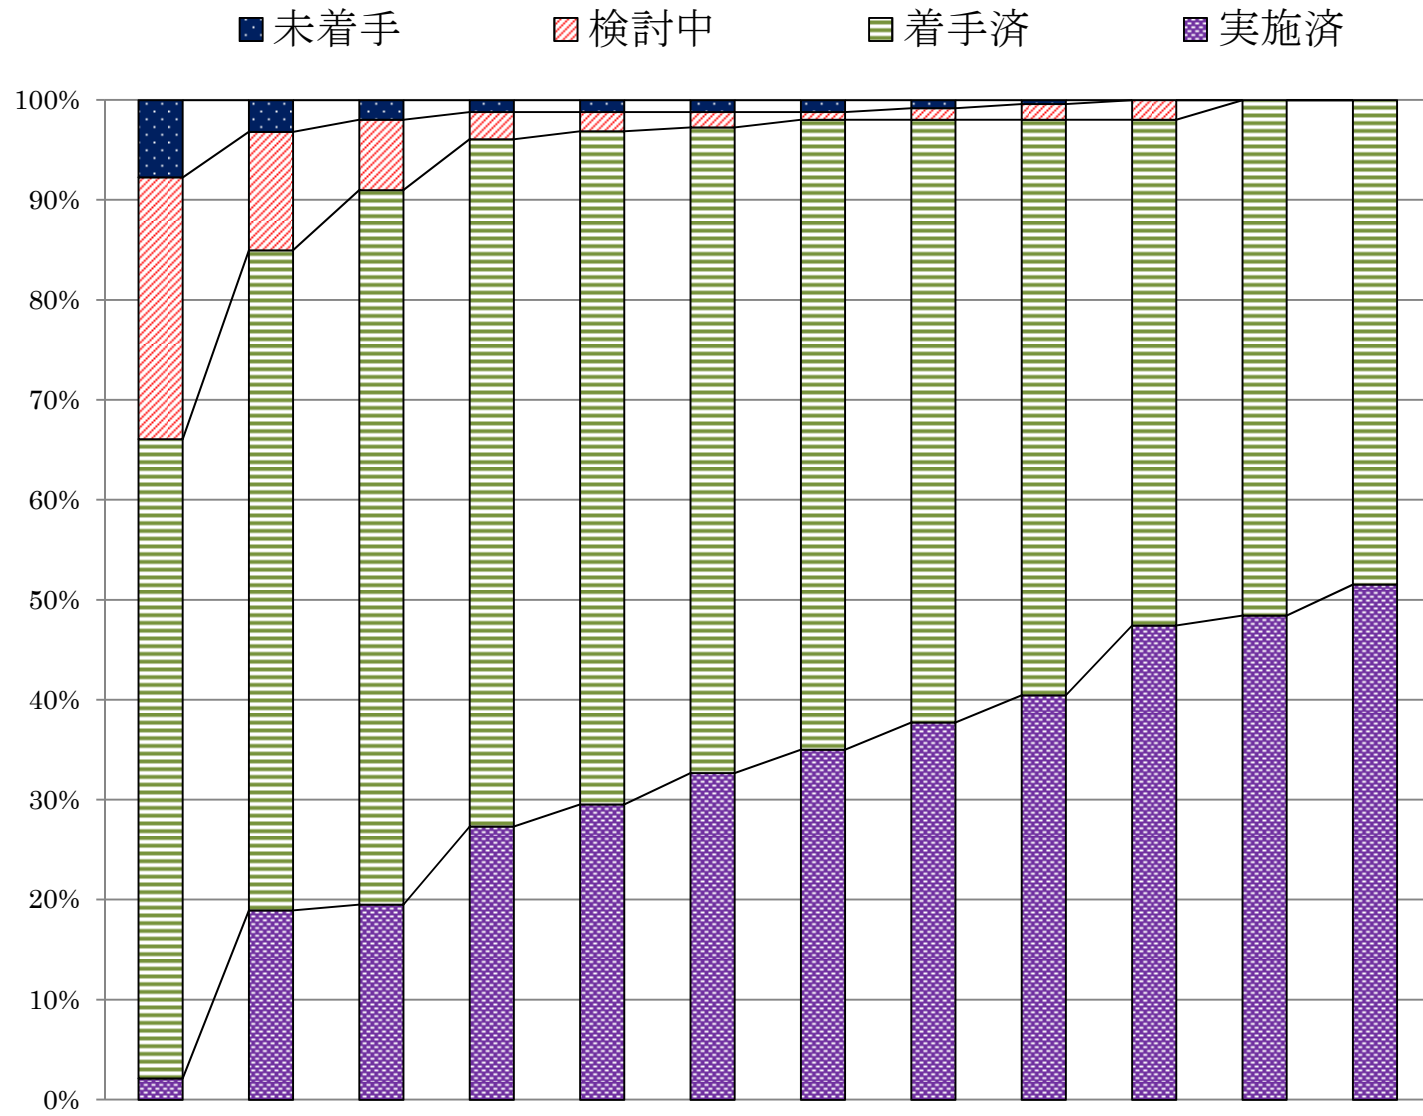

	H24.1.12		H25.3.31		H25.9.30		H26.3.31		H26.9.30		H27.3.31		H27.9.30		H28.3.31		H28.9.30		H29.3.31		H29.9.30		H30.3.31	
	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合
実施済	5	2%	48	19%	50	20%	70	27%	76	30%	84	33%	90	35%	97	38%	104	40%	122	47%	124	48%	132	52%
着手済	149	64%	167	66%	183	71%	176	69%	173	67%	166	64%	162	63%	155	60%	148	58%	130	51%	132	52%	124	48%
検討中	61	26%	30	12%	18	7%	7	3%	5	2%	4	2%	2	1%	3	1%	4	2%	5	2%	0	0%	0	0%
未着手	18	8%	8	3%	5	2%	3	1%	3	1%	3	1%	3	1%	2	1%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合計	233	100%	253	100%	256	100%	256	100%	257	100%	257	100%	257	100%	257	100%	257	100%	257	100%	256	100%	256	100%
整理・統合等	0		12		13		16		16		17		17		17		17		18		20		20	

■ 復興計画事業は、実施優先度により次の3種類に分類しています。

→ 事業番号の下に該当する表示を記載しています。

◎：緊急に実施する事業

○：急いで実施する事業

△：通常ペースで実施する事業

■ 事業区分は、次のとおりです。

H：ハード事業（施設などを整備する事業）

S：ソフト事業（サービスなどを提供する事業）

■ 復興計画策定後、新たに復興計画事業とした事業（復興計画策定時に掲載していない事業）については、当該事業欄全体を網かけ表示しています。

また、当該事業のうち、前回作成時（平成29年9月30日現在）以後に掲載した事業には事業番号欄に「新」、それ以外の事業については「追○」（○は番号）と記載しています。

■ 事業の進捗状況区分は、次のとおりです。

未着手：事業実施の見通しが立たないもの

検討中：事業実施に向け、準備段階のもの

着手済：事業に着手し、実施中のもの

実施済：すでに事業が終了したもの

整理・統合等：他事業との統合やその他の事情により、事業を実施しなかったもの

■ 着手済事業の細分類区分は、次のとおりです。

1 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの

⇒（実質的に実施済）

2 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの

3 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成（完了）していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

4 震災後からの事業で、まだ完成（完了）していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

■ 復興交付金が配分されている事業については、「復興交付金」欄に次のように記載しています。

有：基幹事業として配分されている場合

※有：効果促進事業として配分されている場合

■ 前回作成時（平成29年9月30日現在）以後における、進捗状況に係る主な変更箇所については、下線を付してあります。

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課															
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度													
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源												
方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。																			施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。																		
1 △	H	応急仮設住宅維持管理等支援事業	応急仮設住宅の補修や駐車場などの維持管理 ・市内37団地、1,801戸対象(当初)	市	H23～	着手済	4	※有	【現状】 ・施設の維持管理実施中(敷地料、街灯電気料、共用部分の光熱水費などを支出) ・一部応急仮設住宅の集会施設を整備済(復興交付金活用) ・平成26年11月14日に大船渡市応急仮設住宅の撤去・集約化計画を公表し、平成27年11月25日に計画を変更した。 ・入居状況等に基づき、計画を随時見直ししている。 ・空室:427戸(平成30年3月末現在) ・学校敷地と都市公園に建設された応急仮設住宅は撤去済み ・大田(市営球場)はグラウンド整備が完了し、芝生の養生中 ・施設の廃止・撤去:213棟 1,227戸(平成30年3月末現在) 【課題】 ・平成30年4月から特定延長に移行することから、恒久的住宅への円滑な移行を支援する必要がある。	319,641	22,467	253,962	3,177	40,035	72,034	41,635	40,004	42,382	38,766	39,565	25,886	19,369	住宅公園課														
3 △	S	住宅耐震改修補強事業	木造住宅の耐震補強工事実施者に補助金を交付し、災害に強いまちづくりを推進 ・昭和56年以前に建築された一戸建木造住宅が対象 ・工事費の1/2、上限:60万円	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・申請受付中 【課題】 ・今後においても、災害に強いまちづくりの手法として、本事業の周知を図る必要がある	1,851	925	462											1,851	住宅公園課													
4 ◎	H	埋蔵文化財調査事業	被災者の遺跡内への住宅建設などに伴う発掘調査	市	H23～H32	着手済	4	有	【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査、整理作業を実施中 ・平成29年度の調査状況 試掘調査:実施済→2件 【課題】 ・発掘調査に伴う整理作業の計画に遅れが生じており、今後更に整理作業の迅速化を図る必要がある。	285,464			214,098	71,366	14,713	13,790	63,653	72,518	35,157	35,553	50,080	生涯学習課															
施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。																																					
5 ◎	H	災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備 ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・市整備分 290戸(H23～H28) ・県整備分 511戸(H23～H28) 市管理分 249戸 県管理分 262戸(参考) 合計 801戸(整備計画戸数) ・市管理分 539戸 ・県管理分 262戸(参考)	県・市	H23～H29	実施済		有 ※有	【現状】 《市営》 ・全539戸が完成し入居済 《県営》 ・全262戸が完成し入居済(参考) H29:盛中央団地に物置を設置した	7,657,240			889,800	6,756,796	10,644	38,788	400,716	213,062	1,885,793	2,984,717	2,121,427	12,737	住宅公園課														
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																																					
7 ◎	H	防災集団移転促進事業	居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23～H31	着手済	4	有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜中・西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし	19,715,825			17,117,226	2,598,599	386,096	2,375,742	3,834,365	4,064,076	3,488,990	2,638,783	2,927,773	復興政策課 市街地整備課															

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
8 △	H がけ地近接等危険住宅移転事業	がけ地近接等危険住宅の移転促進 ・急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び災害危険区域対象 ・住宅を移転する者に対して除去費用として80.2万円を補助 ・新家屋取得に対して金融機関からの借入額利子相当額を補助	市	H24～H32	着手済	1	有	【現状】 ・申請受付件数:19件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法として、本事業の適切な周知を図る必要がある	541,981	13,525	6,762		385,446	136,248		826	0		11,470	21,721	17,209	163,585	163,585	163,585	住宅公園課
9 ○	H 漁業集落防災機能強化事業	漁業集落の地盤かさ上げ、集落道整備、水産用地造成などにより防災機能を強化します。	市	H25～H30	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・浦浜地区の宅地嵩上げ・内面排水工事完了 ・浦浜地区及び泊地区は水産用地・集落道工事に着手済み ・崎浜地区は水産用地1期工事完了、集落道工事着手済み ・綾里地区は水産用地・1号遊歩道完了 【課題】 ・事業用地の確保 ・他事業との調整	1,211,880				908,910	302,970				13,577	270,833	274,827	419,605	233,038		水産課	
施策工 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。																									
追1 ◎	S 被災者住宅再建支援事業	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅を建築または購入する場合の建築・購入費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:複数世帯200万円、単数世帯150万円 ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H32	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助金額を倍増、遡及適用) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:1,179件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	3,025,950		1,008,542		2,017,408			201,000	606,450	477,000	474,500	372,500	174,500	240,000	240,000	240,000	地域福祉課
追2 ◎	S 被災者住宅再建支援事業(住宅移転等敷地造成費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建築または購入する場合の敷地造成費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:敷地造成費のうち330㎡(100坪)までの工事費の1/2(上限:30万円) ・造成された宅地を購入した場合は、上記に相当する工事費の1/2(上限:30万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H32	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成28年度→平成30年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:446件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	155,471				155,471			36,739	37,861	23,660	16,924	10,287	4,086	25,914		住宅公園課	
追3 ◎	S 被災者住宅再建支援事業(水道工事費補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に一戸建ての住宅または併用住宅を建設または購入する場合の水道工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:市が定める基準額から算出した総額(10万円未満の場合を除く)の1/2(上限:200万円) ※災害危険区域内においては、建築基準を満たす場合に限る	市	H24～H32	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成32年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:303件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・特になし	73,504				73,504			11,305	15,584	17,902	15,264	6,434	2,515	2,000	1,500	1,000	水道事業所
追4 ◎	S 生活再建住宅支援事業(復興住宅新築補助金)	住宅を滅失した被災者が、住宅の新築・購入する場合に要する費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:バリアフリー対応工事 床面積75㎡未満=40万円 床面積75㎡以上120㎡未満=60万円 床面積120㎡以上=90万円 県産材使用工事 使用量10㎡以上=20万円 使用量20㎡以上=30万円 使用量30㎡以上=40万円	市	H24～H32	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:1,026件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	761,400		761,400					53,500	126,700	144,700	165,400	157,100	46,200	67,800		住宅公園課	



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
追5◎	S 生活再建住宅支援事業(被災住宅補修等補助金)	被災した住宅の補修・改修工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:補修工事(半壊・一部損壊) 対象工事費の1/2以内で上限30万円 改修工事 耐震改修工事費の1/2以内で上限60万円 バリアフリー改修工事費の1/2以内で上限60万円 県産材使用改修工事費の1/2以内で上限20万円	市	H24~H32	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:856件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	301,566		301,566						135,914	62,482	42,928	26,807	11,035	9,316	13,084		住宅公園課
追6◎	S 生活再建住宅支援事業(被災宅地復旧補助金)	被災した宅地の復旧工事費の一部に対し、補助金を交付 ・対象工事 のり面の保護、排水施設の設置、地盤の補強・整地、よう壁の設置・補強(旧よう壁の除去を含む)、地盤調査・設計調査費 ・補助金額:対象工事費の1/2以内で上限200万円	市	H24~H32	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成28年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:344件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	374,804		374,804						154,603	75,680	64,673	41,402	16,446	11,017	10,983		住宅公園課
追7◎	S 生活再建住宅支援事業(被災住宅債務利子補給補助金)	被災した住宅の再建資金を金融機関などから新たに借入れた場合に、住宅ローンの支払い利子の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額:支払利子相当額	市	H24~H32	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助上限額の引き上げなど) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:703件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	1,947,328		54,917		1,892,411				12,828	441,691	411,298	349,898	220,565	121,736	389,312		住宅公園課
追8◎	S 生活再建住宅支援事業(住宅再建移転補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅再建移転を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付 ・補助金額:一律5万円 ・1世帯1回限り	市	H25~H32	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数:1,336件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	93,500				93,500				23,900	10,250	14,900	14,450	3,650	26,350		住宅公園課	
追9◎	S 浄化槽設置整備事業	被災住居の再建に伴う下水道未供用区域での低炭素社会対応型浄化槽の設置に対し、補助金を交付 ・補助金額:5人槽 352千円 7人槽 441千円 10人槽 588千円	市	H24~H30	着手済	4	有	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・平成24年度交付件数:105件 ・平成25年度交付件数:143件 ・平成26年度交付件数:163件 ・平成27年度交付件数:154件 ・平成28年度交付件数:86件 ・平成29年度交付件数:24件 【課題】 ・特になし	340,535								43,333	58,489	65,912	61,502	34,366	9,752	67,181		下水道事業所
◎	H 防災集団移転促進事業【再掲】	居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23~H31	着手済		有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜中・西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし																	復興政策課 市街地整備課

施策オ 新たな居住環境において、人と地域のつながりが保てるよう配慮します。

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
13△	S	沿岸被災地仮設住宅運営支援事業	(北上市)市	H23～H30	着手済	2		【現状】 ・全応急仮設住宅について支援を実施中 ・平成25年度で北上市の支援が終了し、平成26年度は市が事業主体となった。 ・平成27年3月に市も参加する「大船渡市応急仮設住宅支援協議会」を設立し、平成27年度から事業主体となった。 ・平成27年9月から災害公営住宅のコミュニティ形成支援を開始した。 【課題】 ・事業の継続実施が必要である	1,491,821				926,599	565,222		569,460	279,681	215,037	165,000	132,643	80,000	50,000				住宅公園課
方針② 市民が安心して暮らせるよう保健、医療、介護、福祉など生活に密接に関係する各種サービスの充実を図ります。																										
施策ア 被災者の心と体のケア対策を実施します。																										
追11○	S	東日本大震災津波被災地健康支援事業	市	H24～H30	着手済	2		【現状】 ・被災者全般に対する支援を実施中 【課題】 ・必要人員の確保	50,088	13,333	36,544				211	6,904	5,868	8,563	8,272	9,123	5,533	5,825			健康推進課	
追12○	S	被災者健康づくりサポート事業	市	H24～H30	着手済	2		【現状】 ・各種健康教室・イベント及び相談を実施中 【課題】 ・不参加者へのアプローチ	33,827	4,442	28,822				563	7,907	10,505	3,404	4,434	3,226	3,546	805			健康推進課	
15△	S	こころのケア事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・保健師が関係機関からの情報を基に戸別訪問を実施中 ・グループケアセミナーやゲートキーパー養成講座などを実施中 【課題】 ・生活環境の変化に伴う健康課題の把握と対応	11,221	8,731	1,548				942	150	432	503	515	2,505	1,945	1,187	3,984			地域福祉課
16△	S	公害防止測定調査事業	市	H23～H32	着手済	2		【現状】 ・市内2カ所で測定を実施中 【課題】 ・復興事業などの粉じんへの影響について注視する必要がある	1,202						1,202	215	154	103	105	105	104	104	104	104	104	市民環境課
18◎	S	環境放射線量測定事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・H29より年2回、市内9カ所で定期測定を実施中 ・測定結果などはホームページや市広報紙で随時周知 ・市民に対して測定器を貸出中 【課題】 ・市内におけるさまざまな測定結果などを注視しながら、状況に応じた対策を検討する必要がある	4,308		843				3,465	200	1,545	273	615	417	384	433	147	147	147	市民環境課
施策イ 被災した保健・医療・介護・福祉施設を早期に復旧します。																										
施策ウ 地域医療を充実します。																										
23◎	S	医師確保対策事業(市町村医師養成事業、地域医療調査研究事業を含む)	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・医師奨学金事業は負担金納入により実施する ・気仙広域環境未来都市医療・介護・保健・福祉連携協議会で関連事項を協議 【課題】 ・関係機関との調整	19,833				2,500	17,333		2,473	2,830	2,841	2,175	2,150	2,336	2,233	2,795			国保年金課
施策エ 地域全体で高齢者や障がい者、子どもたちを支え合うやさしいまちづくりに取り組みます。																										



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
27 △	S	放課後児童健全育成事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・被災したにこにこ浜っ子クラブは、平成25年3月に民間支援による仮設専用施設で再開。平成29年3月に専用施設を赤崎小学校新校舎の隣に復旧し、平成29年4月からは新施設で運営している。なお、それ以外の児童施設は被災を免れ通常運営している。 ・五葉キッズは平成26年7月に、キッピン学童クラブは平成28年7月に、りょうりキッズは平成29年4月にそれぞれ開設している。 ・うみねこキッズは平成25年5月に、五葉キッズは平成28年7月、 <b>綾里キッズは平成30年3月</b> にそれぞれ小学校敷地内に専用施設を整備した。 【課題】 ・吉浜小学校校区では、専用施設を平成30年度中に整備する予定である。	772.913	224.447	254.394	24.000	270.072	24.407	33.121	62.823	40.987	57.490	170.507	105.377	118.201	80.000	80.000	子ども課	
29 ◎	H	シルバー人材センター運営事業	市 シルバー人材センター	H23～	着手済	4		【現状】 ・仮設事務所で運営中 ・施設の再建候補地を選定、候補地の利用について調整中 【課題】 ・恒久的施設の早期整備															長寿社会課		
方針③ 災害廃棄物を適正に処理します。 施策ア 大規模災害時に大量発生した各種の廃棄物を迅速に処理します。 施策イ ガレキについては、市内企業などにおいて処理し、処理後に発生する灰などもできるかぎり有効活用します。																									
方針④ 被災した教育施設の再建などにより、教育機会の確保を図ります。 施策ア 貴重な学術研究機関として、多くの分野で貢献いただいている北里大学海洋生命科学部の三陸キャンパスが、早期に再開されるよう取り組みます。																									
33 ◎	S	北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立 ・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターを開設 ・三陸臨海教育センターでの学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター活動支援補助金交付要綱」を策定→平成26以降、毎年夏期に海洋生命科学部が海洋実習を実施 ・三陸臨海教育センターの施設整備を支援するため、平成27年4月「大船渡市北里大学海洋研究拠点施設整備費補助金交付要綱」を策定→平成27年4月から三陸臨海教育センターの施設整備を実施し、7月に完了 ・平成29年3月、大船渡市北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス早期再開期成同盟会の組織・機能を北里大学三陸キャンパス活用検討協議会に一本化した。 【課題】 ・三陸キャンパスの活用促進 ・上記以外の支援内容	34.949			24.300	10.649	365	427	859	2.101	26.196	1.311	1.351	2.339			企画調整課	
34 ◎	S	北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・グラウンドは、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・ <b>体育館が老朽化し、一般の利用に供するためには修繕が必要となっている。</b>															企画調整課		
施策イ 災害に強い教育施設を整備します。 施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。																									



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
追15△	S	仮設住宅の再編等にかかる子どもの学習支援によるコミュニティ復興支援事業	市	H24～H30	着手済	2		【現状】 ・スクールガード配置事業を市内13小中学校で実施 ・市内小・中学校19校、保育園・こども園5園で開催 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保	88,722		88,722					11,220	15,196	13,925	13,980	9,332	12,149	12,920			生涯学習課
施策工 生涯学習環境を充実します。																									
追15△	S	学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業【再掲】	市	H24～H30	着手済			【現状】 ・スクールガード配置事業を市内13小中学校で実施 ・市内小・中学校19校、保育園・こども園5園で開催 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保																	生涯学習課
施策オ 各種スポーツを推進します。																									
方針⑤ 市民共有の財産である歴史・文化資源を活用して、うるおいと安らぎをつくりだします。																									
施策ア 歴史・文化資源の継承・普及活動に取り組みます。																									
追15△	S	学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業【再掲】	市	H24～H30	着手済			【現状】 ・スクールガード配置事業を市内13小中学校で実施 ・市内小・中学校19校、保育園・こども園5園で開催 【課題】 ・事業の理解促進 ・ボランティアの確保																	生涯学習課
60△	H	博物館常設展示改修事業	市	H24～	着手済	4		【現状】 ・「三陸ジオパーク」のミニコーナーを開設し、ジオパークをPRするパネルの展示、関係パンフレット等の配布を実施 ・津波災害に係る資料、情報などを収集するとともに、展示内容を検討中 【課題】 ・東日本大震災と過去の津波を二連の展示とする常設展示の改修が必要	11,351			5,122	4,003	2,226		927							10,424		博物館
61△	S	市民芸術祭開催事業	実行委員会	H23～H32	着手済	1		【現状】 ・平成26年度以降は総合美術展を市民体育館において開催。また、カメラアホール、リアスホール等において市内芸術団体の展示・発表を行なう 【課題】 ・震災後規模を縮小して開催しており、今後参加団体、人数等の復活に取り組む	9,859						9,859	1,300	1,300	1,300	1,363	1,133	1,082	1,081	1,300		生涯学習課

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課		
									財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
方針① 経済活動の早期再建を支援し、雇用の確保を図ります。																								
施策ア 仮設の工場や事務所の整備などにより、被災企業などの早期の事業再開を支援します。																								
1 ◎	H	仮設店舗等貸与事業	中小企業基盤整備機構 市	H23～	着手済	2		【現状】 ・81カ所496区画を整備(平成30年3月末現在) ・完成施設から随時営業を開始 ・仮設施設貸与事業の今後の運営方針を策定(平成27年7月) ・地権者などの意向により、41カ所328区画の施設を撤去(平成30年3月末現在) ・譲渡方針を策定(平成27年11月) ・39カ所150区画の施設を施設使用者へ譲渡 ・2カ所12区画の施設を用途を変更し、市の施設として使用 ・2カ所6区画の施設の対応について現在調整中 ※ 施設の一部を撤去、一部を譲渡した施設が3施設あり、譲渡と撤去の双方でカウントしているため、一部合計が合わない部分があります。 【課題】 ・地権者の意向や公共工事等のスケジュールに即した施設撤去及び譲渡の進捗管理	239,720		20,023		138,315	81,382	7,079	16,104	22,084	31,091	21,502	14,339	127,308	213	商工課	
2 ◎	S	中小企業等復旧・復興支援事業(グループ補助金)	国・県	H23～	着手済	4		【現状】 ・平成23年度～平成28年度までに61グループ388事業所が採択となった ・平成29年度は2回の募集が行われ2グループ3事業所が採択となった 【課題】 ・地域の実情に応じた事業の継続実施															商工課	
施策イ 雇用環境を改善し、雇用の維持と創出を図ります。																								
3 ○	S	企業誘致推進事業	市 関係団体	H23～	着手済	1		【現状】 ・案件ごとに折衝中 ・制度適用案件に企業立地奨励補助金を交付 【課題】 ・工場などの用地・空き物件の不足	117,042		47,200			69,842	48,338		9,120	13,267		16,317	10,000	10,000	10,000	企業立地港湾課
4 ○	H	工業用地整備事業	県・市	H23～	着手済	3		【現状】 ・永浜・山口地区工業用地は、県において、平成28年3月に造成工事が完了、9月から分譲開始、29年2月から再公募したが、6月からILC活用検討のため公募を一時中断 【課題】 ・新たな工業用地の検討及び被災跡地の利活用																企業立地港湾課
追 13 ◎	H	産業用地整備事業	市	H29	着手済	4	有	【現状】 ・H29.6測量設計完了 ・H29.8工事着手 ・H30.3工事完了 【課題】 ・立地予定企業が実施する施設整備との調整 ・近隣で実施する復興事業との調整	101,516				81,212	20,304							101,516			土地利用課

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
									財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
5△	S	求職者資格取得支援事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・対象技能講習を14種類に拡大 ・平成23年度実績:56件(759千円) ・平成24年度実績:25件(320千円) ・平成25年度実績:14件(187千円) ・平成26年度実績:12件(158千円) ・平成27年度実績:6件(67千円) ・平成28年度実績:13件(172千円) ・平成29年度実績:5件(52千円) 【課題】 ・事業の周知を徹底する必要がある。	2,615					759	320	187	158	67	172	52	300	300	300	300	商工課
6△	S	雇用促進奨励支援事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 <b>事業主</b> ・平成23年度実績:14件(1,900千円) ・平成24年度実績:33件(4,000千円) ・平成25年度実績:38件(5,600千円) ・平成26年度実績:36件(5,200千円) ・平成27年度実績:46件(6,200千円) ・平成28年度実績:31件(4,500千円) ・平成29年度実績:2件(200千円) 【現状】 <b>UIターン者</b> ・平成29年度実績:12件(720千円) 【課題】 ・新たに助成対象となる <b>新規学卒者</b> 、UIターン者等への制度の周知	50,055					1,900	4,000	5,600	5,200	6,200	4,500	920	7,245	7,245	7,245	7,245	商工課
7△	S	ジョブカフェ気仙支援事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・平成26年12月1日からシーバル大船渡1階に移転し開所中 【課題】 ・事業の充実を図る必要がある	28,398					3,377	2,877	2,181	2,776	2,810	2,812	2,874	2,897	2,897	2,897	2,897	商工課
12△	S	新規漁業就業者育成支援事業	漁協	H25～H32	整理・統合等			【現状】 ・各種支援制度の周知 ・意見交換会を開催 ・平成26年度に各漁協で策定した地域再生営漁計画に基づき事業を検討 【課題】 ・生産者や漁協などにおける課題を把握し、事業を展開する必要がある																	水産課
施策ウ 被災者の復興関連事業への雇用を促します。																									
21◎	S	雇用調整助成金や雇用保険等の給付(「日本はひとつ」ごとプロジェクト)	国・県	H23～H25	実施済			【現状】 ・就業支援員による事業所訪問などを実施 【課題】 ・特になし																商工課	
追2○	S	事業復興型雇用創出事業	県	H23～H29	着手済	2		【現状】 第1期認定数 H23～H25:13,827人 第2期認定数 H26～H28:4,615人 【課題】 ・事業の周知																商工課	
施策エ 既存の借入金と新たな借入金による二重ローンの軽減について、関係機関に働きかけます。																									



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
25◎	S	復興支援ファンド設立支援事業	国・県金融機関など	H23～	着手済	2		【現状】 ・平成23年10月に復興支援ファンドとして「岩手県産業復興機構」が、平成24年3月に「東日本大震災事業者再生支援機構」が設立された ・市内で岩手県産業復興機構により26件の債権買取が行われた(平成30年3月末現在) ・東日本大震災事業者再生支援機構による市内の支援決定件数は22件(平成30年3月末現在) 【課題】 ・関係機関と協力しながら、さらなる事業の周知を図る必要がある																		商工課	
方針② 産業基盤を再建します。																											
施策ア 被災した各種産業の生産基盤などを早期に復旧します。																											
施策イ 基盤整備にあたっては、建築物の構造強化や電源対策の推進など、防災機能の向上に配慮するほか、重要施設などへの重点・優先投資を行います。																											
方針③ 水産業の早期再建を図ります。																											
施策ア 漁船や養殖施設の共有・共用化、漁業の共同経営化などに対する支援を行います。																											
31◎	S	水産業経営基盤復旧支援事業	漁協	H23～H32	着手済	4		【現状】 ・事業実施主体が事業実施中 【課題】 ・整備した施設の適正管理	6,987,969	4,658,533	776,441		776,440	776,555	1,146,634	1,261,398	1,655,004	1,304,966		738,054	732,613	149,300					水産課
追6○	S	東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・県や関係機関と連携して無利子融資制度を創設 ・資金需要に応じて利子補給承認を実施中 【課題】 ・関係機関との連携による資金需要への迅速な対応	9,728							122	932	1,445	1,435	1,329	1,183	1,038	1,220	1,024		水産課	
施策イ 新しい大船渡魚市場を早期に整備します。																											
施策ウ 漁業協同組合の経営安定化を図ります。																											
◎	S	水産業経営基盤復旧支援事業【再掲】	漁協	H23～H32	着手済			【現状】 ・事業実施主体が事業実施中 【課題】 ・整備した施設の適正管理																			水産課
施策エ 地域特産水産物のPRや地産地消の取り組みを進めます。																											
40△	S	漁業の6次産業化支援事業	漁協	H26～H31	着手済	2		【現状】 ・各種支援制度の周知 ・ブランド化推進に関する協議会を開催 ・ブランド化推進に関する研修会へ出席 ・平成27年度より地域再生営漁計画支援事業を実施し、ブランド化推進の取り組みを支援している。 【課題】 ・漁協、漁業者と一丸となって事業展開を図る必要がある	19,216		7,233							16	1,076	3,684	2,440	4,000	4,000	4,000	4,000		水産課
施策オ 水産関連施設の防災機能の向上を図るほか、集約化などにより効果的に整備します。																											
42◎	H	漁港関係施設等復旧事業	市	H23～H25	整理・統合等			【現状】 ・No.49海上ガレキ処理事業に統合 【課題】 ・なし																			水産課



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)							担当課						
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度		30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
43 ○	H 漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)	被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧 県管理:門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港) 市管理:碓石、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港)	県・市	H23~H32	着手済	4		【現状】 ・市内全22漁港(県営:6、市営:16)の本復旧事業に着手 ・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は99% 一施設全部の使用を開始した施設は177施設(一部の使用を開始した施設を含めると180施設) ・未発注の施設は、防潮堤工事と関連している施設であり、防潮堤工事の進捗を見ながら、随時発注していく。 ・県において、大船渡漁港海岸と綾里漁港海岸の完了時期をそれぞれH31、H32まで延伸。 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある	71,138,155	24,015,268	47,122,887					354,564	2,104,445	12,576,471	12,666,229	9,680,735	9,491,867	6,429,056	8,000,000	6,000,000	3,834,788	水産課		
追7 ◎	H 漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碓石の市営全16漁港の用地のかさ上げ	市	H24~H31	着手済	4	有	【現状】 ・測量・設計委託業務終了 ・全16漁港のうち全漁港で工事着手済→15漁港(扇洞、碓石、鬼沢、小壁、千歳、増館、小路、長崎、合足、小石浜、砂子浜、泊里、吉浜、泊、野野前)が終了。蛸ノ浦漁港は、30年度以降も継続実施予定。 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要	700,000																		水産課	
◎	S 水産業経営基盤復旧支援事業【再掲】	漁協などによる養殖施設などの共同利用施設の一括整備に対する補助	漁協	H23~H32	着手済			【現状】 ・事業実施主体が事業実施中 【課題】 ・整備した施設の適正管理																				水産課
46 ○	H アワビの里復旧事業	つくり育てる漁業を推進するため、津波により被災したアワビ生産センターを復旧	市	H26~H32	着手済	1		【現状】 ・検討の結果アワビ生産センター復旧を見送り、漁協が実施する種苗放流経費に補助を行う 【課題】 ・アワビ種苗放流を継続し、つくり育てる漁業を推進する	12,186											1,848	1,957	2,900	1,827	1,827	1,827	1,827	水産課	
47 ○	S 採介藻漁業復旧支援事業	漁協が行う採介藻漁業の再開に必要な紫外線海水殺菌装置などの整備に対する補助	漁協	H24~H25	整理・統合等			【現状】 ・No.26水産業共同利用施設復旧支援事業に統合 【課題】 ・なし																			水産課	
施策力 持続可能な水産業の仕組みを模索します。																												
49 ◎	H 海上ガレキ処理事業	湾内の水質汚染や漁業への影響を考慮し、海上ガレキを撤去、運搬及び処理	市	H23~H30	着手済	2		【現状】 ・平成23・24年度は、委託により事業実施 ・平成25年度は、赤崎地区及び綾里地区でガレキ撤去実施 ・平成26年度以降は、漁業者などの情報に基づき、新たに発見されたガレキやボランティアダイバーが陸揚げしたガレキについて、都度対応 【課題】 ・事業終了後においても、ガレキが発見された際には、迅速に処理する必要がある	328,536	282,660	21,984					273,840	40,227	2,247	4,831	1,968	3,123		2,300			水産課		
○	H アワビの里復旧事業【再掲】	つくり育てる漁業を推進するため、津波により被災したアワビ生産センターを復旧	市	H26~H32	着手済			【現状】 ・検討の結果アワビ生産センター復旧を見送り、漁協が実施する種苗放流経費に補助を行う 【課題】 ・アワビ種苗放流を継続し、つくり育てる漁業を推進する																			水産課	











事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
93 ◎	S 東日本大震災中小企業復旧資金利子補給事業	岩手県中小企業災害復旧資金を借り受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付 ・貸付利率 3年以内:年1.7%以内(固定) 3年~10年以内:年1.9%以内(固定)	市	H23~H34	着手済	2		【現状】 ・利子補給承認額:69,743千円 ・申請件数:106件 ・債権残数:73件 【課題】 ・特になし	63,766					1,522	13,110	11,952	10,032	8,092	6,288	4,870	3,900	2,500	1,500	商工課	
施策イ 地場産業の連携・高度化や新たな分野での起業などを支援します。 施策ウ 北里大学など関係機関との産学官連携の取り組みを推進します。																									
◎	S 北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業【再掲】	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスの早期再開に向けた取り組みを関係機関とともに積極的に展開	市	H23~	着手済			【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立 ・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育センターを開設 ・三陸臨海教育センターでの学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育センター活動支援補助金交付要綱」を策定→平成26年以降、毎年夏期に海洋生命科学部が海洋実習を実施 ・三陸臨海教育センターの施設整備を支援するため、平成27年4月「大船渡市北里大学海洋研究拠点施設整備費補助金交付要綱」を策定→平成27年4月から三陸臨海教育センターの施設整備を実施し、7月に完了 ・平成29年3月、大船渡市北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス早期再開期成同盟会の組織・機能を北里大学三陸キャンパス活用検討協議会に一本化した。 【課題】 ・三陸キャンパスの活用促進 ・上記以外の支援内容																企画調整課	
95 ○	S 産学官連携交流促進支援事業	北里大学及び岩手大学と産学官連携に関する協議の場を設けるとともに、市内事業所などの復旧状況を見据えながら共同研究事業を支援 【共同研究補助】 ・大学と市内事業所 ・補助率:2/3 ・上限120万円	市	H23~	着手済	1		【現状】 ・共同研究事業について、補助金交付済 ・平成24年度実績:2件 ・平成25年度実績:1件 ・平成26年度から共同研究先に岩手大学を追加 ・平成26年度実績:3件 ・平成27年度から北里大学全学部を共同研究先とした ・平成27年度実績:3件 ・平成28年度実績:5件 ・平成29年度交付決定件数:5件 【課題】 ・北里大学・岩手大学と市内企業による共同研究事業の実施形態・内容について検討する必要がある	42,600					2,400	1,200	3,600	3,600	6,000	5,400	8,400	6,000	6,000	商工課		
◎	S 北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業【再掲】	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス内施設(体育館、グラウンドなど)や設備(海水ポンプ、水槽施設など)の利用を積極的に促進	市	H23~	着手済			【現状】 ・グラウンドは、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・体育館が老朽化し、一般の利用に供するためには修繕が必要となっている。																企画調整課	
96 △	S 三陸町養殖海域の水質調査事業	北里大学海洋生命科学部の協力を得ながら、三陸町内の養殖海域において水質調査を実施	市	H23~H32	着手済	1		【現状】 ・平成23~29年度事業終了 【課題】 ・北里大学海洋生命科学部との連携・協力体制の確保	9,597				9,597	903	945	945	972	972	972	972	972	972	972	972	水産課







事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)							担当課			
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度		30年度	31年度	32年度
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
◎	H 港湾施設復旧事業【再掲】	・国:永浜地区岸壁(-13m)、野々田地区岸壁(-13m)の復旧 ・県:野々田・茶屋前、永浜山口地区の岸壁、物揚場、防潮堤、防波堤、護岸、係留施設、水門、臨港道路などの復旧	国・県	H23~	着手済			【現状】 ・野々田地区、茶屋前地区及び赤土倉地区の港湾施設は、防潮堤・水門・臨港道路の一部を除き完成。ただし、全ての完成は平成32年度を予定。 ・永浜・山口地区の港湾施設は、平成31年度内に完了し、清水地区の港湾施設は平成32年度の完了見込み。 【課題】 ・防潮堤などの復旧について、まちづくりとの整合を図る必要がある															企業立地港湾課		
追1 ◎	H 海岸施設災害復旧事業	被災した海岸施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸防潮堤、水門などの復旧を実施するとともに、地域住民に親しまれていた海水浴場としての砂浜を復旧 ・海岸施設:越喜来地区、下甫嶺地先	県	H23~H27	実施済			【現状】 ・海岸防潮堤高さをT.P+11.5mに設定 ・越喜来地区海岸の仮防潮堤工事は終了 ・平成25年3月に工事発注済 【課題】 ・隣接海岸災害復旧事業など関連事業との調整が必要	5,133,975	5,133,975				1,755,810	2,371,845	1,006,320							建設課		
◎	H 海岸保全施設災害復旧事業【再掲】	被災した農地海岸保全施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸堤防の復旧・整備を実施 ・海岸保全施設:吉浜、沖田、合足	県	H23~H28	実施済			【現状】 ・沖田:防潮堤復旧工事終了 ・合足:堤体工事終了 ・吉浜:離岸堤工事終了、防潮堤復旧工事進捗中 【課題】 ・特になし															農林課		
○	H 漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)【再掲】	被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧 県管理:門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港) 市管理:碓氷、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港)	県・市	H23~H32	着手済			【現状】 ・市内全22漁港(県営:6、市営:16)の本復旧事業に着手 ・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は99%→施設全部の使用を開始した施設は177施設(一部の使用を開始した施設を含めると180施設) ・未発注の施設は、防潮堤工事と関連している施設であり、防潮堤工事の進捗を見ながら、随時発注していく。 ・県において、大船渡漁港海岸と綾里漁港海岸の完了時期をそれぞれH31、H32まで延伸。 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある															水産課		
追 ◎	H 漁港施設機能強化事業【再掲】	地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碓氷の市営全16漁港の用地のかさ上げ	市	H24~H31	着手済		有	【現状】 ・測量・設計委託業務終了 ・全16漁港のうち全漁港で工事着手済→15漁港(扇洞、碓氷、鬼沢、小壁、千歳、増館、小路、長崎、合足、小石浜、砂子浜、泊里、吉浜、泊、野野前)が終了。蛸ノ浦漁港は、30年度以降も継続実施予定。 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要															水産課		

施策エ 上水道・下水道を早期に復旧します。

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
11 ◎	H 水道施設復旧事業	・破損配水管、給水設備などの布設替え・修理 ・破損給水設備の修理・交換 ・電気計装設備・ポンプ設備の修理・交換(上水道) ・土地区画整理事業などに伴う送配水管の布設替え ・防災集団移転促進事業で整備する住宅団地への配水管の布設など ・テレメーター設備の更新(簡易水道)	市	H23~H32	着手済	4	※有	【現状】 ・土地区画整理事業区域内及び防潮堤、道路の嵩上げ等に対応した送配水管布設を実施中 ・防災集団移転に伴う住宅団地への配水管布設工事は28年度で完了 【課題】 ・他事業の遅れから、当該事業にも遅れが生じている。	1,832,681	1,293,191		25,900	104,886	408,704	155,850	175,632	25,554	115,722	171,756	284,018	140,302	438,097	224,750	101,000	水道事業所 簡易水道事業所	
12 △	H 水道施設整備事業	・既存施設の耐震化及び改修 ・既存管の耐震管への更新、設備の更新など ・地盤かさ上げに伴う送配水管の布設替え	市	H24~	着手済	4		【現状】 ・簡易水道事業分は平成24年度から、上水道事業分は平成25年度から着手済 【課題】 ・被災した水道施設の復旧事業や復興事業を優先しおり、事業の遅れから当該事業の実施に支障をきたしている。	2,096,479			1,658,380	430,469	7,630		2,457	86,569	124,412	225,717	201,182	181,782	425,260	367,400	481,700	水道事業所 簡易水道事業所	
13 ◎	H 公共下水道及び都市下水路災害復旧事業	公共下水道応急処理、本復旧工事 ・大船渡浄化センター(大船渡町)災害復旧 簡易処理(平成23年3月開始) 通常(生物)処理開始 (平成24年1月開始) 本復旧工事(平成24年度終了) ・管渠施設(大船渡町・盛町・赤崎町)調査・設計(平成23年度) 管渠修繕 ・都市下水路補修、堆積土砂撤去 新田都市下水路ほか 調査・測量・設計、土砂撤去、修繕	市	H23~H30	着手済	4		【現状】 《大船渡浄化センター》 ・日本下水道事業団に委託して事業実施 ・生物処理は平成24年1月より開始 ・平成25年3月に本復旧工事終了 ・平成30年度：場内整備工事実施予定 《管渠施設》 ・流下機能に支障が生じる重大な損傷なく供用中 ・道路の嵩上げなど土地利用計画との調整を図りながら復旧を進めている 平成29年度は、小規模管渠修繕、マンホール嵩上げ施工予定 平成30年度は、小規模管渠修繕、マンホール嵩上げ施工予定 《都市下水路》 ・平成24年11月に桜場都市下水路水門工事終了 ・新田都市下水路復旧工事 平成24年度：実施設計 平成25-26年度：復旧工事施工 平成27年3月：工事終了 ・盛東部都市下水路水門補修工事 平成30年3月：工事終了 【課題】 ・特になし	1,839,245	1,705,251		21,600	112,394	694,527	895,467	100,683	94,602	4,401	4,320	23,245	22,000					下水道事業所

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
追2 ◎	H 公共下水道整備事業	被災地の下水道施設の早期供用を図るため、次の整備を実施 ・盛川左岸幹線推進工事 470m ・土地区画整理事業に伴う面整備(大船渡分区分) 36.1ha ・新田都市下水路嵩上げ工事 846m ・大船渡北・下船渡・赤崎南地区防災集団移転促進事業関連下水道工事 ・下水道台帳再整備 ・公共下水道(蛸ノ浦地区漁業集落排水施設)接続 他	市	H24~H30	着手済	4	有 ※有	【現状】 《盛川左岸幹線推進工事》 ・平成26年度:3月に工事終了 ・平成27年3月から赤崎町上三区地区で下水道の供用を開始 《大船渡駅周辺地区土地区画整理事業下水道計画策定》 平成26年度:12月に業務終了 ・上記計画策定後に土地区画整理事業と一体的に実施する工事などは、別事業に移管 《新田都市下水路嵩上げ工事》 ・平成26年度:3月に工事終了 《防災集団移転促進事業関連下水道工事》 ・大船渡北地区 平成26年度:10月に工事終了 ・下船渡地区 平成26年度:9月に工事終了 ・赤崎南地区 平成25年度:実施設計 平成27-30年度:整備工事施工 平成28年度:実施設計 《下水道台帳再整備》 平成27年度:3月に業務完了 《公共下水道(蛸ノ浦地区漁業集落排水施設)接続》 平成27年度:3月に実施設計業務完了 平成29年度:工事着手 【課題】 ・まちづくり関連事業などとの調整を図りながら、事業を実施する必要がある	1,598,742			54,300	1,240,328	304,114			10,047	162,652	509,942	285,269	165,980	220,840	244,012			下水道事業所
14 ◎	H 漁業集落排水施設 復旧事業	・蛸ノ浦漁業集落排水施設 簡易処理(平成23年5月開始) 仮設処理施設により通常(生物)処理(平成23年7月開始) 本復旧工事(平成24年度終了) ・砂子浜漁業集落排水施設 通常(生物)処理(平成23年4月開始) 本復旧工事(平成24年度終了) ・小石浜漁業集落排水施設 通常(生物)処理(平成23年4月開始) 本復旧工事(平成24年度終了) ・根白漁業集落排水施設 簡易処理(平成23年5月開始) 仮設処理施設により通常(生物)処理(平成23年10月開始) 本復旧工事(平成24年度終了) ・千歳漁業集落排水施設 簡易処理(平成23年5月開始) 本復旧工事(平成24年度終了)	市	H23~H30	着手済	4		【現状】 《蛸ノ浦》 ・国土交通省から無償で借り受けた汚水処理設備(MBR施設)により供用 ・MBR施設の改良により平成25年3月に本復旧工事終了 《砂子浜・小石浜・千歳》 ・平成24年4月に本復旧工事終了 《根白》 ・国土交通省から無償で借り受けたMBR施設により供用 ・平成24年9月に本復旧中の施設に切替え供用開始 ・平成24年10月に本復旧工事終了 《その他》 ・平成25年度以降は、軽微な復旧事業を実施中 【課題】 ・特になし	711,845		549,801	7,500	154,544		169,449	516,769	9,257	2,695	1,191	1,473	511	10,500			下水道事業所	
追3 ◎	H 漁業集落排水施設 整備事業	蛸ノ浦地区漁業集落排水区域内の防災集団移転促進事業及び災害公営住宅整備事業に係る下水道施設整備	市	H25~H28	実施済		有 ※有	【現状】 ・清水地区:平成26年5月に工事完了 ・蛸ノ浦地区:平成27年6月に工事完了 ・永浜地区:平成28年10月に工事完了	18,739				18,739				2,686	7,576	3,662	4,815					下水道事業所	

施策 都市基盤施設の復旧・整備にあたっては、防災機能の向上に配慮するほか、広域幹線交通網の強化や防災拠点として有用な「道の駅」の適正配置など、重要施設などへの重点・優先投資を行います。



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課					
									財源内訳						23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度						
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																
15 ○	H 防災・連携道路ネットワークの整備	広域的な防災・連携機能を発揮するための三陸沿岸道路、国道、県道及びそれらと連絡する道路の整備 ・三陸縦貫自動車道吉浜道路 ・国道397号(早期改良) ・三陸縦貫自動車道新インター ・市道滝の沢線(三陸インター接続)	国・県・市	H23～	着手済	3		【現状】 三陸沿岸道路吉浜道路はH27年度供用開始済み、吉浜釜石道路は工事着手済み 国道397号津付道路供用開始市道滝の沢線は用地交渉中 ・その他の路線などは、附帯工事などを発注したほか、事業計画を調整中 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある	179,908	57,000		122,900			8					20,100	75,000	29,808	55,000							建設課
16 ◎	H 交通安全施設災害復旧事業	地震や津波の被害を受け損傷した信号機など、交通安全施設の復旧	国・県・市	H23～	着手済	4		【現状】 ・復旧事業は着手済 【課題】 ・土地利用計画や道路改良事業などと調整を図りながら、事業を実施する必要がある	58,211							6,998	6,885	6,979	6,461	6,999	5,000	3,889	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	建設課		
17 △	H 被災都市公園修繕事業	被災した都市公園の遊具や施設の修繕 ・盛川河川敷、大田、みどり町、諏訪前、石橋前公園 ・トイレ、フェンス・遊具などの修繕	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・盛川河川敷公園災害復旧工事終了 ・諏訪前・石橋前公園災害復旧工事終了 【課題】 ・津波浸水区域であることから、周辺の整備と調整する必要がある	44,715							44,715	9,733	34,982												住宅公園課
18 △	H 災害対応強化都市公園事業	災害時の対応を考慮した都市公園の整備 ・総合公園予定地を災害時に避難施設として活用できるように整備 ・基本設計委託、測量詳細設計委託、基盤整備、体育館など施設整備(備蓄倉庫、災害対応受水槽、発電設備、非常時トイレ、ソーラー照明灯)	市	H26～	整理・統合等			【現状】 ・「大船渡総合公園整備計画」の白紙化により、当該地を将来的な行政需要に備える土地とした																						住宅公園課
19 ○	H メモリアル公園等整備事業	犠牲者の追悼、鎮魂や、地域の防災拠点としての機能を兼ね備えたメモリアル公園などの整備	県・市	H23～H30	整理・統合等			【現状】 ・公園整備のためのワークショップ開催、パブリックコメント実施 ・基本設計完成、詳細設計作成中 ・メモリアル機能を備えた(仮称)大船渡公園を土地区画整理事業と併せて整備する。 【課題】 ・みなと公園との機能連携 ・関係機関・団体等との調整																					市街地整備課 防災管理室	
20 ◎	H 防災センター整備事業	防災拠点施設である防災センターの整備 ・市民の安全で安心な暮らしを守り、さまざまな災害に確実に対処する防災活動及び防災教育の拠点施設として整備	市	H23～H28	実施済			【現状】 ・平成24年度:建設用地選定 ・平成25年度:測量・基本設計完了 ・平成26年度:用地取得・用地造成 ・平成27年度:用地造成・建設工事 ・平成28年度:建設工事・通信設備工事・備品購入 ・平成29年2月7日 建設工事完了 ・平成29年3月29日 通信設備工事完了 ・平成29年3月29日 事業完了 【課題】 ・なし	2,466,388			2,391,200			75,188			48,579	267,742	330,354	1,819,713									防災センター建設推進室
21 ◎	H 衛生センター復旧事業	被災した衛生センター施設・機器の復旧	気仙広域連合	H23	実施済			【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	1,337,847	1,058,974					278,873	1,337,847													気仙広域連合衛生課	

施策力 道路を盛土構造とすることなどについて、防災上の効果を十分に検討したうえで整備を図るほか、災害時に集落が孤立しないよう代替路線を整備・確保します。





事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課						
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
24◎	S 三陸鉄道南リアス線代替バス運行事業	三陸鉄道の復旧まで代替バスを運行 ・釜石市上大畑～県立大船渡病院	岩手県交通	H23～H25	実施済			【現状】 ・釜石・大船渡線を運行している ・沿線市などの負担金拠出を予定していたが、国庫補助による運行に切り替えた ・三陸鉄道南リアス線の全線開通により終了 【課題】 ・特になし																企業立地港湾課					
25◎	H JR大船渡線の復旧事業	JR大船渡線の復旧に向けた沿線自治体、関係機関との整備方針の協議・検討	JR	H23～	着手済	2		【現状】 ・平成27年12月にBRTIによる本格復旧の受入れに合意 ・平成25年9月に基石海岸口駅、平成27年12月に大船渡魚市場前駅をそれぞれ開設。 ・JR東日本へ要望した利便性向上に関する事項について協議を継続。 【課題】 ・利便性の向上等に関する市民要望の実現	2,101									133	112	1,319	407	22	58	50	企業立地港湾課				
26◎	H 三陸鉄道復旧支援事業	三陸鉄道の早期再開に向け復旧費用の一部を支援 ・南リアス線延長: 37km ・北リアス線延長: 71km ・南リアス線被害箇所数: 247 ・北リアス線被害箇所数: 70 ※市負担は南北リアス線の復旧分	市	H23～H26	実施済			【現状】 ・復旧工事着手済 ・平成25年4月に部分開通(盛～吉浜間) ・平成26年4月に全線運行再開 【課題】 ・沿線自治体の負担金の拠出 ・ふれあい待合室の運営	1,431,357		963,565									467,792	143,990	510,068	681,030	96,269	企業立地港湾課				
27◎	H 岩手開発鉄道の復旧支援事業	岩手開発鉄道の復旧費用の一部を支援 ・補助率: 国1/4、市1/4	市	H23	整理・統合等			【現状】 ・岩手開発鉄道において、国と市の補助・支援から他の補助金活用に切り替えた 【課題】 ・特になし																	企業立地港湾課				
方針② 土地利用のあり方を検討のうえ見直します。 施策ア それぞれの被災地域の特性を考慮した土地利用計画を定めます。																													
28◎	S 復興計画策定等支援事業	被災地の被災状況調査の実施や復興計画策定に係る市の取り組みなどへの支援	国	H23	実施済			【現状】 ・復興計画の策定や防災集団移転促進事業などまちづくり事業の取り組みに対する支援を受けた 【課題】 ・特になし	200,000	200,000															復興政策課				
追5◎	S 復興計画推進事業	早期復興に向け、復興計画の積極的な推進と適正な進捗管理を図る	市	H24～H32	着手済	2	有 ※有	【現状】 ・復興計画推進業務の委託契約締結済 ・復興計画推進委員会を平成25年度に4回、平成26年度に3回、平成27年度に3回、平成28年度に2回、平成29年度も2回の委員会を開催済。 ・復興計画事業(主要事業)のスケジュールを半年ごとに広報等で周知 ・平成25年度から復興交付金事業計画管理支援システムを導入 ・平成25年9月及び平成28年9月に「復興に関する市民意識調査」を実施 ・平成25年10・11月に「復興のまちづくりに向けた地区懇談会」を開催 【課題】 ・市民参画を継続していく必要がある。	78,296											59,259	19,037	7,350	12,285	8,576	9,007	12,464	13,112	15,502	復興政策課

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課					
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度						
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源																
追6 ◎	S	復興関連工事発生土対策推進事業	復興関連工事に係る土砂の需給調整など関係する対策を推進	県・市	H25～H30	着手済	4	※有	【現状】 ・県主導により設置した調整機関を中核として調整・対策を実施中 ・工事発生土の仮置き場を設置：門之浜地区及び綾里地区(市設置) ・県において越喜来浦浜、泊地区に設置済 【課題】 ・工事関係土砂の円滑かつ適切な需給調整と活用	234,777		158,796						37,692	152,740	37,314	3,076	1,706	2,249				市街地整備課			
29 ◎	S	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画法に基づき、災害に強いまちづくりを目指し、市の都市計画に関する基本的な方針を策定 ・目指す都市像及び地域別の整備方針 ・都市施設の整備方針	市	H23～H27	実施済		※有	【現状】 ・平成25年8月に策定業務委託契約締結 ・都市計画審議会、市議会報告を経てプランを決定した。 【課題】 ・特になし	37,257								5,565	16,380		15,312						土地利用課			
追7 ◎	S	被災地復興のための土地利用計画策定促進事業	多重防災型の津波防災対策に基づく、浸水区域(住居移転跡地)を中心とした土地利用計画や新たなまちづくり構想などを策定	市	H24～H32	着手済	4	※有	【現状】 ・被災地での復興関連事業導入のための調査検討業務及び各地区復興委員会等との協議・調整を委託済 ・土地利用計画の変更を予定している12地区のうち、10地区について実現化の方策を策定 ・ <u>土地活用にあたり、交換等を行う土地の面積測量、不動産鑑定を実施</u> 【課題】 ・土地利用を図る目的の事業について、復興交付金など効果的な財源を確保する ・地域住民の合意形成	161,193										66,900	3,509	53,855	27,356	5,000	4,573		土地利用課			
30 ○	H	土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備 ・地盤沈下した宅地のかさ上げ	市	H23～H32	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・緊急防災空地整備事業により用地買収を実施済 ・UR都市機構とH25.9.25土地区画整理事業業務委託協定締結 ・H25.8事業計画認可 ・H26.5.30第1回仮換地指定 ・H26.8事業計画(第1回変更)認可 ・H26.8～H27.3第2～8回仮換地指定 ・H27.7事業計画(第2回変更)認可 ・H27.4～H28.3第9～22回仮換地指定 ・H28.10事業計画(第3回変更)認可 ・H28.12事業計画(第4回変更)決定 ・H28.4～H29.3第23～34回仮換地指定 ・H28.8.31第1回使用収益開始 ・H28.11～H29.3第2～3回使用収益開始 ・UR都市機構とH29.3.16土地区画整理事業業務委託第1回変更協定締結 ・H30.1事業計画(第5回変更)決定 ・H29.4～H30.3第35～28回仮換地指定 ・H29.4～H30.3第4～6回使用収益開始 ・UR都市機構とH30.3.15土地区画整理事業業務委託第2回変更協定締結 【課題】 ・公表している建築開始可能時期に合わせた地権者への仮換地の引き渡し	24,413,752	8,131	575,469								251,323	1,000,615	3,215,969	3,712,310	4,956,799	5,277,042	5,447,825	546,594	5,275		市街地整備課
追8 ◎	H	大船渡駅周辺地区下水道事業	大船渡駅周辺地区(被災市街地土地区画整理事業区域内)の下水道施設の早期供用を図るため、次の整備を実施 ・大船渡駅周辺地区内面積約36.1ha ・污水管φ150～250 L=7,798.7m ・汚水人孔小型～1号人孔 N=205箇所	市	H26～H30	着手済	4	※有	【現状】 ・UR都市機構と平成26年6月24日業務委託協定締結 ・UR都市機構と平成29年3月16日業務委託第1回変更協定締結 【課題】 土地区画整理事業における基盤整備工事を完了予定時期(平成30年度)までに完了する	1,662,532										95,060	312,553	324,126	508,742	422,051			市街地整備課			

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									財源内訳						23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
追9◎	H	津波復興拠点整備事業	市	H23~H30	着手済	4	有 ※有	【現状】 〔大船渡地区〕 ・先行地区の用地買収済 ・H26.3大和リース㈱とエリアマネジメント・パートナー協定締結 ・H26.3先行地区盛土造成工事完了 ・H26.5予定借地人決定 ・H26.6事業計画変更認可 ・H26.7官民連携まちづくり協議会設立 ・H27.3津波防災拠点施設等基本設計完了 ・拡大地区用地買収完了 ・H27.4特定業務施設用地の予定借地人決定 ・H27.11津波防災拠点施設等実施設計契約締結 ・H27.12㈱キャセン大船渡設立 ・H28.2まちなか再生計画認定 ・H28.2先行地区内の公共施設工事完了 ・H28.3事業計画変更認可 ・H28.3借地人整備のキレ開業 ・H28.4~借地人整備の大規模商業施設開業 ・H28.10津波防災拠点施設等工事業務委託契約締結 ・H29.3津波防災拠点施設等のPRイベント兼社会実験実施 ・H29.4㈱キャセン大船渡及びおおふなと夢商店街協会の商業施設が開業 ・H29.9借地人整備の水産加工場が操業開始 ・H29.10津波復興拠点のまちづくりが第12回日本都市計画協会賞「日本まちづくり大賞」受賞(受賞は㈱キャセン大船渡) ・H29.11借地人整備の2ndフェーズ開業 ・H29.11地区計画の変更に基づく景観事前協議制度開始 ・H29.12地区計画の変更に基づく建築条例(用途制限)制定 ・H30.3津波防災拠点施設等完成、同施設の指定管理者議決 ・H30.3㈱キャセン大船渡を都市再生推進法人に指定 【課題】 ・関係機関や権利者などの調整	6,003,261				4,519,035	1,484,226			905,539	2,671,413	297,282	1,090,095	1,004,023	34,909			市街地整備課
追10◎	S	大船渡駅周辺の産業誘致・振興に向けた調査事業	市	H24	実施済		※有	【現状】 ・事業終了 【課題】 ・津波復興拠点整備事業への反映 ・民間事業者との共通理解	35,280															環境未来都市推進室	
31○	H	小規模住宅地区等改良事業	市	H23~	整理・統合等			【現状】 ・他の住宅再建関連事業の進捗に伴い、実施する可能性が低くなった 【課題】 ・特になし																住宅公園課	
施策イ 沿岸地域を中心とした住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどに伴い、移転先地域なども含めた複数のエリアで土地利用のあり方を検討し、用途を定めます。																									
◎	H	防災集団移転促進事業【再掲】	市	H23~H31	着手済		有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし															復興政策課市街地整備課		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									財源内訳						23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
○	H 土地区画整理事業【再掲】	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備 ・地盤沈下した宅地のかさ上げ	市	H23～H32	着手済		有 ※有	【現状】 ・緊急防災空地整備事業により用地買収を実施済 ・UR都市機構とH25.9.25土地区画整理事業等業務委託協定締結 ・H25.8 事業計画認可 ・H26.5.30 第1回仮換地指定 ・H26.8 事業計画(第1回変更)認可 ・H26.8～H27.3 第2～8回仮換地指定 ・H27.7 事業計画(第2回変更)認可 ・H27.4～H28.3 第9～22回仮換地指定 ・H28.10 事業計画(第3回変更)認可 ・H28.12 事業計画(第4回変更)決定 ・H28.4～H29.3 第23～34回仮換地指定 ・H28.8.31 第1回使用収益開始 ・H28.11～H29.3 第2～3回使用収益開始 ・UR都市機構とH29.3.16土地区画整理事業等業務委託第1回変更協定締結 ・H30.1 事業計画(第5回変更)決定 ・H29.4～H30.3 第35～39回仮換地指定 ・H29.4～H30.3 第4～6回使用収益開始 ・UR都市機構とH30.3.15 土地区画整理事業等業務委託第2回変更協定締結 【課題】 ・公表している建築開始可能時期に合わせた地権者への仮換地の引き渡し															市街地整備課		
追9 ◎	H 津波復興拠点整備事業【再掲】	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地の整備 ・復興拠点の施設計画及び都市計画の決定 ・津波防災拠点施設、津波復興拠点施設、特定業務施設、公益的施設などの整備	市	H23～H30	着手済		有	【現状】 (大船渡地区) ・先行地区の用地買収済 ・H26.3大和リース㈱とエリアマネジメント・パートナー協定締結 ・H26.3先行地区盛土造成工事完了 ・H26.5予定借地人決定 ・H26.6事業計画変更認可 ・H26.7官民連携まちづくり協議会設立 ・H27.3津波防災拠点施設等基本設計完了 ・拡大地区用地買収完了 ・H27.4特定業務施設用地の予定借地人決定 ・H27.11津波防災拠点施設等実施設計契約締結 ・H27.12㈱キャセン大船渡設立 ・H28.2まちなか再生計画認定 ・H28.2先行地区内の公共施設工事完了 ・H28.3事業計画変更認可 ・H28.3借地人整備の本邦開業 ・H28.4～借地人整備の大規模商業施設開業 ・H28.10津波防災拠点施設等工事業務委託契約締結 ・H29.3津波防災拠点施設等のPRイベント社会実験実施 ・H29.4㈱キャセン大船渡及びおふなと夢商店街協同組合の商業施設が開業 ・H29.9借地人整備の水産加工場が操業開始 ・H29.10津波復興拠点のまちづくりが第12回日本都市計画協会賞「日本まちづくり大賞」受賞(受賞者は㈱キャセン大船渡) ・H29.11借地人整備のファクトリーショップ開業 ・H29.11地区計画の変更に基づく景観事前協議制度開始 ・H29.12地区計画の変更に基づく建築条例(用途制限)制定 ・H30.0津波防災拠点施設等完成、同施設の指定管理者議決 ・H30.3㈱キャセン大船渡を都市再生推進法人に指定 【課題】 ・関係機関や権利者などの調整																	市街地整備課
○	H 小規模住宅地区等改良事業【再掲】	不良住宅の集合など、生活環境の整備が遅れている地区での住宅などの整備 ・不良住宅の買収除去 ・改良住宅の建設 ・公共施設、地区施設の整備	市	H23～	整理・統合等			【現状】 ・他の住宅再建関連事業の進捗に伴い、実施する可能性が低くなった 【課題】 ・特になし																住宅公園課	
○	H 漁村集落復興事業【再掲】	漁業集落の地盤かさ上げ、集落道整備、水産用地造成などにより防災機能を強化します。	市	H25～H30	着手済		有 ※有	【現状】 ・浦浜地区の宅地嵩上げ・内面排水工事完了 ・浦浜地区及び泊地区は水産用地・集落道工事に着手済み ・崎浜地区は水産用地1期工事完了、集落道工事着手済み ・綾里地区は水産用地・1号避難路完了 【課題】 ・事業用地の確保 ・他事業との調整																水産課	



事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									財源内訳						23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
追 12 ◎	H 広場整備事業	震災後、分散した高台移転者や地域住民が普段から気軽に集まり、地区全体のコミュニケーションや交流が生まれる場を創出するため、広場を整備 ・浦浜地区 0.24ha ・細浦地区 0.31ha	市	H28～	着手済	4	有	【現状】 浦浜地区 ・施工中(H30.4完了見込み) 細浦地区 ・測量設計中 【課題】 ・地域や関係者などとの調整	107,353							5,595	16,254	85,504				土地利用課			
施策ウ 災害危険地域などについては、住民との合意形成のもと、住宅などの建築を制限します。																									
◎	H 防災集団移転促進事業【再掲】	居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることはないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23～H31	着手済		有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜中・西地区、浦浜東・浦嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし													復興政策課 市街地整備課				
方針③ 情報通信基盤の整備を進めます。																									
施策ア 災害時において、確実に情報収集・発信ができる環境を整備します。																									
32 △	S おおふなとさいがいエフエム運営事業	震災後、ライフラインや災害復旧活動、生活に関連した各種情報をエフエムラジオで放送	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・平成23年3月31日に開局し、原則月～金・1日3回(土・1回)、概ね2時間枠で放送→平成25年3月30日閉局 【課題】 ・特になし(「防災まちづくり」の追1・防災市民メディア構築事業でFM放送機器の整備が終了)	12,262		11,450											秘書広聴課			
33 ◎	H 地域情報通信基盤復旧事業	越喜来・吉浜地区ブロードバンド施設を修繕し、光サービスを提供 ・光ケーブルのルート設計 ・伝送路(光ケーブル)の再敷設: 9,042m ・自営柱の再設置: 9本	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・平成25年2月に工事終了 ・平成25年5月よりIRU契約に基づきサービス開始 【課題】 ・特になし	42,095	28,063												企画調整課			
34 ○	H 地域情報通信基盤整備促進事業	光通信サービス未提供地域の解消に向けて、通信事業者への要望活動を展開	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・平成23年11月より立根町大畑野地域でサービス開始 ・平成25年1月より末崎地区でサービス開始 ・平成25年3月より綾里地区でサービス開始 ・平成25年6月より日頃市地区のサービス区域拡大 【課題】 ・光サービス未提供地域(赤崎町合足、猪川町大野及び日頃市町一部地域)での整備促進	1,080											1,080		企画調整課			
追 11 ◎	S 情報通信技術利活用事業	震災によりテレビ難視聴地域に転居した世帯のテレビ視聴に必要な施設整備を行うテレビ共同受信施設組合に対し、整備費用を助成(補助率: 10/10)	市	H25～	着手済	2		【現状】 ・平成26～29年度において9組合に助成 【課題】 ・円滑な視聴に係る関連事業などとの調整	20,456	6,818					3,817	12,642	1,958	2,039				企業立地港湾課			
35 ◎	S 地上デジタル放送難視聴地域解消事業	テレビ共同受信施設組合などが行う、地上デジタル放送の難視聴(災害による影響を含む)を解消するための施設改修を支援	市	H23～H24	実施済			【現状】 ・対象8組合のうち、6組合が平成24年度までに工事を終了し、2組合が事業を中止した 【課題】 ・特になし	26,612	26,612											17,732	8,880	企業立地港湾課		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課		
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
方針① 今回の災害による教訓を生かし、新たな防災体制を整えます。																								
施策ア 津波に対する防災体制を見直します。																								
1 ◎	S	地域防災計画整備事業	市	H23~H32	着手済	1	有 ※有	【現状】 ・平成28年度に作成した避難所運営マニュアルを各自主防災組織等に配布。平成30年2月に地域防災計画を修正。あわせて業務継続計画(BCP)を策定。 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた避難対策の実施	39,092						3,885	739	4,731	12,922	1,093	13,722	1,000	1,000	防災管理室	
2 ○	H	集積木材等流出対策事業	国・県	H23~	整理・統合等			【現状】 ・木材を取り扱っていた事業所が再建を断念したことから、大船渡港の木材取扱いが皆減 ・震災以降、原木を取り扱う事業所からの新規立地に係る問い合わせはない 【課題】 ・特になし																企業立地港湾課
3 ○	H	避難誘導標識等設置事業	市	H24~	着手済	1	※有	【現状】 ・太陽電池式津波避難誘導標識を市内各所に設置 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた整備	80,293							15,077	16,555	7,344	13,500	13,817	7,000	7,000	防災管理室	
○	H	防災・連携道路ネットワークの整備【再掲】	国・県・市	H23~	着手済			【現状】 三陸沿岸道路吉浜道路はH27年度供用開始済み、吉浜釜石道路は工事着手済み 国道397号津付道路供用開始市道境の沢線は用地交渉中 ・その他の路線などは、附帯工事などを発注したほか、事業計画を調整中 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある																建設課
施策イ 新たな住宅地造成などに関連して、土砂災害などに対する防災体制を見直します。																								
◎	S	地域防災計画整備事業【再掲】	市	H23~H32	着手済		有	【現状】 ・平成28年度に作成した避難所運営マニュアルを各自主防災組織等に配布。平成30年2月に地域防災計画を修正。あわせて業務継続計画(BCP)を策定。 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた避難対策の実施																防災管理室
施策ウ 防災施設の充実・強化を図りながらも、防災施設に偏らない防災体制を整えます。																								
◎	S	地域防災計画整備事業【再掲】	市	H23~H32	着手済		有 ※有	【現状】 ・平成28年度に作成した避難所運営マニュアルを各自主防災組織等に配布。平成30年2月に地域防災計画を修正。あわせて業務継続計画(BCP)を策定。 【課題】 ・土地利用計画などを踏まえた避難対策の実施																防災管理室

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復 興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
4 ◎	H 防災行政無線整備 事業	・デジタル防災行政無線システムの整備(市内全域) [目標]親局1,中継局1,遠隔操作卓2,子局210、戸別受信機全戸配布,監視カメラ1など ・被災したアナログ施設の応急復旧(旧大船渡市地域) ・応急仮設住宅の難聴対策(旧大船渡市地域)	市	H23~	着手済	2	※有	【現状】 ・デジタル防災行政無線→平成25年5月にデジタル放送開始 ・上記整備内容:親局1、中継局1、拡声子局197(うち再送信子局5)、再送信局3、戸別受信機は約11,000、監視カメラ1、移動系防災行政無線50局 ・一般住宅への戸別受信機、文字表示装置付戸別受信機の無償貸与などを実施 ・災害公営住宅への戸別受信機設置を完了 ・平成29年度に「防災行政無線の難聴地域に子局1機増設」 ・防災センターに「防災行政無線親局の予備機を設置」 【課題】 ・特になし	1,073,518	614,510		22,800	97,951	338,257	4,551	298,200	668,292	9,353	19,784	16,597	9,720	19,021	14,000	14,000	防災管理室
5 ◎	S 災害時情報伝達方法の整備	・市災害対策本部・地区本部、地域公民館、避難所などの相互連絡体制の確立(相互連絡手段及び情報収集体制)	市	H23~H26	実施済			【現状】 ・災害対策本部に衛星電話を設置 ・避難所に防災行政無線(移動系)を整備(30局整備済) ・平成26年1月から避難所などに特設公衆電話回線を整備(平成30年3月末現在37カ所) ・平成26年6月に各地区本部に特設公衆電話用の電話機を設置(11カ所) 【課題】 ・避難所などにおける通信機器の管理	42,676	13,811				28,865	1,196	41,433		47							防災管理室
6 ◎	H 潮位観測装置等整備事業	・潮位観測装置の復旧(下平、門之浜、越喜来)	市	H27~29	実施済			【現状】 ・市内3カ所へ潮位観測装置を設置(門之浜湾、大船渡湾、越喜来湾) 【課題】 ・特になし	18,036				14,429	3,607							18,036				防災管理室
10 ◎	H コミュニティ消防センター新築事業	・立地場所の検討 ・消防屯所の建設 ・消防団組織(部の統合)の検討	市	H23~H30	着手済	4		【現状】 ・平成25年度:消防屯所・7棟分の用地を取得済 ・水門の遠隔操作化に関して、県の事業内容の変更により、当初予定していた7棟に遠隔操作設備設置について県と調整中につき、建設工事を見合わせていたが、遠隔操作設備は設けないこととし、再設計することに決定 ・平成26年度建設予定であった11棟に関しては、事業を繰越、建設することとし、平成27年度は計13棟建設予定であったが、候補地の変更等の理由から10棟完成した。 ・平成28年度は5棟完成した。 ・平成29年度は2棟完成した。 ・用地の確保	656,294	306,478	14,688	16,900				47,667	58,889	298,527	157,601	62,313	31,297				消防署

施策エ 高齢者や障がい者など災害弱者に十分配慮した防災体制を整えます。

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)												担当課
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
15 ○	S	災害時要援護者支援制度	市	H23~	着手済	4		【現状】 ・平成25年8月に、国から示された「避難行動要援護者の避難行動支援に関する取組指針」に基づく支援プランの作成に着手 ・災害時における要援護者などに係る情報の収集・共有方法についてシミュレーションを実施 ・要援護者台帳・マップの作成に係るシステム導入事業が平成26年3月に終了 ・平成27年3月に市地域防災計画が修正されたことを受け、避難行動要援護者に同意書を送付・回収(平成27年3月~4月) ・同意書提出者の名簿整備完了 ・平成29年度から関係機関へ同意者名簿提供を開始 【課題】 ・名簿更新の方法	7,993		4,894					4,894	81	81	81	81	2,775					長寿社会課 地域福祉課	
<p>施策オ 建築物の構造を災害に強いものにするよう促します。</p> <p>施策カ 高層の避難場所を確保するなど、沿岸部などの防災機能を強化します。</p>																											
17 △	S	津波避難ビル等の指定	市	H23~	着手済	4		【現状】 ・津波避難ビル等の指定基準を策定 ・津波復興拠点施設の指定について検討 【課題】 ・民間施設の指定について検討する必要がある																		防災管理室	
○	H	道路新設・改良事業【再掲】	県・市	H23~	着手済		有 ※有	【現状】 県道：道路計画について用地測量などを実施中 市道：20路線の測量設計・工事発注済、14路線で工事終了 ・道路計画策定事業に着手済 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある ・三陸沿岸道路は集中復興期間終了後の財源が未確定 ・復興交付金事業は、復興計画期間終了後も事業が継続することが見込まれるが、財源が未確定																		建設課	
<p>方針② 防災教育や防災訓練を積極的に推進します。</p> <p>施策ア 今回の災害の記録を保存するとともに、津波に関する遺構やモニュメントを活用するなどして後世に伝えます。</p>																											
20 △	S	防災教育事業	国・県・市	H24~	着手済	1		【現状】 ・県主催の自主防災組織研修会への参加 ・市内小中学校において、防災学習会を開催 【課題】 ・特になし	300															100	100	100	防災管理室 消防署
<p>施策イ 市民各層に対して防災に関する教育活動を実施します。</p> <p>施策ウ 東日本大震災が発生した3月11日に、広く防災意識の高揚を図るための事業を実施します。</p>																											
23 ◎	S	慰霊祭の開催	市	H23~	着手済	2		【現状】 ・平成30年3月11日に東日本大震災七周年大船渡市犠牲者追悼式を開催 【課題】 ・特になし	70,440		3,448		56,263	10,729	21,697	8,001	5,053	5,068	6,929	4,584	4,510	4,598	5,000	5,000			防災管理室

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
24 △	S	防災訓練の実施	市 関係機関 など	H24～	着手済	1		【現状】 ・平成29年10月1日に市防災訓練を実施 【課題】 ・復興事業の進捗や地域防災計画の見直し状況に応じた訓練項目を検討する必要がある	283						43						80	80	80	防災管理室	
施策エ 市内全域または地域ごとに防災訓練を実施します。																									
△	S	防災訓練の実施【再掲】	市 関係機関 など	H24～	着手済			【現状】 ・平成29年10月1日に市防災訓練を実施 【課題】 ・復興事業の進捗や地域防災計画の見直し状況に応じた訓練項目を検討する必要がある																	防災管理室
方針③ 地域コミュニティ機能の維持・強化を図ります。																									
施策ア 自主防災組織の育成・強化を支援します。																									
25 △	S	地域防災力強化推進事業	市	H24～	着手済	1		【現状】 ・自主防災組織などに対する説明会を開催 ・新たに結成した自主防災組織に本部旗、腕章を作成・交付→結成組織数:105(平成30年3月末現在) ・自主防災組織支援事業により防災資機材を整備した7組織に補助金を交付 【課題】 ・未結成地域の解消 ・活動が停滞している自主防災組織の活性化	7,474					73	895	927	882	735	622	980	1,180	1,180	防災管理室		
施策イ ボランティア組織の育成・強化を支援します。																									
施策ウ 市民の自主的な地域づくり活動や拠点となる施設の整備などに対して支援します。																									
27 ○	S	市民活動支援事業	市	H23～	着手済	2		【現状】 ・大船渡市市民活動支援協議会(構成団体:市・社会福祉協議会・NPO法人、平成25年9月設立)が、市民活動支援センターを開設→平成26年2月から市内商業施設内において本格稼働 平成30年4月1日、市民活動等の一層の促進を図るため、市民協働準備室を設置 【課題】 ・市民活動支援センターを中心とした市民活動のネットワーク強化	90,152						200	18,488	18,488	18,488	18,488	16,000				市民協働準備室	
28 ○	H	越喜来地区拠点センター建設事業	市	H24～	整理・統合等			【現状】 ・三陸支所(機能)については、三陸保健介護センターを改修し、業務を再開済→新たな施設は整備しない(地元復興委員会から同意を得ている) 【課題】																三陸支所	
方針④ ライフラインや交通・物流などの機能を強化します。																									
施策ア 関係機関の協力のもと、重要施設などへの重点・優先投資を行いながら、これら機能の早期復旧体制を整えとともに、再生可能エネルギーの活用など、非常時の応急的な生活を支える方策について検討します。																									
30 △	H	災害用物資備蓄事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・自主防災組織に対し、支援物資や郵便事業の寄付金による防災資機材の整備を実施 ・日本赤十字社の支援により、中核的避難所など18か所に防災倉庫を設置 【課題】 ・保管場所の確保 ・整備した資機材などの保守点検	26,398				21,311	5,087	20,255	684	627	747	717	575	793	1,000	1,000	防災管理室	





事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課					
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
35 △	S 災害時相互応援協 定締結促進事業	静岡県浜松市、東京都板橋区、兵庫県 宝塚市、鹿児島県大隅半島4市5町、山 形県最上町などの災害時相互応援協 定締結を促進	市 関係市町村	H24~	着手済	2		【現状】 ・多くの自治体から職員派遣な どについて支援をいただいている ・平成24年6月に板橋区、平成 25年10月に山武市と連携協力・ 相互応援協定を締結 ・災害時相互応援協定を締結し ている自治体間で円滑な連絡 体制の構築に努めた 【課題】 ・相互応援体制のあり方や内容 についての調整	968										11	11	4	42	146	754		企画調整課		
36 △	S 災害時の支援ネット ワーク体制確立 事業	銀河連邦構成市町及び友好都市間 による、災害が発生した際の人的な支援 ネットワーク体制の確立	市 関係市町村	H23~	着手済	2		【現状】 ・銀河連邦構成市町から協定に 基づく支援をいただいている ・銀河連邦構成市町による災害 時の対応形態について、構成 市町の災害発生時に本部(相 模原市)が対応窓口となる体制 を構築 【課題】 ・特になし	1,020										50	50	230	230	230	230		企画調整課		
37 △	S 復興支援から相互 交流への展開事業	復旧・復興支援自治体との相互交流の 促進	市 関係市町村	H23~	着手済	2		【現状】 ・銀河連邦構成市町間で物産 や児童に係る相互交流が円滑 に行われている ・平成24年6月に板橋区、平成 25年10月に山武市と連携協力・ 相互応援協定を締結 ・平成26年12月に鎌倉市とパー トナーシティ提携を結んだ ・震災後につながりができた多く の自治体と物産や防災関係の 交流が生じている 【課題】 ・支援自治体との交流機会の創 出	30,076										2,000	2,000	3,541	3,291	3,576	4,816	5,747	5,105		企画調整課
施策イ 環境未来都市構想を中心とした気仙2市1町の一層の連携推進をはじめ、三陸沿岸地域や岩手県内陸部の市町村など、自治体間の相互応援体制を強化します。																												
△	S 災害時相互応援協 定締結促進事業 【再掲】	静岡県浜松市、東京都板橋区、兵庫県 宝塚市、鹿児島県大隅半島4市5町、山 形県最上町などの災害時相互応援協 定締結を促進	市 関係市町村	H24~	着手済			【現状】 ・多くの自治体から職員派遣な どについて支援をいただいている ・平成24年6月に板橋区、平成 25年10月に山武市と連携協力・ 相互応援協定を締結 ・災害時相互応援協定を締結し ている自治体間で円滑な連絡 体制の構築に努めた 【課題】 ・相互応援体制のあり方や内容 についての調整																		企画調整課		
△	S 災害時の支援ネット ワーク体制確立 事業【再掲】	銀河連邦構成市町及び友好都市間 による、災害が発生した際の人的な支援 ネットワーク体制の確立	市 関係市町村	H23~	着手済			【現状】 ・銀河連邦構成市町から協定に 基づく支援をいただいている ・銀河連邦構成市町による災害 時の対応形態について、構成 市町の災害発生時に本部(相 模原市)が対応窓口となる体制 を構築 【課題】 ・特になし																		企画調整課		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
△	S	復興支援から相互交流への展開事業【再掲】	市 関係市町村	H23～	着手済			【現状】 ・銀河連邦構成市町間で物産や児童に係る相互交流が円滑に行われている ・平成24年6月に板橋区、平成25年10月に山武市と連携協力・相互応援協定を締結 ・平成26年12月に鎌倉市とパートナーシティ提携を結んだ ・震災後につながりができた多くの自治体と物産や防災関係の交流が生じている 【課題】 ・支援自治体との交流機会の創出																企画調整課	
○	H	再生可能エネルギー導入促進事業【再掲】	市など	H23～	着手済		※有	【現状】 ・平成25年6月から、五葉山太陽光発電合同会社が五葉山麓に建設していた太陽光発電所が平成27年8月に完成し、本稼動を開始 ・平成25年9月に、気仙広域環境未来都市推進共同事業体が設計に関与した環境共生型木造復興住宅のモデル棟(3棟)が住田町に完成→11月にも復興住宅として陸前高田市に2棟完成 ・防災集団移転促進事業の進捗に合わせた木造復興住宅に係る説明会を平成26年5月に開催(市内全域対象)→大船渡町及び赤崎町を対象に平成26年7月に開催 ・平成29年3月に気仙広域環境未来都市シンポジウム(対象:気仙地域住民)を開催 【課題】 ・他の復興関連事業との調整 ・地元企業の参画促進 ・気仙2市1町間の調整																	環境未来都市推進室
施策ウ 災害時にすばやく対応できるボランティアネットワークを強化します。																									
○	S	市民活動支援事業【再掲】	市	H23～	着手済			【現状】 ・大船渡市市民活動支援協議会(構成団体:市・社会福祉協議会・NPO法人、平成25年9月設立)が、市民活動支援センターを開設→平成26年2月から市内商業施設内において本格稼動 平成30年4月1日、市民活動等の一層の促進を図るため、市民協働準備室を設置 【課題】 ・市民活動支援センターを中心とした市民活動のネットワーク強化																市民協働準備室	
○	S	おおふなとボランティア活動連絡会支援事業(活動センター運営事業)【再掲】	社会福祉協議会	H23～	着手済			【現状】 ・支えあいまちづくり事業を実施中 ・平成24年度から復興ボランティアセンター運営補助事業を実施(平成28年度から、補助事業とせず、社会福祉協議会の通常のボランティア業務の中で実施。) 【課題】 ・被災者のニーズとボランティア活動のマッチング																地域福祉課 長寿社会課	
