
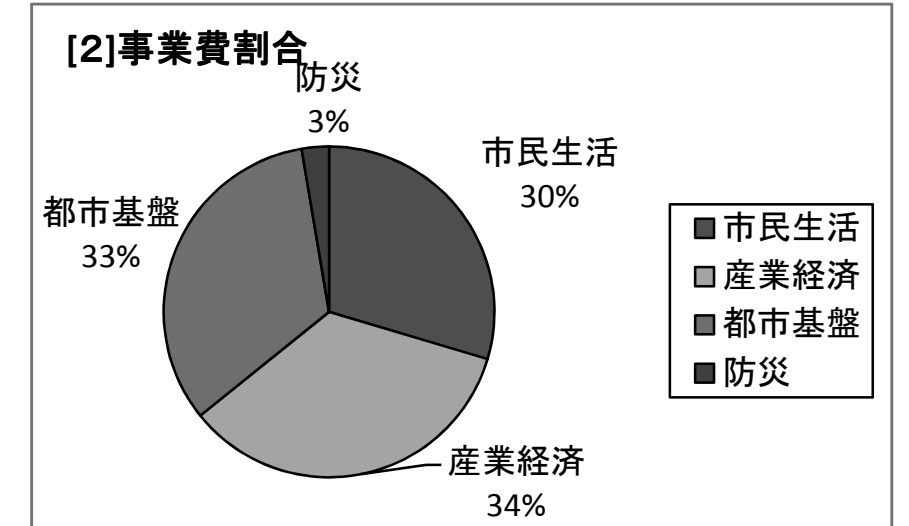


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成29年3月31日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		122	
着手済	(1)	130	35
	(2)		43
	(3)		7
	(4)		45
検討中		5	
未着手		0	
計		257	
整理・統合等		18	

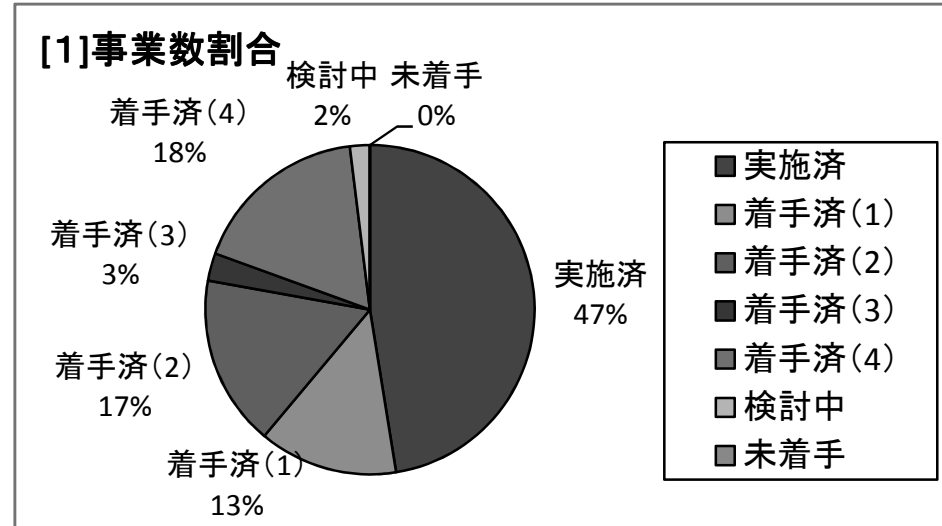

※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	114,924	48,582	9,725	3,106	42,512	10,999	18,178	17,397	23,524	12,532	16,543	19,454	4,872	1,556	434	434
産業・経済の復興	134,236	46,326	62,166	3,471	15,762	6,511	8,916	17,887	30,526	22,020	16,005	11,913	10,573	8,724	6,473	1,199
都市基盤の復興	128,593	32,249	53,118	4,689	27,976	10,561	3,922	10,212	17,552	22,321	17,490	22,971	23,787	8,033	1,436	869
防災まちづくり	10,377	2,127	24	67	6,412	1,747	131	2,173	2,415	4,554	415	365	201	41	41	41
合計	388,130	129,284	125,033	11,333	92,662	29,818	31,147	47,669	74,017	61,427	50,453	54,703	39,433	18,354	8,384	2,543
復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)							152,833 (39.4%)			166,583 (42.9%)			68,714 (17.7%)			

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成28年度)→: 319,416百万円÷総事業費:388,130百万円=82.3%

※着手済事業の(1)・(2)の平成29年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=83.2%

参考(前回調査時)

(H28.9.30現在)	396,558	127,682	144,206	10,429	83,413	30,828	30,568	50,886	75,283	72,551	60,485	55,569	22,893	14,618	8,341	5,364
復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)							156,737 (39.5%)			188,605 (47.6%)			51,216 (12.9%)			

■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 4 5 8 億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 7 0 6 億円	・港湾施設復旧事業 3 2 3 億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 6 0 億円
・防災集団移転促進事業 1 9 7 億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 1 1 8 億円	・湾口防波堤復旧事業 2 5 5 億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 1 4 億円
・災害公営住宅整備事業 1 4 2 億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 8 5 億円	・土地区画整理事業 2 3 4 億円	・防災行政無線整備事業 1 0 億円
