
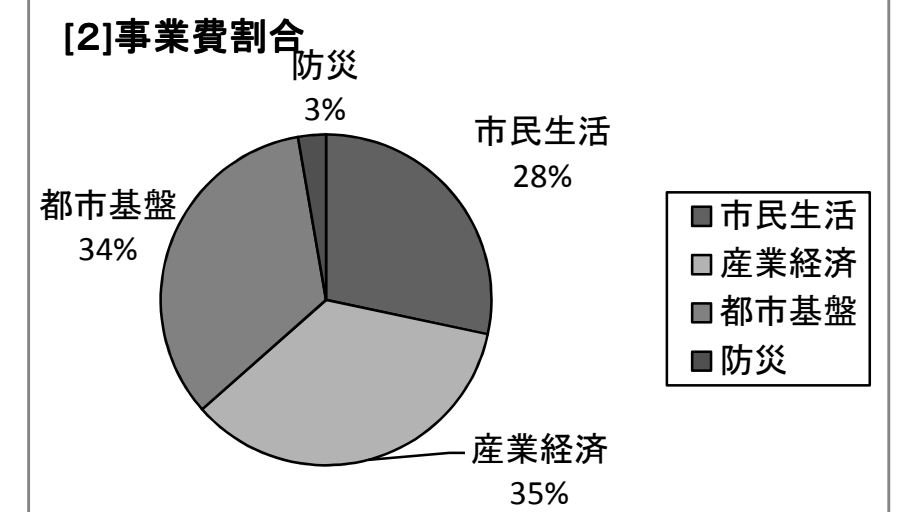


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成29年9月30日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		124	
着手済	(1)	132	35
	(2)		43
	(3)		7
	(4)		47
検討中		0	
未着手		0	
計		256	
整理・統合等		20	

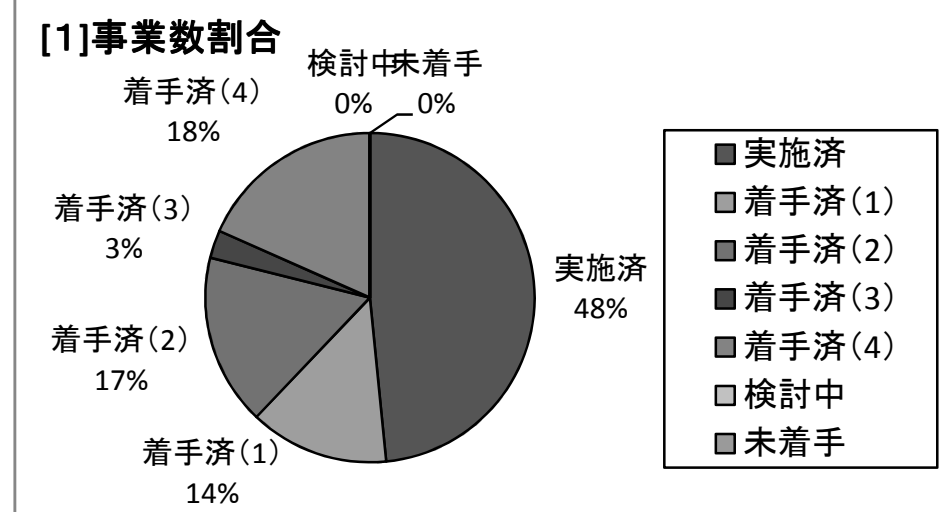

※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	108,062	48,573	9,323	2,263	36,844	11,059	18,178	17,397	23,563	11,625	13,731	13,404	5,023	4,255	443	443
産業・経済の復興	134,115	46,443	61,715	3,471	15,992	6,494	8,914	17,888	30,526	22,020	15,965	11,475	10,913	8,744	6,472	1,198
都市基盤の復興	128,794	31,956	53,117	4,416	29,316	9,989	3,922	10,212	17,534	22,321	17,490	22,992	24,121	7,706	1,444	1,052
防災まちづくり	10,398	2,123	24	69	6,407	1,775	131	2,173	2,415	4,554	414	366	221	42	41	41
合計	381,369	129,095	124,179	10,219	88,559	29,317	31,145	47,670	74,038	60,520	47,600	48,237	40,278	20,747	8,400	2,734
復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)							152,853 (40.1%)			156,357 (41.0%)			72,159 (18.9%)			

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成28年度)→: 309,210百万円÷総事業費: 381,369百万円=81.1%

※着手済事業の(1)・(2)の平成29年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=82.0%

参考(前回調査時)

(H29.3.31現在)	388,130	129,284	125,033	11,333	92,662	29,818	31,147	47,669	74,017	61,427	50,453	54,703	39,433	18,354	8,384	2,543
復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)							152,833 (39.4%)			166,583 (42.9%)			68,714 (17.7%)			


■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 4 5 8 億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 7 0 6 億円	・港湾施設復旧事業 3 2 3 億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 6 0 億円
・防災集団移転促進事業 1 9 7 億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 1 1 8 億円	・湾口防波堤復旧事業 2 5 5 億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 1 4 億円
・被災学校移転改築事業 1 1 2 億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 8 5 億円	・土地区画整理事業 2 3 4 億円	・防災行政無線整備事業 1 0 億円

分野別の復興状況


①市民生活の復興

進捗状況	事業数
実施済	36
着手済(1)	5
着手済(2)	21
着手済(3)	1
着手済(4)	15
検討中	0
未着手	0
計	78
整理・統合等	0

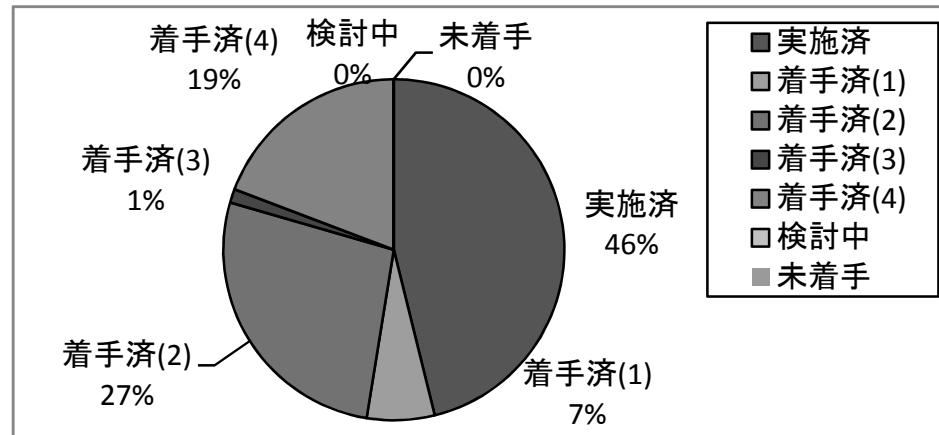


②産業・経済の復興

進捗状況	事業数
実施済	53
着手済(1)	19
着手済(2)	11
着手済(3)	1
着手済(4)	11
検討中	0
未着手	0
計	95
整理・統合等	14

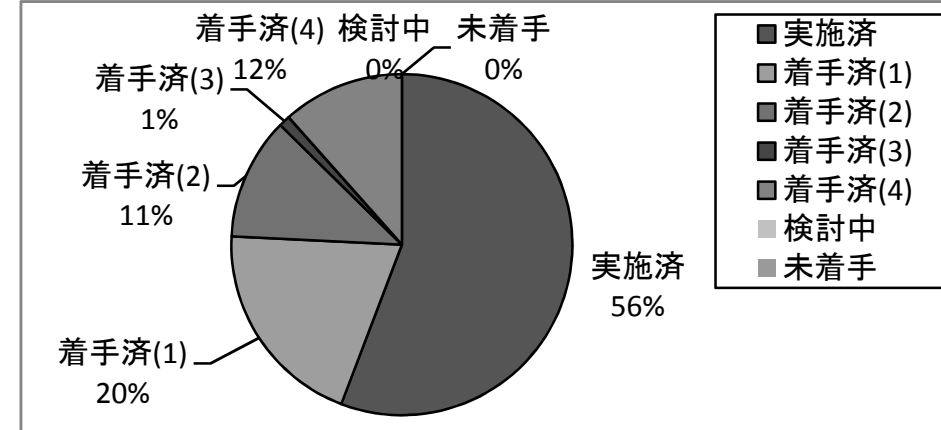


③都市基盤の復興

進捗状況	事業数
実施済	16
着手済(1)	3
着手済(2)	4
着手済(3)	5
着手済(4)	15
検討中	0
未着手	0
計	43
整理・統合等	4

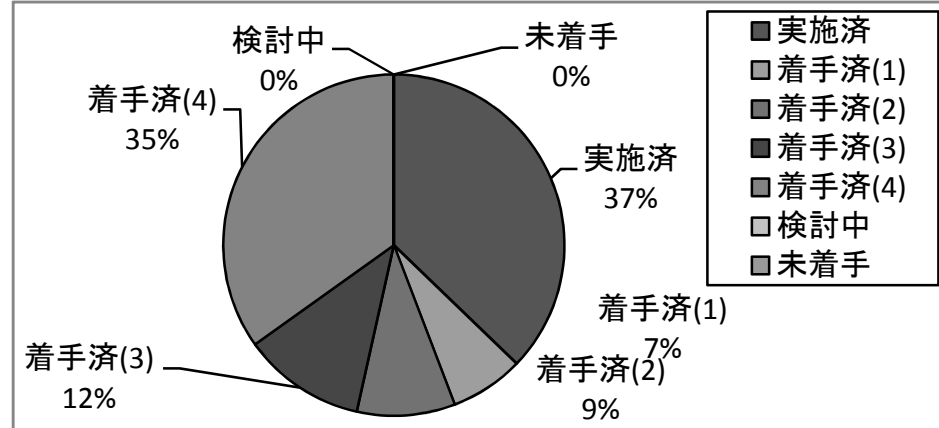

④防災まちづくり

進捗状況	事業数
実施済	19
着手済(1)	8
着手済(2)	7
着手済(3)	0
着手済(4)	6
検討中	0
未着手	0
計	40
整理・統合等	2

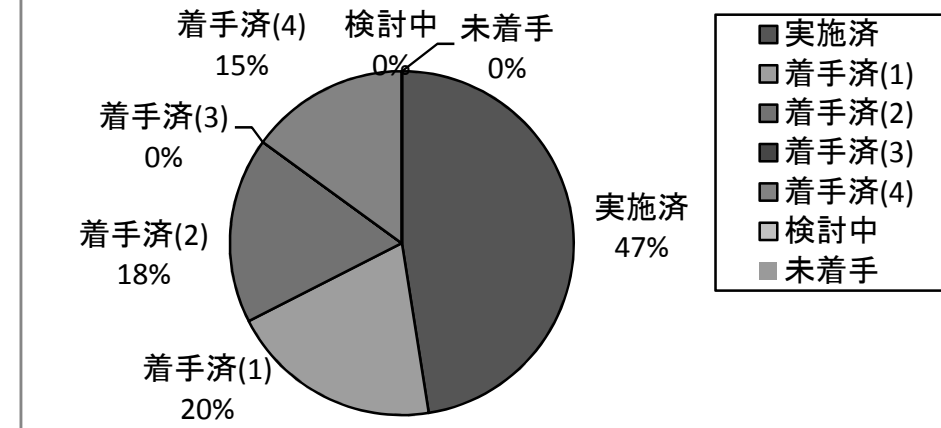


前回調査から進捗状況が変更した事業

分野	新たに「実施済」となったもの		新たに「着手済」となったもの		新たに「検討中」となったもの		新たに「整理・統合等」となったもの	
	頁	事業名	頁	事業名	頁	事業名	頁	事業名
市民生活の復興			9	シルバー人材センター運営事業				
産業経済の復興	15	共同利用コンテナ用上屋整備事業	13	産業用地整備事業(新)				
	15	コンテナヤード附帯設備等整備事業						
都市基盤の復興							26	災害対応強化都市公園事業
							26	メモリアル公園等整備事業
防災まちづくり			33	潮位観測装置等整備事業				
			33	津波避難ビル等の指定				
合計件数	2		4		0		2	

復興計画事業一覧

復興計画事業進捗状況

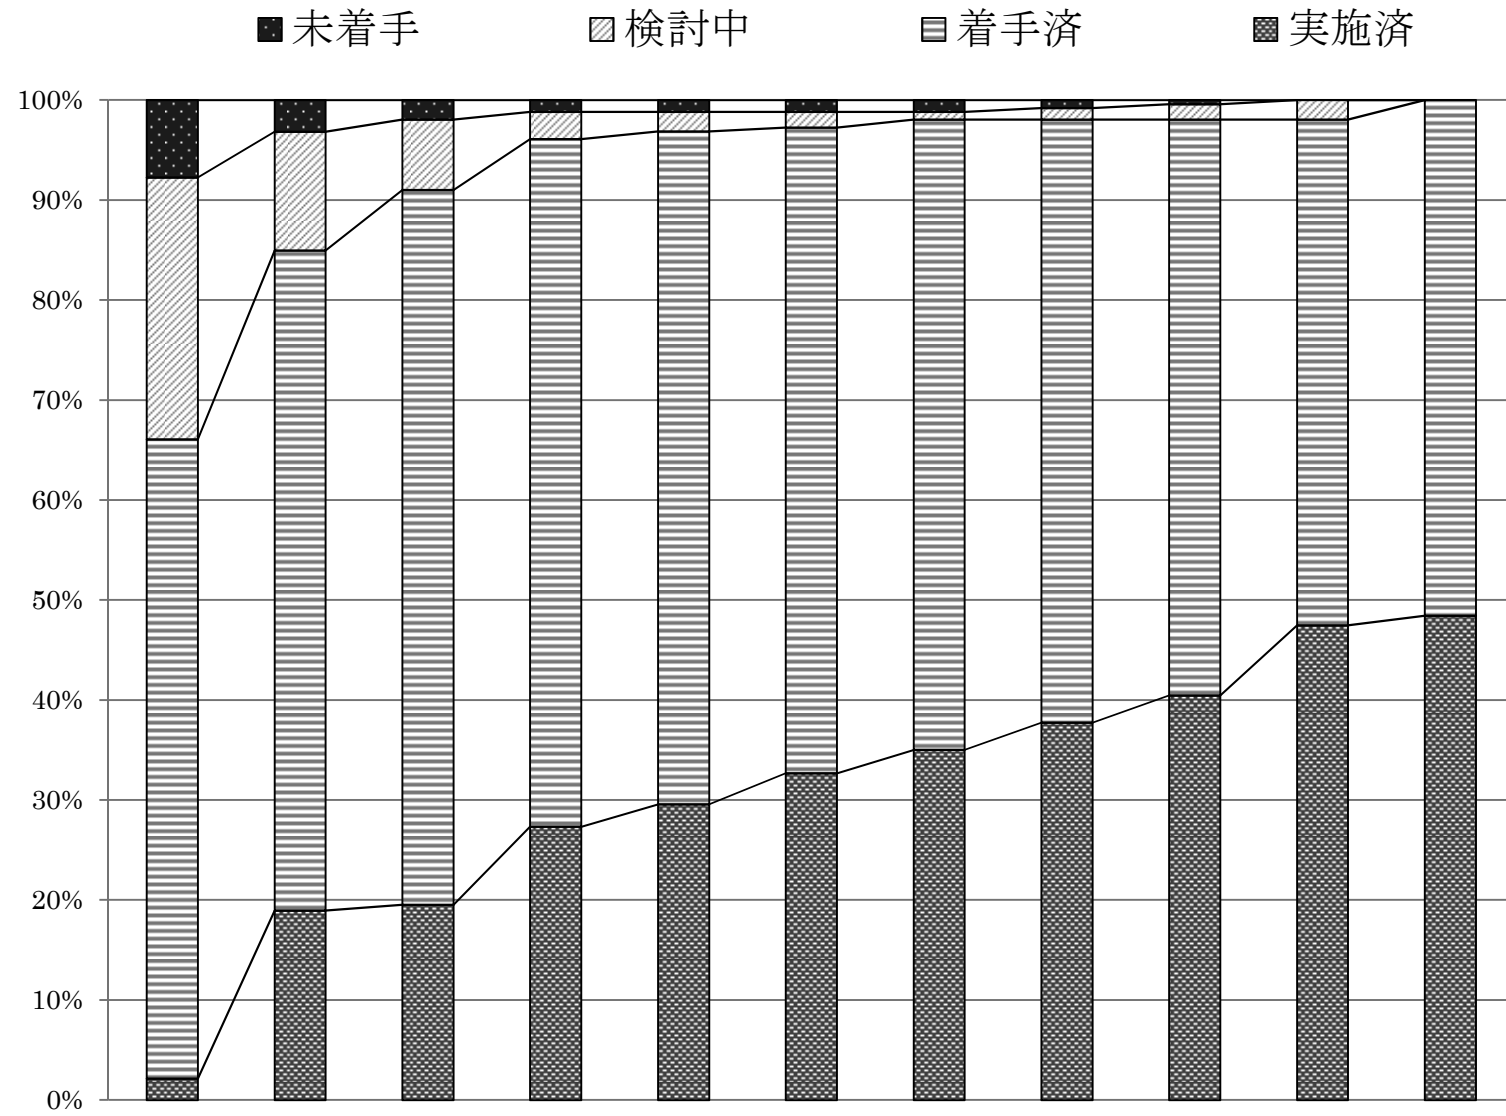

	H24.1.12		H25.3.31		H25.9.30		H26.3.31		H26.9.30		H27.3.31		H27.9.30		H28.3.31		H28.9.30		H29.3.31		H29.9.30	
	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合
実施済	5	2%	48	19%	50	20%	70	27%	76	30%	84	33%	90	35%	97	38%	104	40%	122	47%	124	48%
着手済	149	64%	167	66%	183	71%	176	69%	173	67%	166	64%	162	63%	155	60%	148	58%	130	51%	132	52%
検討中	61	26%	30	12%	18	7%	7	3%	5	2%	4	2%	2	1%	3	1%	4	2%	5	2%	0	0%
未着手	18	8%	8	3%	5	2%	3	1%	3	1%	3	1%	3	1%	2	1%	1	0%	0	0%	0	0%
合計	233	100%	253	100%	256	100%	256	100%	257	100%	257	100%	257	100%	257	100%	257	100%	257	100%	256	100%
整理・統合等	0		12		13		16		16		17		17		17		17		18		20	

- 復興計画事業は、実施優先度により次の3種類に分類しています。
 - 事業番号の下に該当する表示を記載しています。
 - ◎：緊急に実施する事業
 - ：急いで実施する事業
 - △：通常ペースで実施する事業
- 事業区分は、次のとおりです。
 - H：ハード事業（施設などを整備する事業）
 - S：ソフト事業（サービスなどを提供する事業）
- 復興計画策定後、新たに復興計画事業とした事業（復興計画策定時に掲載していない事業）については、当該事業欄全体を網かけ表示しています。
 - また、当該事業のうち、前回作成時（平成29年3月31日現在）以後に掲載した事業には事業番号欄に「新」、それ以外の事業については「追○」（○は番号）と記載しています。
- 事業の進捗状況区分は、次のとおりです。
 - 未着手：事業実施の見通しが立たないもの
 - 検討中：事業実施に向け、準備段階のもの
 - 着手済：事業に着手し、実施中のもの
 - 実施済：すでに事業が終了したもの
 - 整理・統合等：他事業との統合やその他の事情により、事業を実施しなかったもの
- 着手済事業の細分類区分は、次のとおりです。
 - 1 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの
⇒（実質的に実施済）
 - 2 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの
 - 3 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成（完了）していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
 - 4 震災後からの事業で、まだ完成（完了）していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- 復興交付金が配分されている事業については、「復興交付金」欄に次のように記載しています。
 - 有：基幹事業として配分されている場合
 - ※有：効果促進事業として配分されている場合
- 前回作成時（平成29年3月31日現在）以後における、進捗状況に係る主な変更箇所については、下線を付してあります。

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課		
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
方針① 被災者の早期の住宅再建を支援するほか、地域コミュニティの維持・形成に配慮した、安全な生活環境を確保します。																								
施策ア 被災者の事情に十分配慮しながら、個人住宅再建のための支援を行います。																								
1 △	H	応急仮設住宅維持管理等支援事業	応急仮設住宅の補修や駐車場などの維持管理 ・市内37団地、1,801戸対象(当初)	市	H23～	着手済	4	※有	【現状】 ・施設の維持管理実施中(敷地料、街灯電気料、共用部分の光熱水費などを支出) ・一部応急仮設住宅の集会所を整備済(復興交付金活用) ・学校敷地と民有地に立地する応急仮設住宅への新規入居は終了 ・平成26年11月14日に大船渡市応急仮設住宅の撤去・集約化計画を公表し、平成27年11月25日に計画を変更した。 ・入居状況等に基づき、計画を随時見直ししている。 ・空室:423戸(平成29年9月末現在) ・学校敷地と都市公園に建設された応急仮設住宅は撤去済み ・大田(市営球場)は住宅を撤去し、グラウンド整備中 ・施設の廃止・撤去:199棟(1,143戸)(平成29年9月末現在) 【課題】 ・被災者の状況を十分に踏まえながら、施設を集約・撤去する必要がある	305,599	20,047	243,236	2,509	39,807	72,034	41,635	40,004	42,382	38,766	39,565	31,213	住宅公園課		
4 ◎	H	埋蔵文化財調査事業	被災者の遺跡内への住宅建設などに伴う発掘調査	市	H23～H32	着手済	4	有	【現状】 ・自主再建及び防災集団移転促進事業に伴う住宅建設に係る試掘・発掘調査、整理作業を実施中 ・平成28年度の調査状況 試掘調査:実施済→3件 発掘調査:実施済→1件 ・平成29年度の調査状況 試掘調査:実施済→2件 【課題】 ・関係者で情報を共有し、スケジュールを調整しながら、効果的な事業推進を図る必要がある	276,735			207,551	69,184		14,713	13,790	63,653	72,518	35,157	76,904	生涯学習課		
施策イ 住宅の自主再建が困難な方のために、公営住宅を整備します。																								
5 ◎	H	災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備 ・土地購入、用地造成、取付道路工事なども実施 ・市整備分 290戸(H23～H28) ・県整備分 511戸(H23～H28) 〔市管理分 249戸 県管理分 262戸(参考)〕 合計 801戸(整備計画戸数) ・市管理分 539戸 ・県管理分 262戸(参考)	県・市	H23～H28	実施済		有 ※有	【現状】 《市営》 ・全539戸が完成し入居済 《県営》 ・全262戸が完成し入居済(参考)	7,644,503			889,800	6,754,103	600	38,788	400,716	213,062	1,885,793	2,984,717	2,121,427	住宅公園課		
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																								
7 ◎	H	防災集団移転促進事業	居住に適当でない認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることのないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23～H30	着手済	4	有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・西地区、浦浜東・浦嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし	19,715,825			17,117,226	2,598,599		386,096	2,375,742	3,834,365	4,064,076	3,488,990	2,638,783	2,927,773	復興政策課 市街地整備課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
追4 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(復興住宅新 築補助金)	住宅を滅失した被災者が、住宅の新築・購入する場合に要する費用の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：バリアフリー対応工事 床面積75㎡未満＝40万円 床面積75㎡以上120㎡未満＝60万円 床面積120㎡以上＝90万円 県産材使用工事 使用量10㎡以上＝20万円 使用量20㎡以上＝30万円 使用量30㎡以上＝40万円	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：973件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	761,400		761,400					53,500	126,700	144,700	165,400	157,100	57,000	57,000				住宅公園課
追5 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(被災住宅補 修等補助金)	被災した住宅の補修・改修工事費の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：補修工事(半壊・一部損壊) 対象工事費の1/2以内で 上限30万円 改修工事 耐震改修工事費の1/2以内で 上限60万円 バリアフリー改修工事費の1/2以内で上限60万円 県産材使用改修工事費の1/2以内で上限20万円	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：829件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	301,566		301,566					135,914	62,482	42,928	26,807	11,035	11,200	11,200				住宅公園課
追6 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(被災宅地復 旧補助金)	被災した宅地の復旧工事費の一部に対し、補助金を交付 ・対象工事 のり面の保護、排水施設の設置、地盤の補強・整地、よう壁の設置・補強(旧よう壁の除去を含む)、地盤調査・設計調査費 ・補助金額：対象工事費の1/2以内で上限200万円	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業終期年度を延長済(平成25年度→平成28年度) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：338件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	374,804		374,804				154,603	75,680	64,673	41,402	16,446	11,000	11,000				住宅公園課	
追7 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(被災住宅債 務利子補給補助 金)	被災した住宅の再建資金を金融機関などから新たに借り入れた場合に、住宅ローンの支払い利子の一部に対し、補助金を交付 ・補助金額：支払利子相当額	市	H24～H30	着手済	4		【現状】 ・事業内容を拡充済(補助上限額の引き上げなど) ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：690件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	1,947,328		54,917		1,892,411		12,828	441,691	411,298	349,898	220,565	255,524	255,524				住宅公園課	
追8 ◎	S 生活再建住宅支援 事業(住宅再建移 転補助金)	被災者の自力による住宅再建を支援するため、市内に住宅再建移転を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付 ・補助金額：一律5万円 ・1世帯1回限り	市	H25～H30	着手済	4		【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・交付決定件数：1,309件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・補助金制度の周知徹底	93,500							23,900	10,250	14,900	14,450	15,000	15,000				住宅公園課	
追9 ◎	S 浄化槽設置整備事 業	被災住居の再建に伴う下水道未供用区域での低炭素社会対応型浄化槽の設置に対し、補助金を交付 ・補助金額：5人槽 352千円 7人槽 441千円 10人槽 588千円	市	H24～H29	着手済	4	有	【現状】 ・補助金申請相談及び受付を実施中 ・平成24年度交付件数：105件 ・平成25年度交付件数：143件 ・平成26年度交付件数：163件 ・平成27年度交付件数：154件 ・平成28年度交付件数：86件 ・平成29年度交付件数：11件 【課題】 ・特になし	331,193						43,333	58,489	65,912	61,502	34,366	67,591				下水道事業所		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
43 ○	H 漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)	被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧 県管理:門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港) 市管理:碓石、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港)	県・市	H23~H32	着手済	4		【現状】 ・市内全22漁港(県営:6、市営:16)の本復旧事業に着手 ・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は99% →施設全部の使用を開始した施設は173施設(一部の使用を開始した施設を含めると179施設) ・未発注の施設は、防潮堤工事と関連している施設であり、 <u>防潮堤工事の進捗を見ながら、随時発注していく。</u> ・県において、大船渡漁港海岸と綾里漁港海岸の完了時期をそれぞれH31、H32まで延伸。 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある	70,603,131	23,244,837	47,358,294					354,564	2,104,445	12,576,471	12,666,229	9,680,735	9,491,867	9,000,000	8,000,000	6,000,000	728,820	水産課	
追7 ◎	H 漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碓石の市営全16漁港の用地のかさ上げ	市	H24~H30	着手済	4	有	【現状】 ・測量・設計委託業務終了 ・全16漁港のうち全漁港で工事着手済→14漁港(扇洞、碓石、鬼沢、小壁、千歳、増館、小路、長崎、合足、小石浜、砂子浜、泊里、吉浜、泊)が終了。 <u>野野前漁港は、平成29年度完成予定。蛸ノ浦漁港は、30年度以降も継続実施予定。</u> 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要	700,000																		水産課
◎	S 水産業経営基盤復旧支援事業【再掲】	漁協などによる養殖施設などの共同利用施設の一括整備に対する補助	漁協	H23~H29	着手済			【現状】 ・事業実施主体が事業実施中 【課題】 ・整備した施設の適正管理																			水産課
47 ○	S 採介藻漁業復旧支援事業	漁協が行う採介藻漁業の再開に必要な紫外線海水殺菌装置などの整備に対する補助	漁協	H24~H25	整理・統合等			【現状】 ・No.26水産業共同利用施設復旧支援事業に統合 【課題】 ・なし																			水産課
施策力 持続可能な水産業の仕組みを模索します。																											
○	H アワビの里復旧事業【再掲】	つくり育てる漁業を推進するため、津波により被災したアワビ生産センターを復旧	市	H26~H32	着手済			【現状】 ・検討の結果アワビ生産センター復旧を見送り、漁協が実施する種苗放流経費に補助を行う 【課題】 ・アワビ種苗放流を継続し、つくり育てる漁業を推進する																		水産課	
△	S 漁業の6次産業化支援事業【再掲】	漁業者などによる養殖ワカメなどの地域水産物の新たな販売モデル事業などの導入実施に対する支援	漁協	H26~H29	着手済			【現状】 ・各種支援制度の周知 ・ブランド化推進に関する協議会を開催 ・ブランド化推進に関する研修会へ出席 ・平成27年度より地域再生営漁計画支援事業を実施し、ブランド化推進の取り組みを支援している。 【課題】 ・漁協、漁業者と一丸となって事業展開を図る必要がある																		水産課	
52 △	H アサリ増殖場整備事業	アサリを対象種に資源の増産と持続的利用を図り、漁家世帯の所得向上と地域振興を図るための大船渡湾内における増殖場整備事業(湾内の環境調査を含む) ・面積:10,000㎡	市	H24~H30	整理・統合等			【現状】 ・No.追8大船渡湾内干潟造成事業に統合 【課題】 ・なし																		水産課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源												
87◎	S	中小企業融資あっせん事業	事業資金を融資するため、各金融機関へ原資を預託	市	H23～	着手済	1	【現状】 ・平成23年度～平成29年度の融資実行件数:842件(平成29年9月末現在) ・平成29年度融資実行件数:57件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・融資制度利用の周知	3,420,000						405,000	305,000	312,000	432,000	380,000	318,000	308,000	320,000	320,000	320,000	商工課	
88△	S	中小企業振興事業	中小企業者で組織する団体などの実施事業に対する補助 ・対象事業:異業種交流、新商品開発促進、販売促進、人材養成など ・補助率:対象経費の1/2以内	市	H23～	着手済	1	【現状】 ・平成24年度交付件数:3件 ・平成25年度交付件数:6件 ・平成26年度交付件数:8件 ・平成27年度交付件数:6件 ・平成28年度交付件数:8件 ・平成29年度交付決定件数:9件(平成29年9月末現在) 【課題】 ・適切な補助対象の検討	29,135							1,585	2,448	3,798	2,630	3,013	3,661	4,000	4,000	4,000	商工課	
89○	S	中小企業対策事業	・広報紙「しおさい」の発行	市	H23～	着手済	1	【現状】 ・大船渡商工会議所へ委託して「しおさい」を発行 【課題】 ・広報しおさい配布先等の継続検討	21,900						2,912	2,912	2,912	2,912	2,552	1,500	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	商工課
90◎	S	中小企業融資補給事業	融資を利用した中小企業者へ保証料及び利子を補給 ・中小企業融資保証料の負担 ・中小企業融資利子補給の実施	市	H23～	着手済	1	【現状】 ・市融資制度利用事業所へ1.5%の利子補給を実施 ・保証料を全額負担 【課題】 ・融資制度利用の周知	647,345						78,823	54,440	54,043	51,002	49,035	47,002	70,000	81,000	81,000	81,000	81,000	商工課
追10◎	S	中小企業被災資産復旧補助事業【再掲】	中小企業の滅失した店舗・工場などの復旧に対する補助 ・対象事業者:被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など ・対象経費:被災資産・設備などの復旧に要する経費 ・補助率:1/2以内の額	市	H24～	着手済		【現状】 ・平成24年度から平成28年度までに、限度額の見直しによる追加申請も含め、110事業所133件が補助決定 平成29年度も、4～5月と10～11月の2回に分けて申請を受け付けることとし、1件が補助決定(平成29年9月末現在) 【課題】 ・財源の確保																		商工課
91◎	S	被災工場再建支援事業	被災した企業の工場などの再建に対する補助 ・被災前常用雇用者30人以上の企業 ・補助率:1/10 ・上限5,000万円(100人以上は1億円)	市	H23～H24	整理・統合等		【現状】 ・申請なし 【課題】 ・各種補助事業に該当しない事業者への支援																		商工課
92○	S	物産販路拡大事業	大船渡市の物産の需要拡大を図るため、各種物産展の開催や出展参加 ・物産展への出展参加 ・食品見本市や、いわて・三陸けせん希望ストリート開催の負担金 ・物産パンフレット・チラシの印刷 ・アンテナショップ開設の調査研究	市	H23～	着手済	1	【現状】 ・各地での各種物産展の開催や出展を展開 ・震災後、東京、名古屋、大阪をはじめ、全国各地での被災地支援イベントへ参加 【課題】 ・被災地支援などでの交流を機に販路開拓につなげる必要がある	25,721		1,189				24,532	1,467	2,387	2,473	3,158	3,110	2,970	2,926	2,410	2,410	2,410	観光推進室
施策イ 地場産業の連携・高度化や新たな分野での起業などを支援します。																										
94△	S	いわてものづくり産業人材育成事業	県内陸地域と沿岸・県北地域のものづくりネットワーク間の連携強化と産業集積を支える高度な産業人材の育成を支援	県	H23～	着手済	1	【現状】 ・県内5つのものづくりネットワークが、各地域の工業高校の実技講習の実施をサポートしている 【課題】 ・実施状況についての情報共有																	商工課	
施策ウ 北里大学など関係機関との産学官連携の取り組みを推進します。																										

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)								担当課		
									財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度		32年度	
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
◎	S	北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業【再掲】	市	H23～	着手済			【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立 ・平成26年4月1日に北里大学が、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育センターを開設 ・三陸臨海教育センターでの学生及び教職員の活動を支援するため、平成26年7月に「大船渡市北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育センター活動支援補助金交付要綱」を策定→平成26年以降、毎年夏期に海洋生命科学部が海洋実習を実施 ・三陸臨海教育センターの施設整備を支援するため、平成27年4月「大船渡市北里大学海洋研究拠点施設整備費補助金交付要綱」を策定→平成27年4月から三陸臨海教育センターの施設整備を実施し、7月に完了 ・平成29年3月、大船渡市北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス早期再開期成同盟会の組織・機能を北里大学三陸キャンパス活用検討協議会に一本化した。 【課題】 ・三陸キャンパスの活用促進 ・上記以外の支援内容															企画調整課		
95 ○	S	産学官連携交流促進支援事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・共同研究事業について、補助金交付済 ・平成24年度実績：2件 ・平成25年度実績：1件 ・平成26年度から共同研究先に岩手大学を追加 ・平成26年度実績：3件 ・平成27年度から北里大学全学部を共同研究先とした ・平成27年度実績：3件 ・平成28年度実績：5件 ・平成29年度交付決定件数：5件 【課題】 ・北里大学・岩手大学と市内企業による共同研究事業の実施形態・内容について検討する必要がある	40,200						2,400	1,200	3,600	3,600	6,000	5,400	6,000	6,000	6,000	6,000	商工課
◎	S	北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業【再掲】	市	H23～	着手済			【現状】 ・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・特になし																企画調整課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度		32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
8 ◎	H 港湾施設復旧事業	・国: 永浜地区岸壁(-13m)、野々田地区岸壁(-13m)の復旧 ・県: 野々田・茶屋前、永浜山口地区の岸壁、物揚場、防潮堤、防波堤、護岸、係留施設、水門、臨港道路などの復旧	国・県	H23~	着手済	4		【現状】 ・野々田地区、茶屋前地区及び赤土倉地区の港湾施設は、平成29年度内の復旧完了に向け工事中 ・永浜・山口地区及び清水地区の港湾施設は、平成30年度内の復旧完了見込み 【課題】 ・防潮堤などの復旧について、まちづくりとの整合を図る必要がある	32,392,319	560,000	31,832,319						115,000	1,138,000	6,484,000	1,802,559	3,955,254	3,148,368	12,468,937	3,280,201			企業立地港湾課	
施策イ 湾口防波堤については、湾内の水質環境に十分配慮のうえ復旧します。																												
◎	H 港湾施設復旧事業【再掲】	・国: 永浜地区岸壁(-13m)、野々田地区岸壁(-13m)の復旧 ・県: 野々田・茶屋前、永浜山口地区の岸壁、物揚場、防潮堤、防波堤、護岸、係留施設、水門、臨港道路などの復旧	国・県	H23~	着手済			【現状】 ・野々田地区、茶屋前地区及び赤土倉地区の港湾施設は、平成29年度内の復旧完了に向け工事中 ・永浜・山口地区及び清水地区の港湾施設は、平成30年度内の復旧完了見込み 【課題】 ・防潮堤などの復旧について、まちづくりとの整合を図る必要がある																				企業立地港湾課
施策ウ 地盤沈下状況などを十分考慮しながら、海岸保全施設を早期に復旧します。																												
◎	H 港湾施設復旧事業【再掲】	・国: 永浜地区岸壁(-13m)、野々田地区岸壁(-13m)の復旧 ・県: 野々田・茶屋前、永浜山口地区の岸壁、物揚場、防潮堤、防波堤、護岸、係留施設、水門、臨港道路などの復旧	国・県	H23~	着手済			【現状】 ・野々田地区、茶屋前地区及び赤土倉地区の港湾施設は、平成29年度内の復旧完了に向け工事中 ・永浜・山口地区及び清水地区の港湾施設は、平成30年度内の復旧完了見込み 【課題】 ・防潮堤などの復旧について、まちづくりとの整合を図る必要がある																				企業立地港湾課
◎	H 海岸保全施設災害復旧事業【再掲】	被災した農地海岸保全施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸堤防の復旧・整備を実施 ・海岸保全施設: 吉浜、沖田、合足	県	H23~H29	着手済			【現状】 ・沖田: 防潮堤復旧工事終了 ・合足: 堤体工事終了 ・吉浜: 離岸堤工事終了、防潮堤復旧工事進捗中 【課題】 ・特になし																				農林課
○	H 漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)【再掲】	被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧 県管理: 門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港) 市管理: 碓石、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港)	県・市	H23~H32	着手済			【現状】 ・市内全22漁港(県営: 6、市営: 16)の本復旧事業に着手 ・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は99%→施設全部の使用を開始した施設は173施設(一部の使用を開始した施設を含めると179施設) ・未発注の施設は、防潮堤工事と関連している施設であり、防潮堤工事の進捗を見ながら、随時発注していく。 ・県において、大船渡漁港海岸と綾里漁港海岸の完了時期をそれぞれH31、H32まで延伸。 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある																			水産課	
追 ◎	H 漁港施設機能強化事業【再掲】	地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碓石の市営全16漁港の用地のかさ上げ	市	H24~H30	着手済		有	【現状】 ・測量・設計委託業務終了 ・全16漁港のうち全漁港で工事着手済→14漁港(扇洞、碓石、鬼沢、小壁、千歳、増館、小路、長崎、合足、小石浜、砂子浜、泊里、吉浜、泊)が終了。野野前港は、平成29年度完成予定。蛸ノ浦漁港は、30年度以降も継続実施予定。 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要																				水産課

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課												
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度													
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源											
施策工 上水道・下水道を早期に復旧します。																																				
11 ◎	H	水道施設復旧事業	市	H23～H30	着手済	4	※有	【現状】 ・応急復旧は終了。 ・土地区画整理事業区域内及び防潮堤、道路の嵩上げ等に対応した送配水管布設を実施中 ・防災集団移転に伴う住宅団地への配水管布設工事は28年度で完了 【課題】 ・津波浸水区域などの具体的な土地利用が確定後、事業を実施する必要がある	1,840,555	1,300,343			25,900	104,519	409,793	155,850	175,632	25,554	115,722	171,756	284,018	148,176	438,097	224,750	101,000	水道事業所 簡易水道事業所										
12 △	H	水道施設整備事業	市	H24～H32	着手済	4		【現状】 ・簡易水道事業分は平成24年度から、上水道事業分は平成25年度から着手済 【課題】 ・津波浸水区域などの具体的な土地利用が確定後、実施計画を検討する必要がある	2,088,269				1,645,080	430,469	12,720		2,457	86,569	124,412	225,717	201,182	173,572	425,260	367,400	481,700	水道事業所 簡易水道事業所										
13 ◎	H	公共下水道及び都市下水路災害復旧事業	市	H23～H29	着手済	4		【現状】 《大船渡浄化センター》 ・日本下水道事業団に委託して事業実施 ・生物処理は平成24年1月より開始 ・平成25年3月に本復旧工事終了 ・平成29年度：場内整備工事実施予定 《管渠施設》 ・流下機能に支障が生じる重大な損傷なく供用中 ・道路の嵩上げなど土地利用計画との調整を図りながら復旧を進めている 平成29年度は、小規模管渠修繕、マンホール嵩上げ施工予定 《都市下水路》 ・平成24年11月に桜場都市下水路水門工事終了 ・新田都市下水路復旧工事 平成24年度：実施設計 平成25～26年度：復旧工事施工 平成27年3月に工事終了 ・盛東部都市下水路水門補修予定 【課題】 ・特になし	1,825,700	1,705,251			19,700	100,749		694,527	895,467	100,683	94,602	4,401	4,320	31,700					下水道事業所									

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
道2 ◎	H	公共下水道整備事業	市	H24~H29	着手済	4	有 ※有	【現状】 《盛川左岸幹線推進工事》 ・平成26年度:3月に工事終了 ・平成27年3月から赤崎町上三区地区で下水道の供用を開始 《大船渡駅周辺地区土地区画整理事業下水道計画策定》 平成26年度:12月に業務終了 ・上記計画策定後に土地区画整理事業と一体的に実施する工事などは、別事業に移管 《新田都市下水路嵩上げ工事》 ・平成26年度:3月に工事終了 《防災集団移転促進事業関連下水道工事》 ・大船渡北地区 平成26年度:10月に工事終了 ・下船渡地区 平成26年度:9月に工事終了 ・赤崎南地区 平成25年度:実施設計 平成27-29年度:整備工事施工 平成28年度:実施設計 平成29年度:詳細設計 《下水道台帳再整備》 平成27年度:3月に業務完了 《公共下水道(蛸ノ浦地区漁業集落排水施設)接続》 平成27年度:3月に実施設計業務完了 平成29年度:工事着手 【課題】 ・まちづくり関連事業などとの調整を図りながら、事業を実施する必要がある	1,511,236			47,200	1,177,248	286,788													下水道事業所
14 ◎	H	漁業集落排水施設復旧事業	市	H23~H29	着手済	4		【現状】 《蛸ノ浦》 ・国土交通省から無償で借り受けた汚水処理設備(MBR施設)により供用 ・MBR施設の改良により平成25年3月に本復旧工事終了 《砂子浜・小石浜・千歳》 ・平成24年4月に本復旧工事終了 《根白》 ・国土交通省から無償で借り受けたMBR施設により供用 ・平成24年9月に本復旧中の施設に切替え供用開始 ・平成24年10月に本復旧工事終了 《その他》 ・平成25年度以降は、軽微な復旧事業を実施中 【課題】 ・特になし	711,334		549,801	7,500	154,033													下水道事業所	
施策オ 都市基盤施設の復旧・整備にあたっては、防災機能の向上に配慮するほか、広域幹線交通網の強化や防災拠点として有用な「道の駅」の適正配置など、重要施設などへの重点・優先投資を行います。																											
15 ○	H	防災・連携道路ネットワークの整備	国・県・市	H23~	着手済	3		【現状】 三陸沿岸道路吉浜道路はH27年度供用開始済み、吉浜釜石道路は工事着手済み 国道397号津付道路供用開始 市道滝の沢線は用地交渉中 ・その他の路線などは、附帯工事などを発注したほか、事業計画を調整中 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある	220,100	132,000		88,100													建設課		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
16◎	H	交通安全施設災害復旧事業	国・県・市	H23～	着手済	4		【現状】 ・復旧事業は着手済 【課題】 ・土地利用計画や道路改良事業などと調整を図りながら、事業を実施する必要がある	59,322						59,322	6,998	6,885	6,979	6,461	6,999	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	建設課
18△	H	災害対応強化都市公園事業	市	H26～	整理・統合等			【現状】 ・「大船渡総合公園整備計画」の白紙化により、当該地を将来的な行政需要に備える土地とした																			住宅公園課
19○	H	メモリアル公園等整備事業	県・市	H23～H30	整理・統合等			【現状】 ・公園整備のためのワークショップ開催、パブリックコメント実施 ・メモリアル機能を備えた(仮称)大船渡公園を土地区画整理事業と併せて整備する。 【課題】 ・みなと公園との機能連携 ・関係機関・団体等との調整																			市街地整備課 防災管理室
<p>施策カ 道路を盛土構造とすることなどについて、防災上の効果を十分に検討したうえで整備を図るほか、災害時に集落が孤立しないよう代替路線を整備・確保します。</p>																											
○	H	道路新設・改良事業【再掲】	県・市	H23～	着手済		有 ※有	【現状】 県道：道路計画について用地測量などを実施中 市道：20路線の測量設計・工事発注済、14路線で工事終了 ・道路計画策定事業に着手済 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある ・三陸沿岸道路は集中復興期間終了後の財源が未確定 ・復興交付金事業は、復興計画期間終了後も事業が継続することが見込まれるが、財源が未確定																			建設課
<p>施策キ 鉄道施設については、関係自治体などとの連携・協力のもとに、災害への対応や公共交通サービスの水準、将来を見据えた交通システムの構築などに関して幅広い検討を行いながら、できるだけ早期の復旧・整備を目指します。</p>																											
22◎	S	路線バス運行事業	市	H23～	着手済	1		【現状】 ・平成27年4月1日より、綾里外口線、丸森立根線、立根田谷線、碓石線、日頃市線の5路線の運行(日頃市線の運行再開) (碓石線の本数を増やして運行) (綾里線、外口線を綾里外口線に一本化) ・デマンド交通実証実験運行開始により、平成27年10月1日から日頃市線運休 【課題】 ・路線バスダイヤ改正に伴う交通事業者との協議 ・利用の少ない路線への今後の対応	358,757	155,131	16,096		20,962	166,568	71,163	31,707	53,491	30,227	28,974	25,078	28,117	30,000	30,000	30,000	30,000	企業立地港湾課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課					
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度		32年度				
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源															
追4 ○	S	大船渡市コミュニティバス事業	被災者向けコミュニティバスの実験運行(住居の高台移転地や応急仮設住宅地と路線バスルートの接続など)	市	H24～	着手済	2	※有	【現状】 ・平成26年3月に「大船渡市総合交通ネットワーク計画」及び「コミュニティバスの実証実験に係る事業実施計画」を策定し、29年度において「大船渡市総合交通ネットワーク計画」を一部改定作業中。 ・平成27年10月1日～日頃市地区デマンド交通実証実験運行開始、29年度継続実施中 ・平成27年11月5日～患者輸送バス一般乗車実証実験(綾里、越喜来地区)、29年度継続実施中 ・平成27年11月20日～平成28年3月31日、タクシーチケット配布実証実験実施(三陸地区及び日頃市地区を除く) 29年1月より再開、29年度継続実施中 【課題】 ・関係機関との調整 ・持続可能な公共交通体系の構築	114,181				91,344	22,837		16,107	11,942	38,669	19,999	8,764	18,700							企業立地港湾課
25 ◎	H	JR大船渡線の復旧事業	JR大船渡線の復旧に向けた沿線自治体、関係機関との整備方針の協議・検討	JR	H23～	着手済	2	【現状】 ・平成27年12月にBRTによる本格復旧の受入れに合意 ・平成25年9月に基石海岸口駅、平成27年12月に大船渡魚市場前駅をそれぞれ開設。 ・JR東日本へ要望した利便性向上に関する事項について協議を継続。 【課題】 ・利便性の向上等に関する市民要望の実現	2,051					112	1,939		133	112	1,319	407	22	58						企業立地港湾課	
27 ◎	H	岩手開発鉄道の復旧支援事業	岩手開発鉄道の復旧費用の一部を支援 ・補助率:国1/4、市1/4	市	H23	整理・統合等		【現状】 ・岩手開発鉄道において、国と市の補助・支援から他の補助金活用に切り替えた 【課題】 ・特になし																			企業立地港湾課		
方針② 土地利用のあり方を検討のうえ見直します。																													
施策ア それぞれの被災地域の特性を考慮した土地利用計画を定めます。																													
追5 ◎	S	復興計画推進事業	早期復興に向け、復興計画の積極的な推進と適正な進捗管理を図る	市	H24～H32	着手済	2	有 ※有	【現状】 ・復興計画推進業務の委託契約締結済 ・復興計画推進委員会を平成25年度に4回、平成26年度に3回、平成27年度に3回、平成28年度に2回開催済。平成29年度も第1回の委員会を開催済。 ・復興計画事業(主要事業)のスケジュールを半年ごとに広報等で周知 ・平成25年度から復興交付金事業計画管理支援システムを導入 ・平成25年9月及び平成28年9月に「復興に関する市民意識調査」を実施 ・平成25年10・11月に「復興のまちづくりに向けた地区懇談会」を開催 【課題】 ・市民参画を継続していく必要がある。	62,794				49,349	13,445		7,350	12,285	8,576	9,007	12,464	13,112						復興政策課	
追6 ◎	S	復興関連工事発生土対策推進事業	復興関連工事に係る土砂の需給調整など関係する対策を推進	県・市	H25～H29	着手済	4	※有	【現状】 ・県主導により設置した調整機関を中核として調整・対策を実施中 ・工事発生土の仮置き場を設置(門之浜地区及び綾里地区(市設置)) ・県において越喜来浦浜、泊地区に設置済 【課題】 ・工事関係土砂の円滑かつ適切な需給調整と活用	232,528		158,796	58,985	14,747			37,692	152,740	37,314	3,076	1,706						市街地整備課		

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
									事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
追7 ◎	S	被災地復興のための土地利用計画策定促進事業	市	H24~H32	着手済	4	※有	【現状】 ・被災地での復興関連事業導入のための調査検討業務及び各地区復興委員会等との協議・調整を委託済 ・土地利用計画の変更を予定している12地区のうち、10地区について実現化方策を策定 【課題】 ・土地利用を図る目的の事業について、復興交付金など効果的な財源を確保する ・地域住民の合意形成	128,732							66,900	3,509	58,323							土地利用課
30 ○	H	土地区画整理事業	市	H23~H32	着手済	4	有 ※有	【現状】 ・緊急防災空地整備事業により用地買収を実施済 ・土地区画整理事業協定議決 ・平成25年8月事業計画認可 ・平成26年5月30日第1回仮換地指定 ・下水道整備事業協定議決 ・平成26年8月事業計画(第1回変更)認可 ・平成26年8月~平成27年3月第2~8回仮換地指定 ・平成27年7月事業計画(第2回変更)認可 ・平成27年4月~平成28年3月第9~22回仮換地指定 ・平成28年10月事業計画(第3回変更)認可 ・平成28年12月事業計画(第4回変更)決定 ・平成28年4月~平成29年3月第23~34回仮換地指定 ・平成28年8月31日第1回使用収益開始 ・平成28年11月~平成29年3月第2~3回使用収益開始 ・土地区画整理事業変更協定議決 ・平成29年4月~8月第35~36回仮換地指定 【課題】 ・公表している建築開始可能時期に合わせた地権者への仮換地の引き渡し	23,487,963		583,599		17,619,821	5,284,543		251,323	1,000,615	3,215,969	3,712,310	4,956,799	7,008,630	2,784,282	548,235	9,800	市街地整備課
追8 ◎	H	大船渡駅周辺地区下水道事業	市	H26~H30	着手済	4	※有	【現状】 ・UR都市機構と平成26年6月24日業務委託契約締結 【課題】 土地区画整理事業における基盤整備工事完了予定時期(平成30年度)までに完了する	1,662,532								95,060	312,553	324,125	778,749	152,045			市街地整備課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済 細分	復興 交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課						
									事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度		30年度	31年度	32年度			
										国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源														
追9 ◎	H	津波復興拠点整備事業	市	H23~H29	着手済	4	有 ※有	【現状】 (大船渡地区) ・先行地区の用地買収済 ・H26.3大和リース㈱とエリアマネジメント・パートナー協定締結 ・H26.3先行地区の盛土造成工事完了 ・H26.5予定借地人決定 ・H26.6事業計画変更認可 ・H26.7官民連携まちづくり協議会設立 ・H27.3津波防災拠点施設等基本設計完了 ・拡大地区の用地買収完了 ・H27.4特定業務施設用地の予定借地人決定 ・H27.11津波防災拠点施設等実施設計の契約締結 ・H27.12㈱キャセン大船渡を設立 ・H28.2まちなか再生計画の認定 ・H28.2先行地区内の公共施設の工事完了 ・H28.3事業計画変更認可 ・H28.3借地人整備のホテルが開業 ・H28.4~借地人整備の大規模商業施設が開業 ・H28.10津波防災拠点施設等工事業務の委託契約締結 ・H29.3津波防災拠点施設等のPRイベント兼社会実験を実施 ・H29.4㈱キャセン大船渡及びおふなと夢商店街商業組合が整備を進めてきた商業施設が開業 【課題】 ・関係機関や権利者などとの調整	6,069,372				4,552,029	1,517,343			905,539	2,671,413	297,282	1,090,095	1,105,043							市街地整備課
31 ○	H	小規模住宅地区等改良事業	市	H23~	整理・統合等			【現状】 ・他の住宅再建関連事業の進捗に伴い、実施する可能性が低くなった 【課題】 ・特になし																				住宅公園課
施策イ 沿岸地域を中心とした住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどに伴い、移転先地域なども含めた複数のエリアで土地利用のあり方を検討し、用途を定めます。																												
◎	H	防災集団移転促進事業【再掲】	市	H23~H30	着手済		有	【現状】 ・全21地区において事業実施中 ・21地区のうち、大船渡地区、峰岸地区、神坂地区、細浦地区、小細浦地区、小河原地区、梅神地区、門之浜地区、泊里地区、佐野地区、中赤崎地区の一部、永浜地区、清水地区、蛸ノ浦地区、田浜地区、港・岩崎地区、泊地区、浦浜南地区、浦浜仲・西地区、浦浜東・甫嶺地区、崎浜地区)で団地整備工事が完了し、宅地を引渡すとともに、住宅移転費用の補助、被災跡地買取りを実施している 【課題】 ・特になし																			復興政策課 市街地整備課	

事業区分	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	着手済細分	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)							担当課										
									財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度		30年度	31年度	32年度							
									事業費(千円)	国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源						
<p>施策エ 市内全域または地域ごとに防災訓練を実施します。</p>																															
△	S	防災訓練の実施【再掲】	市関係機関など	H24～	着手済			<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成29年10月1日に市防災訓練を実施予定 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 復興事業の進捗や地域防災計画の見直し状況に応じた訓練項目を検討する必要がある 																	防災管理室						
<p>方針③ 地域コミュニティ機能の維持・強化を図ります。</p>																															
<p>施策ア 自主防災組織の育成・強化を支援します。</p>																															
<p>施策イ ボランティア組織の育成・強化を支援します。</p>																															
<p>施策ウ 市民の自主的な地域づくり活動や拠点となる施設の整備などに対して支援します。</p>																															
28	○	H	越喜来地区拠点センター建設事業	被災した市役所三陸支所を移転し、地区住民の避難所を兼ねた拠点センターとして整備	市	H24～	整理・統合等		<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 三陸支所(機能)については、三陸保健介護センターを改修し、業務を再開済→新たな施設は整備しない(地元復興委員会から同意を得ている) <p>【課題】</p>																三陸支所						
<p>方針④ ライフラインや交通・物流などの機能を強化します。</p>																															
<p>施策ア 関係機関の協力のもと、重要施設などへの重点・優先投資を行いながら、これら機能の早期復旧体制を整えとともに、再生可能エネルギーの活用など、非常時の応急的な生活を支える方策について検討します。</p>																															
33	○	H	再生可能エネルギー導入促進事業	再生可能エネルギーの活用による地産地消型エネルギー産業を復興の基礎とした、先駆的な医療・福祉や生活支援サービスの展開による超高齢化社会に適した地域づくりの推進など、国が構想する「環境未来都市」の構築に向けて、気仙管内の市町や関連企業などと連携した調査・研究、事業化への取り組み	市など	H23～H29	着手済	4	※有	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年6月から、五葉山太陽光発電合同会社が五葉山麓に建設していた太陽光発電所が平成27年8月に完成し、本稼働を開始 平成25年9月に、気仙広域環境未来都市推進共同事業体が設計に関与した環境共生型木造復興住宅のモデル棟(3棟)が住田町に完成→11月にも復興住宅として陸前高田市に2棟完成 防災集団移転促進事業の進捗に合わせた木造復興住宅に係る説明会を平成26年5月に開催(市内全域対象)→大船渡町及び赤崎町を対象に平成26年7月に開催 平成29年3月に気仙広域環境未来都市シンポジウム(対象:気仙地域住民)を開催 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 他の復興関連事業との調整 地元企業の参画促進 気仙2市1町間の調整 	6,075,029																			環境未来都市推進室	
追3	△	S	再生可能エネルギー導入促進事業(住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金)	環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、市民の環境に対する意識の高揚及び再生可能エネルギーの普及を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置する場合に要する経費に対して補助金を交付	市	H25～H32	着手済	2		<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 補助金交付要綱を策定(平成25年4月1日施行) 補助金申請相談及び受付を実施中 平成25年度交付決定件数:172件 平成26年度交付決定件数:107件 平成27年度交付決定件数:83件 平成28年度交付決定件数:52件 平成29年度交付決定件数:30件 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 補助金制度の周知徹底 	67,427																				企画調整課
<p>施策イ 災害に備えた物資の備蓄や調達方法を強化します。</p>																															

