



大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成27年3月31日現在

[1] 事業の進捗状況

| 進捗状況 | 事業数 |
|--------|-----|
| 未着手 | 3 |
| 検討中 | 4 |
| 着手済 | 166 |
| 実施済 | 84 |
| 計 | 257 |
| 整理・統合等 | 17 |

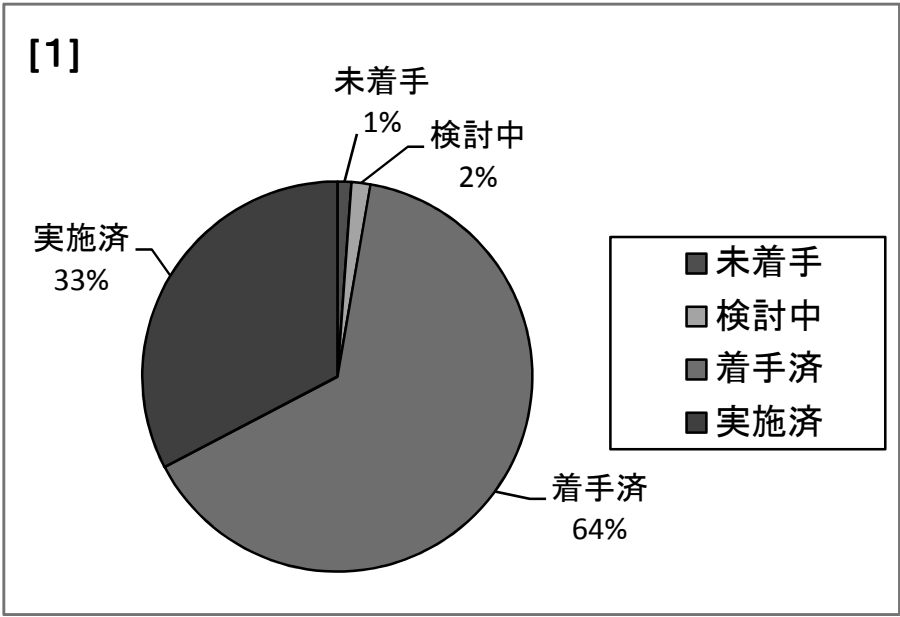

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

| 復興計画の柱 | 事業費 | 全体計画 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|---------|--------|---------------|-------|-------|-------|
| | | 財源内訳 (百万円) | | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| 市民生活の復興 | 135,499 | 48,904 | 23,143 | 1,897 | 47,664 | 13,891 | 18,411 | 20,161 | 24,083 | 16,900 | 39,712 | 12,939 | 1,498 | 1,245 | 275 | 275 |
| 産業・経済の復興 | 136,620 | 44,906 | 66,151 | 3,109 | 15,892 | 6,562 | 8,104 | 17,748 | 31,197 | 23,893 | 39,336 | 14,436 | 510 | 467 | 466 | 463 |
| 都市基盤の復興 | 126,931 | 27,856 | 59,007 | 5,160 | 28,446 | 6,462 | 3,922 | 10,240 | 17,733 | 33,990 | 35,070 | 14,476 | 5,996 | 3,646 | 1,396 | 462 |
| 防災まちづくり | 10,503 | 2,179 | 21 | 105 | 6,353 | 1,845 | 131 | 2,152 | 2,415 | 4,564 | 784 | 233 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 合計 | 409,553 | 123,845 | 148,322 | 10,271 | 98,355 | 28,760 | 30,568 | 50,301 | 75,428 | 79,347 | 114,902 | 42,084 | 8,060 | 5,414 | 2,193 | 1,256 |
| | | 復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合) | | | | | 156,297 (38.2%) | | | 236,333 (57.8%) | | | 16,923 (4.1%) | | | |
| (H26.12.31現在) | 409,707 | 124,812 | 145,747 | 11,234 | 98,662 | 29,252 | 30,568 | 50,290 | 75,528 | 120,608 | 86,393 | 27,571 | 9,581 | 5,911 | 1,991 | 1,266 |
| | | 復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合) | | | | | 156,386 (38.2%) | | | 234,572 (57.3%) | | | 18,749 (4.6%) | | | |

★事業費による進捗状況 (平成23年度～平成26年度) → : 235,644百万円 ÷ 総事業費 : 409,553百万円 = 57.5%

■ 主な事業

| ① 市民生活の復興 | ② 産業・経済の復興 | ③ 都市基盤の復興 | ④ 防災まちづくり |
|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| ・ 災害廃棄物処理事業 458億円 | ・ 漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設) 728億円 | ・ 港湾施設復旧事業 376億円 | ・ 再生可能エネルギー導入促進事業 60億円 |
| ・ 防災集団移転促進事業 255億円 | ・ 共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円 | ・ 湾口防波堤復旧事業 200億円 | ・ 消防救急無線施設・設備整備事業 14億円 |
| ・ 災害公営住宅整備事業 171億円 | ・ 水産業共同利用施設復興整備事業 85億円 | ・ 土地区画整理事業 179億円 | ・ 防災行政無線整備事業 11億円 |
