
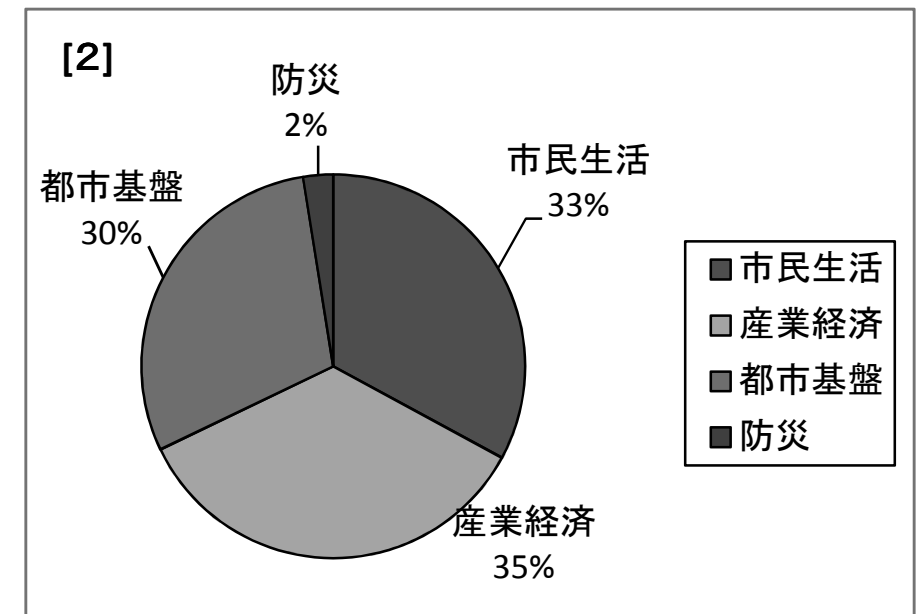


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成25年12月31日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	3
検討中	10
着手済	192
実施済	53
整理・統合等	14
計	272

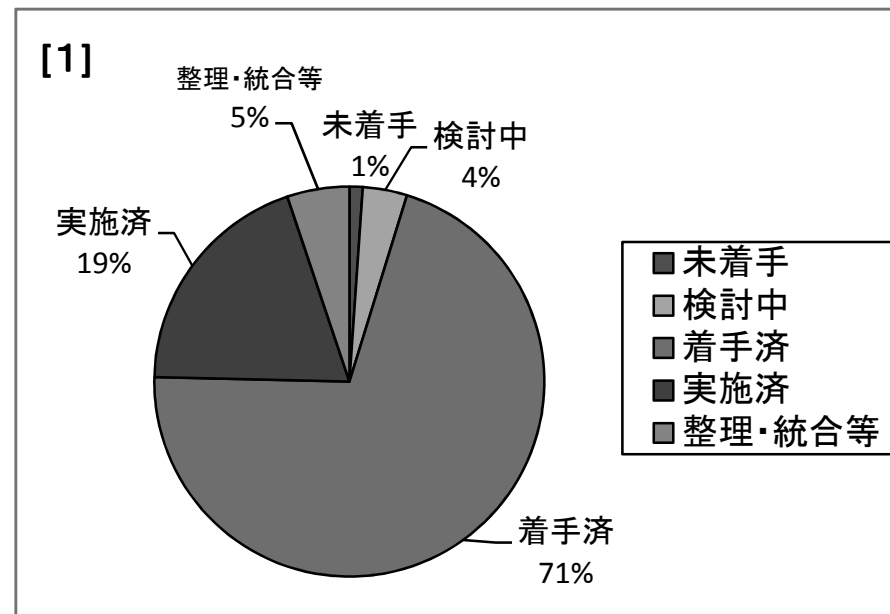

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	136,876	50,990	21,751	3,520	47,638	12,977	18,017	21,640	31,669	31,852	29,265	1,819	1,035	1,035	272	272
産業・経済の復興	145,429	52,305	67,138	3,310	12,698	9,978	9,721	16,482	65,556	26,076	24,907	615	672	469	467	464
都市基盤の復興	123,123	28,396	54,740	4,975	27,420	7,592	3,919	10,384	22,579	34,304	33,588	9,331	5,065	2,495	1,168	290
防災まちづくり	10,517	2,397	6	107	6,293	1,714	131	2,151	2,777	4,814	340	95	51	51	51	56
合計	415,945	134,088	143,635	11,912	94,049	32,261	31,788	50,657	122,581	97,046	88,100	11,860	6,823	4,050	1,958	1,082
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					205,026 (49.3%)			197,006 (47.4%)			13,913 (3.3%)			
(H25.9.30現在)	424,861	132,322	142,799	14,094	105,495	30,151	32,881	49,440	131,238	96,375	81,234	15,243	11,378	4,044	1,951	1,077
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					213,559 (50.3%)			192,852 (45.4%)			18,450 (4.3%)			

★事業費による進捗状況→(平成23年度事業費+平成24年度事業費) : 82,445百万円/総事業費 : 415,945百万円=19.8%

■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 473億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 698億円	・港湾施設復旧事業 335億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 258億円	・水産物等残渣処理事業 121億円	・湾口防波堤復旧事業 200億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・災害公営住宅整備事業 173億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・土地区画整理事業 168億円	・防災行政無線整備事業 11億円
