
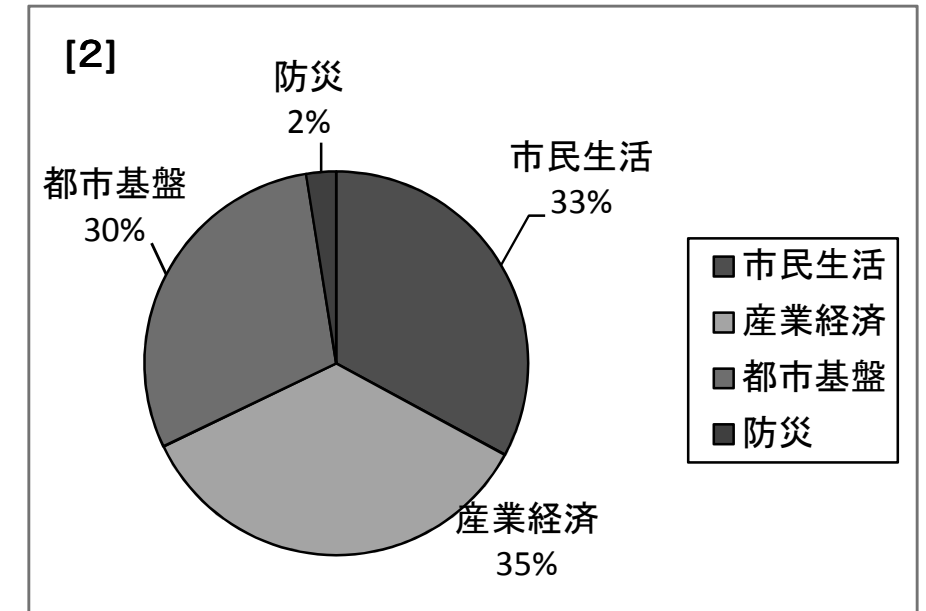


# 大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成25年12月31日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	3
検討中	10
着手済	192
実施済	53
整理・統合等	14
計	272

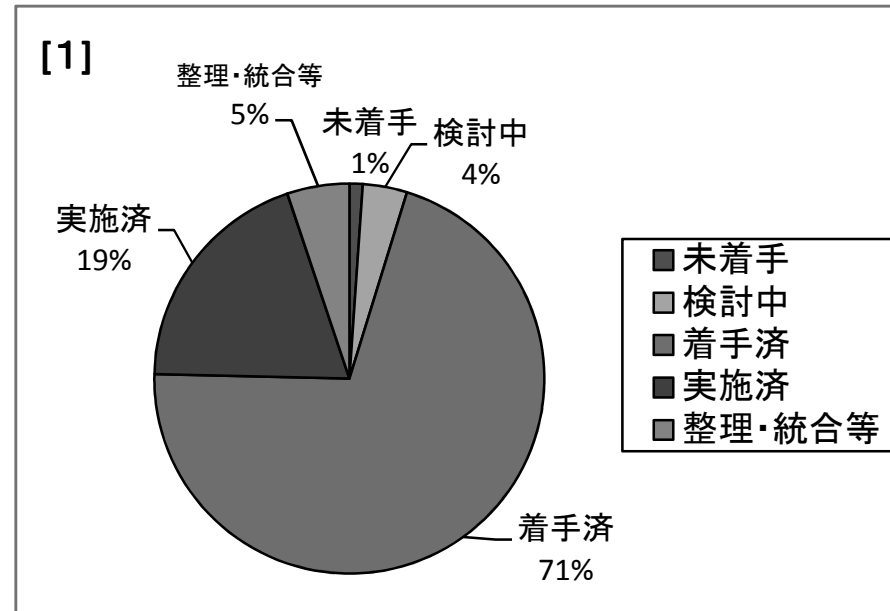

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	136,876	50,990	21,751	3,520	47,638	12,977	18,017	21,640	31,669	31,852	29,265	1,819	1,035	1,035	272	272
産業・経済の復興	145,429	52,305	67,138	3,310	12,698	9,978	9,721	16,482	65,556	26,076	24,907	615	672	469	467	464
都市基盤の復興	123,123	28,396	54,740	4,975	27,420	7,592	3,919	10,384	22,579	34,304	33,588	9,331	5,065	2,495	1,168	290
防災まちづくり	10,517	2,397	6	107	6,293	1,714	131	2,151	2,777	4,814	340	95	51	51	51	56
合計	415,945	134,088	143,635	11,912	94,049	32,261	31,788	50,657	122,581	97,046	88,100	11,860	6,823	4,050	1,958	1,082
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					205,026 (49.3%)			197,006 (47.4%)			13,913 (3.3%)			
(H25.9.30現在)	424,861	132,322	142,799	14,094	105,495	30,151	32,881	49,440	131,238	96,375	81,234	15,243	11,378	4,044	1,951	1,077
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					213,559 (50.3%)			192,852 (45.4%)			18,450 (4.3%)			


★事業費による進捗状況→(平成23年度事業費+平成24年度事業費) : 82,445百万円/総事業費 : 415,945百万円=19.8%

## ■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 473億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 698億円	・港湾施設復旧事業 335億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 258億円	・水産物等残渣処理事業 121億円	・湾口防波堤復旧事業 200億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・災害公営住宅整備事業 173億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・土地区画整理事業 168億円	・防災行政無線整備事業 11億円


①市民生活の復興

進捗状況	事業数
未着手	0
検討中	2
着手済	61
実施済	14
整理・統合等	0
計	77

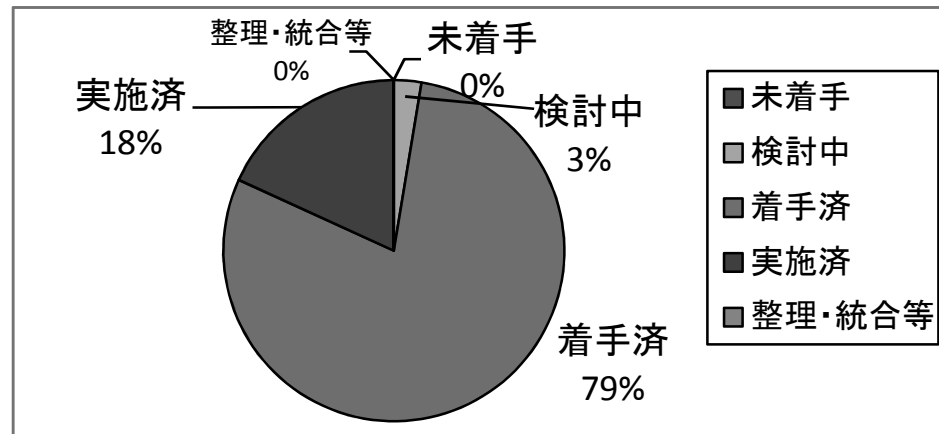


②産業・経済の復興

進捗状況	事業数
未着手	0
検討中	2
着手済	73
実施済	21
整理・統合等	12
計	108

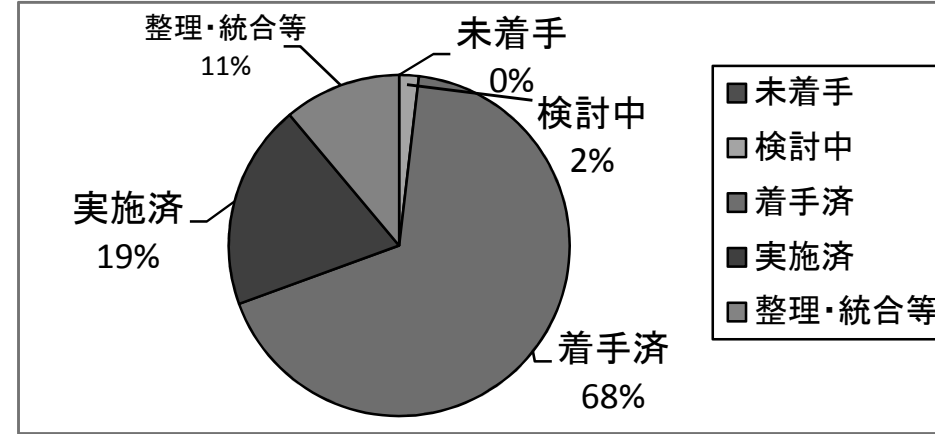


③都市基盤の復興

進捗状況	事業数
未着手	2
検討中	2
着手済	31
実施済	9
整理・統合等	1
計	45

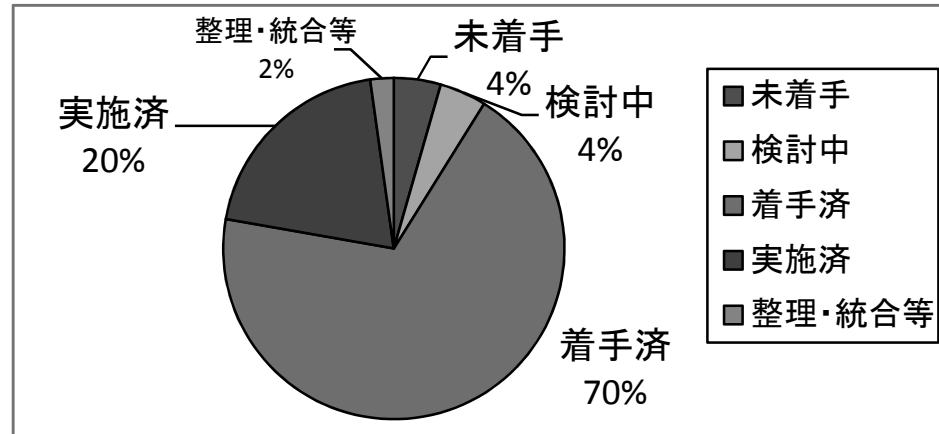


④防災まちづくり

進捗状況	事業数
未着手	1
検討中	4
着手済	27
実施済	9
整理・統合等	1
計	42

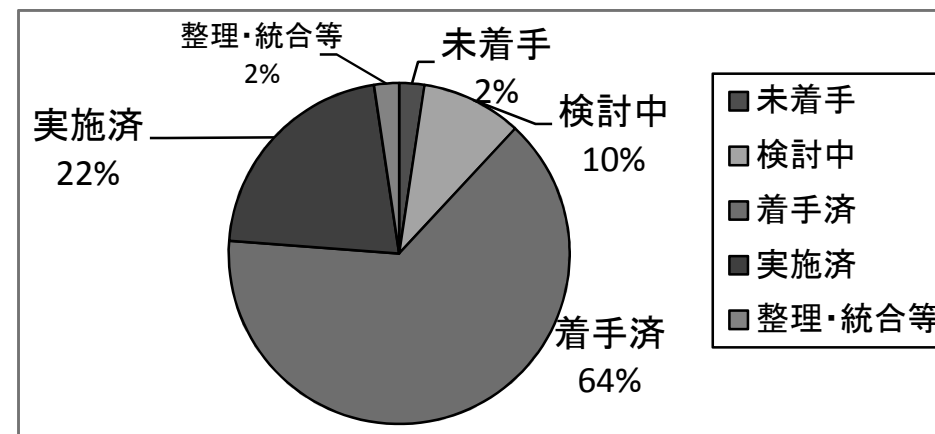

## 復興計画事業進捗状況

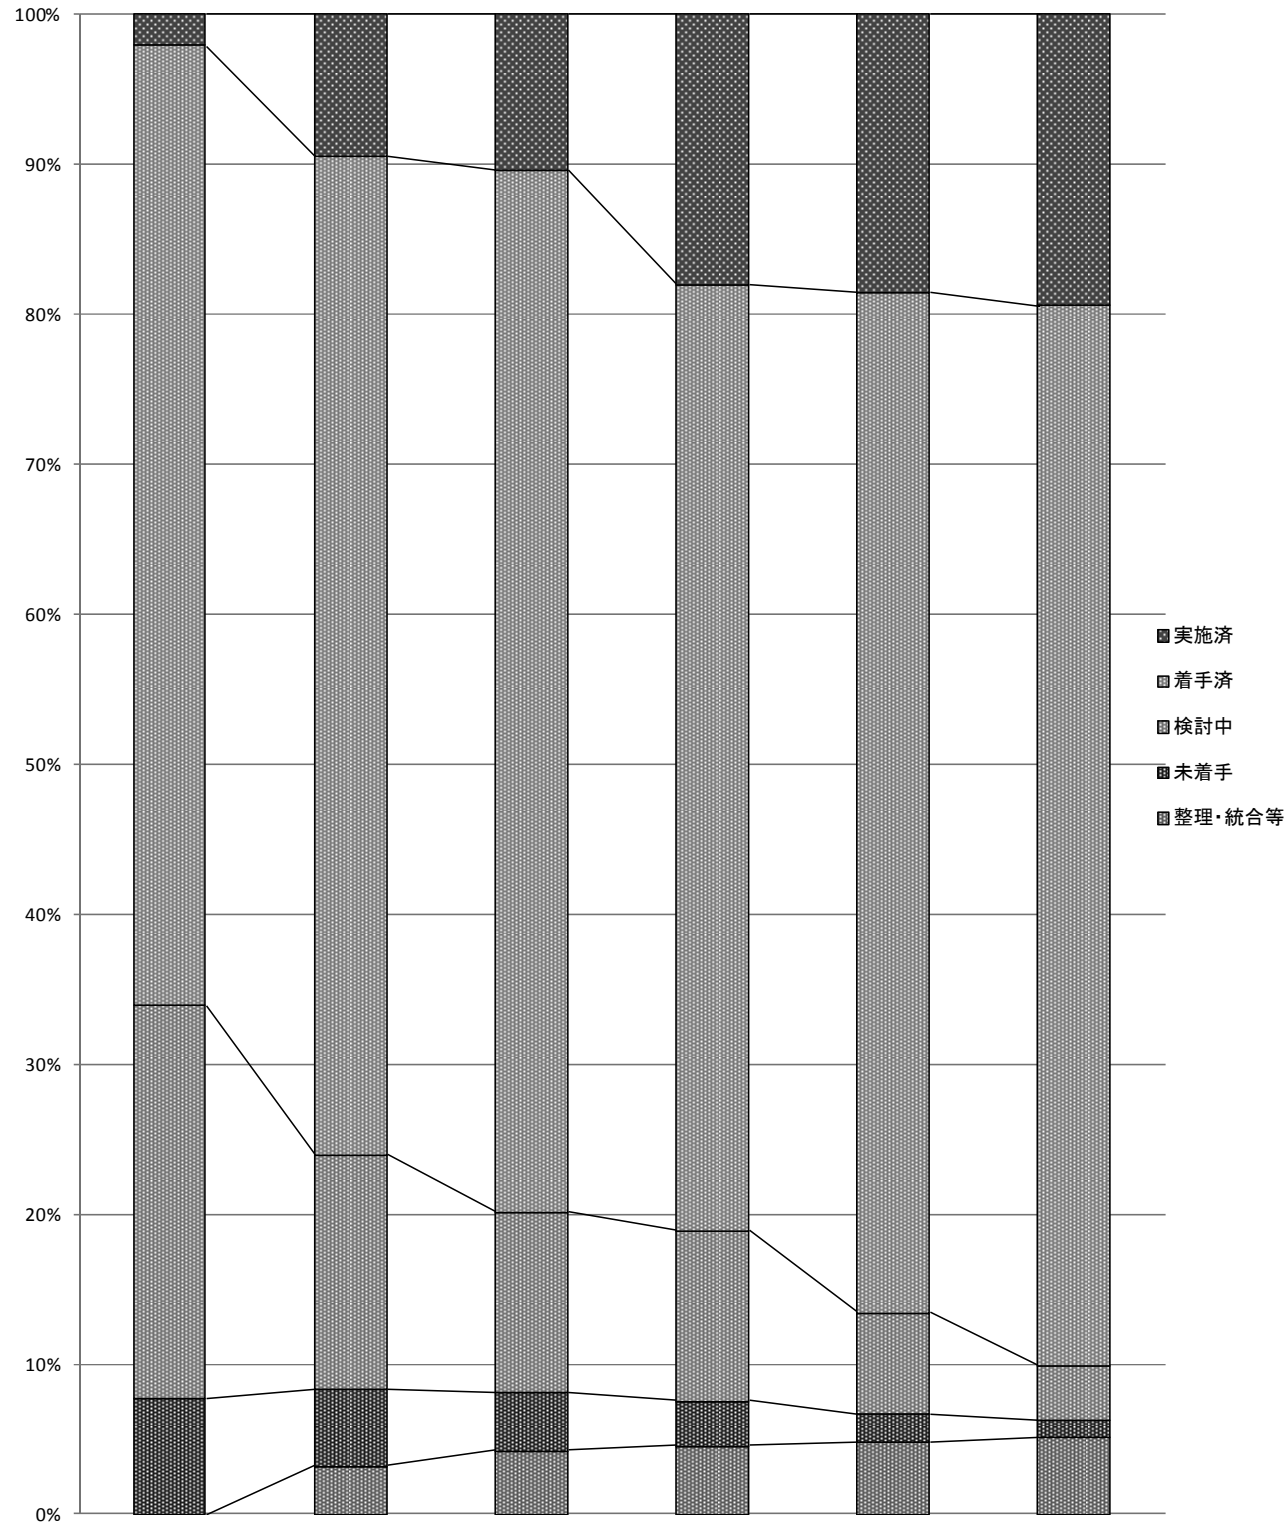

	平成24年1月12日		6月30日		12月31日		平成25年3月31日		9月30日		12月31日	
	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合	事業数	割合
実施済	5	2%	24	10%	27	11%	48	18%	50	18%	53	19%
着手済	149	64%	167	66%	179	69%	167	63%	183	68%	192	71%
検討中	61	26%	39	16%	31	12%	30	11%	18	7%	10	4%
未着手	18	8%	13	5%	10	4%	8	3%	5	2%	3	1%
整理・統合等	0	0%	8	3%	11	4%	12	5%	13	5%	14	5%
合計	233	100%	251	100%	258	100%	265	100%	269	100%	272	100%

## 復興計画事業一覧

- 復興計画事業は、実施優先度により次の3種類に分類しています。  
→ 事業番号の下に該当する表示を記載しています。

  - ◎：緊急に実施する事業
  - ：急いで実施する事業
  - △：通常ペースで実施する事業
- 復興計画策定後、新たに復興計画事業とした事業（復興計画策定時に掲載していない事業）については、当該事業欄全体を網かけ表示しています。  
また、当該事業のうち、前回作成時（平成25年9月30日現在）以後に掲載した事業には事業番号欄に「新」、それ以外の事業については「追○」（○は番号）と記載しています。
- 事業の進捗状況区分は、次のとおりです。

  - 未着手：事業実施の見通しが立たないもの
  - 検討中：事業実施に向け、準備段階のもの
  - 着手済：事業に着手し、実施中のもの
  - 実施済：すでに事業が終了したもの
  - 整理・統合等：他事業との統合やその他の事情により、事業を実施しなかったもの
- 復興交付金が配分されている事業については、「復興交付金」欄に次のように記載しています。

  - 有：基幹事業として配分されている場合
  - ※有：効果促進事業として配分されている場合
- 前回作成時（平成25年9月30日現在）以後における、進捗状況に係る主な変更箇所については、下線を付してあります。



事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
施策ウ 住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどにより、津波などの災害にあわない安全な居住環境を整えます。																									
7 ◎	防災集団移転促進事業		市	H23~H28	着手済	有	【現状】 ・市内各地で対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中 ・復興交付金配分決定及び大臣同意取得済地区…21地区(事業実施予定全地区) ・9地区(泊地区、小細浦地区、田浜地区、門之浜地区、港・岩崎地区、細浦地区、佐野地区、清水地区、浦浜南地区)において移転住宅団地整備工事に着手済→うち1地区(小細浦地区)において工事終了(泊地区は平成26年1月終了) 【課題】 ・事業の早期実施	25,841,591															集団移転課		
8 △	がけ地近接等危険住宅移転事業		市	H24~H27	着手済	有	【現状】 ・申請受付件数:1件(平成25年12月末現在) 【課題】 ・災害に強いまちづくりの手法として、本事業の早期本格運用と適切な周知を図る必要がある	1,007,796	10,850	5,425		736,875	254,646		826	54,220	481,150	471,600					住宅公園課		
9 ○	漁村集落復興事業		市	H23~H32	着手済	有	【現状】 ・浦浜地区(一部地域)は、基本計画策定業務実施中(測量調査と基本設計は終了)→実施設計作成業務委託予定(平成26年4月) ・浦浜地区(上記地域を除く)、崎浜地区及び綾里地区は、基本計画策定業務を委託予定(平成26年1月) 【課題】 ・導入地区について検討する必要がある	14,130,000				10,597,500	3,532,500			30,000	1,000,000	13,100,000					水産課		
施策エ 住宅移転(市内)希望者への支援を行います。																									
10 △	市民相談事業		市など	H23~	着手済		【現状】 ・各種相談を受付中 ・平成24年度から法律相談の実施回数を月1回から2回に増加 【課題】 ・関係機関との連携により、市民ニーズの変化に対応した相談機会の確保と情報提供を図る必要がある	14,244				2,400	11,844		852	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	市民生活環境課
11 △	総合的被災者相談支援事業		県	H23~H28	着手済		【現状】 ・各種相談を受付中(相談員のほかに各種専門家も配置) ・巡回・出張相談を適宜開催 【課題】 ・相談ニーズの変化に対応した専門家の配置 ・潜在的な需要に対応する体制の確保	19,968		19,968					5,700	8,500	5,768							市民生活環境課	













事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
34 ◎ 北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパス内施設(体育館、グラウンドなど)や設備(海水ポンプ、水槽施設など)の利用を積極的に促進	市	H23~	着手済		【現状】 ・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・特になし																	北里大学再開推進室	
施策イ 災害に強い教育施設を整備します。																								
35 ◎ 学校再開事業	赤崎小学校、越喜来小学校及び崎浜小学校の隣接校への移転、赤崎中学校の移転及び合同授業による学校の再開	市	H23	実施済		【現状】 ・赤崎小学校は蛸ノ浦小学校で合同授業を実施中 ・越喜来小学校は旧甫嶺小学校に移転 ・赤崎中学校は仮設校舎で再開済 【課題】 ・特になし	63,705	29,050				18,130	16,525	2,000	61,705									学校教育課
36 ◎ 通学支援バス運行事業	被災した小中学校の児童・生徒が他校へ通学するためのスクールバスの運行	市	H23~H27	着手済		【現状】 ・赤崎小学校を蛸ノ浦小学校へ、赤崎中学校を仮設校舎へ通学させるためのスクールバスを運行している 【課題】 ・特になし	93,239						38,856	21,000	16,676	19,353	18,335	17,875						学校教育課
37 ◎ 被災学校移転改築事業	津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	H23~H27	着手済	有 ※有	【現状】 ・3校とも建設委員会を設置済 ・越喜来小学校は、移転先の埋蔵文化財調査と詳細設計を終了 ・他の2校は詳細設計を実施中 【課題】 ・造成工事により発生する大量の土砂の処理	9,947,203	4,509,398				2,228,172	3,209,633		118,470	879,498	4,860,835	4,088,400						生涯学習課
38 ◎ 被災学校復旧事業(津波)	津波により被災した大船渡小学校及び綾里小学校の補修	市	H23~H25	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	187,098	124,732					62,366	103,518	43,155	40,425								生涯学習課
39 ◎ 被災学校復旧事業(地震)	地震により被災した日頃市小学校、第一中学校、末崎中学校及び越喜来中学校の補修	市	H23	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	69,435	40,780					28,655	55,195	14,240									生涯学習課
40 ◎ 被災給食施設復旧事業	被災した赤崎学校給食共同調理場の復旧と併せた北部学校給食センターの整備	市	H23~H25	着手済	有 ※有	【現状】 ・平成25年7月に北部学校給食センターの建設工事に着手 【課題】 ・円滑な事業推進	957,437	25,330			676,100	68,177	187,830		26,759	930,678							生涯学習課	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
41 ◎ 学校施設防災機能強化事業	旧耐震基準の学校施設の耐震補強工事などを実施 ・盛小学校:屋内運動場 ・末崎小学校:校舎 ・蛸ノ浦小学校:校舎、屋内運動場 ・猪川小学校:校舎、屋内運動場 ・日頃市小学校:校舎、屋内運動場 ・大船渡北小学校:校舎、屋内運動場 ・綾里小学校:屋内運動場 ・第一中学校:屋内運動場 ・綾里中学校:校舎 ・越喜来中学校:校舎、屋内運動場	市	H23~H30	検討中		【現状】 ・事業化に向けて検討中 ・事業予定期間を短縮して実施 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある	2,877,600	828,500	1,434,000			615,100				400,000	659,600	291,600	763,200	763,200				生涯学習課
42 ◎ 認定こども園整備事業	震災の影響により工事中止となった綾里こども園舎の整備	市	H23~H25	着手済		【現状】 ・工事終了(平成26年1月) 【課題】 ・特になし	295,062		277,200			17,862		15,721	279,341									生涯学習課
施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。																								
追 12 ◎ 仮設校庭整備事業	応急仮設住宅が建設されている学校における代替グラウンドなどの整備 9校(盛小、末崎小、蛸ノ浦小、猪川小、大船渡北小、第一中、大船渡中、末崎中、綾里中)	市	H24~H27	着手済	※有	【現状】 ・平成24年度:大船渡中学校の仮設テニスコート整備済 ・平成25年度:赤崎中学校の仮設テニスコート整備済、第一中学校、末崎中学校、盛小学校、大船渡北小学校及び猪川小学校の仮設グラウンド整備中 ・赤崎小学校及び末崎小学校については、民間支援により仮設グラウンド整備済 【課題】 ・学校近接地での用地確保	166,474					104,563	61,911		2,740	157,000	6,734							生涯学習課
追 13 ◎ 被災校等体育部活動支援バス運行事業	応急仮設住宅が建設されている学校において、体育や部活動のために校外に移動する児童・生徒の輸送バスを運行 ・市内移動バス:小中学校の体育や部活動に要するバスを運行 ・市外移動バス:中学校の部活動のために市外に移動するバスを運行	市	H25~H27	着手済	※有	【現状】 ・市内輸送業者などに業務委託のうえ実施中 【課題】 ・受託事業者の安定的な確保	64,920									21,640	21,640	21,640					学校教育課	
43 ◎ 児童生徒就学援助事業(被災対応)	被災した児童・生徒の保護者へ就学費用の一部を補助	市	H23~H26	着手済		【現状】 ・家屋被災、失職世帯などを準要保護世帯とみなし、就学費用の一部を補助している 【課題】 ・特になし	267,415		267,415					69,652	68,759	68,000	61,004						学校教育課	







事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
◎ リアスホール修繕事業【再掲】	地震被害を受けた市民文化会館・図書館の施設の修繕	市	H23	実施済		【現状】 ・修繕済であり、平成23年10月1日より通常開館している 【課題】 ・特になし																		市民文化会館	
61 △ 市民芸術祭開催事業	市民芸術祭を復活し、復興祈念事業として開催	実行委員会	H24~H32	着手済		【現状】 ・平成25年度はリアスホールを主会場として、10月から12月に開催 【課題】 ・市民体育館(震災前の主会場)の復旧後において、復興祈念事業として取り組む必要がある	5,430					5,430	1,300	1,300	1,300	1,530									生涯学習課
62 ○ 指定文化財復旧事業	被災した郷土芸能装束などの指定文化財の修復	市	H23~H25	実施済		【現状】 ・他団体からの支援を受け、装束などの復旧を進めた 【課題】 ・特になし	114					114	72	42											生涯学習課
63 △ 芸術文化創作活動支援事業	団体などによる芸術文化活動の活性化を図るため、展示会や発表会、作品集の刊行などの創作活動に対し補助	大船渡市芸術文化協会	H23~	着手済		【現状】 ・3団体が補助金交付申請済であり、引き続き事業利用団体を募集中 【課題】 ・事業の周知及び利用拡大	871					871	173	198	250	250									生涯学習課









事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
26 ◎	水産業共同利用施設復旧支援事業(漁協、水産加工業協同組合など)	漁協、水産加工業協同組合など	H23～H26	着手済		【現状】 ・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中(平成23年度繰越分、平成24年度繰越分及び平成25年度新規分) 【課題】 ・早期に事業を推進する必要がある	2,280,060	1,519,981	372,031																水産課
追2 ◎	水産業共同利用施設復興整備事業	民間団体	H24～H26	着手済	有 ※有	【現状】 ・平成24年度認定事業計画数:47件 ・平成25年6月に事業実施団体を公募(平成26年1月に事業計画認定予定) 【課題】 ・事業を早期かつ適正に実施する必要がある	8,440,000																		水産課
方針② 産業基盤を再建します。																									
施策ア 被災した各種産業の生産基盤などを早期に復旧します。																									
27 ○	コンテナ定期航路再開事業	県・市関係団体関係企業	H23～H25	実施済		【現状】 ・国・県の助成により荷役機械を修繕済 ・平成25年9月から国際フィーダーコンテナ定期航路開設 【課題】 ・他港へシフトした荷物の呼び戻し ・開設航路の安定運営	374,998	164,116	150,994																港湾経済課
追3 ○	共同利用コンテナ用上屋整備事業	市	H25	着手済		【現状】 ・平成25年9月に本事業及び下記(追4)事業を包含したプロジェクトの実施に係る関係機関による調印式を開催 ・上屋整備に係る設計業務に着手済 【課題】 ・各種災害復旧工事の関係で埠頭場が使用中のため、工事実施にあたっては関係機関との調整が必要になる	364,340																		港湾経済課
追4 ○	コンテナヤード附帯設備等整備事業	大船渡国際港湾ターミナル協同組合	H24～H25	着手済		【現状】 ・コンテナヤード上の立地場所などについて検討中 ・コンテナ運搬用トレーラー及びフォークリフト納品済 ・管理棟完成 【課題】 ・一部施設の復旧	277,050																		港湾経済課
28 ○	港湾利活用推進事業	県	H23～	着手済		【現状】 ・ソーラス関連の一部保安施設は、暫定供用中 ・平成25年度に本格復旧工事に着手 【課題】 ・早期復旧に向け、国・県に要望を継続する必要がある	406,250		406,250																港湾経済課
施策イ 基盤整備にあたっては、建築物の構造強化や電源対策の推進など、防災機能の向上に配慮するほか、重要施設などへの重点・優先投資を行います。																									
29 ○	津波被災地域建築物安全対策事業	市	H23～	着手済	有 ※有	【現状】 ・土地利用計画や防災集団移転促進事業と調整を図りながら、津波浸水シミュレーションに基づく災害危険区域設定の考え方、規制内容などを周知 ・災害危険区域に係る条例を制定(平成25年4月1日施行)→区域告示に向けて9月から地区別説明会を開催→告示予定の27地区中18地区で説明会を開催し、15地区において告示済 【課題】 ・規制区域住民などへの周知と理解促進	103,677																		土地利用課





事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
施策オ 水産関連施設の防災機能の向上を図るほか、集約化などにより効果的に整備します。																						
42 ◎	漁港関係施設等復旧事業	被災した漁船、漁港などへの漂着物などの撤去、ガレキ処分	市	H23～H25	整理・統合等	【現状】 ・No.49海上ガレキ処理事業に統合 【課題】																水産課
43 ○	漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)	被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧 県管理:門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港) 市管理:碓石、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港)	県・市	H23～H27	着手済	【現状】 ・市内全22漁港(県営:6、市営:16)の本復旧事業に着手 ・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は88%→施設全部の使用を開始した施設は42施設(一部の使用を開始した施設を含めると54施設) 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある	69,859,060	25,653,517	44,205,543													水産課
44 ◎	漁港関係施設等災害復旧事業(漁業集落排水施設)	被災した漁業集落排水施設(処理場・管路など)の復旧 ・蛸ノ浦地区、砂子浜地区、小石浜地区、根白地区、千歳地区(5地区)	市	H23～H24	実施済	【現状】 ・本復旧工事終了 【課題】 ・特になし	619,851	549,801		6,000												水産課
追6 ◎	漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碓石の市営全16漁港の用地のかさ上げ	市	H24～H27	着手済	有 【現状】 ・測量・設計委託業務終了 ・全16漁港のうち11漁港で工事着手→2漁港(扇洞、碓石)が終了 ・未着手の漁港も災害復旧工事の進捗に合わせて随時発注予定 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要	920,000															水産課
◎	水産業経営基盤復旧支援事業【再掲】	漁協などによる養殖施設などの共同利用施設の一括整備に対する補助	漁協	H23～H26	着手済	【現状】 ・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中(平成23年度繰越分、平成24年度繰越分及び平成25年度新規分) 【課題】 ・早期に事業を推進する必要がある																水産課
45 ◎	さけ・ます生産地震災害復旧緊急支援事業	さけの種苗生産及び放流体制を回復させるため、漁協が運営するさけ・ますふ化場の整備に対する補助	漁協	H23～H26	着手済	【現状】 ・さけます生産施設復旧支援事業は終了 ・さけます種苗生産施設等復興支援事業は、平成23年度繰越分と平成24年度分が終了→平成25年度分:県と補助金交付契約を締結 【課題】 ・整備した施設の適正管理	358,705	239,133	39,851													水産課
46 ○	アワビの里復旧事業	つくり育てる漁業を推進するため、津波により被災したアワビ生産センターを復旧	市	H26～H27	検討中	【現状】 ・アワビ生産センター復旧の方向性を関係者と検討中 【課題】 ・具体的な今後の方向性	500,000	333,000		167,000											500,000	水産課
◎	水産業共同利用施設復旧支援事業(漁協、水産加工業協同組合など)【再掲】	漁協や水産加工業協同組合などが有する共同利用施設の早期復旧、再開に必要な機器などの整備や施設修繕に対する補助	漁協、水産加工業協同組合など	H23～H26	着手済	【現状】 ・各事業実施主体でそれぞれ事業実施中(平成23年度繰越分、平成24年度繰越分及び平成25年度新規分) 【課題】 ・早期に事業を推進する必要がある																水産課







事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
57 ◎	被災農家経営再開支援事業	地域復興組合	H23~H25	着手済		【現状】 ・平成23年度は吉浜、合足、田浜の3地域で復興組合を設立して事業実施済 ・平成24年度は吉浜地域と合足地域で事業実施済 ・平成25年度は吉浜地域で事業実施中 【課題】 ・特になし	26,993	26,993																農林課
58 ◎	小規模農地等災害復旧事業(県単独事業)	市 受益農家	H23	整理・統合等		【現状】 ・被災農地の被害状況を調査した結果、事業該当箇所なし 【課題】																		農林課
59 ◎	被災農地小規模災害復旧事業(市単独事業)	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・事業終了 【課題】 ・特になし	3,534				3,534	1,424	2,110											農林課
60 △	中山間地域総合整備事業	県	H23~H29	整理・統合等		【現状】 ・No.55農用地災害復旧関連区画整理事業(復興基盤総合整備事業)に統合 【課題】																		農林課
61 △	三陸みらい園芸産地づくり交付金事業	農業者で組織する団体など 市農協	H24~H26	整理・統合等		【現状】 ・県において要綱が決定 ・市においては該当なし 【課題】																		農林課
62 ○	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	市農協	H24~H25	着手済	有	【現状】 ・平成24年度分は事業終了 ・平成25年度分は着手済 【課題】 ・特になし	214,450	143,688						114,450	100,000									農林課
追8 ○	岩手県特用林産施設等体制整備事業	市農協	H23~H24	実施済		【現状】 ・事業終了 【課題】 ・特になし	65,202	31,048	12,073															農林課
63 ◎	海岸保全施設災害復旧事業	県	H23~H27	着手済		【現状】 ・沖田：防潮堤復旧工事終了 ・吉浜、合足：防潮堤復旧工事に着手済(応急堤防工事は終了) 【課題】 ・吉浜海岸防潮林用地の取得	5,196,045		5,196,045					127,455	40,001	459,000	1,414,000	3,155,589						農林課
◎	防災集団移転促進事業【再掲】	市	H23~H28	着手済	有	【現状】 ・市内各地で対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中 ・復興交付金配分決定及び大臣同意取得済地区…21地区(事業実施予定全地区) ・9地区(泊地区、小細浦地区、田浜地区、門之浜地区、港・岩崎地区、細浦地区、佐野地区、清水地区、浦浜南地区)において移転住宅団地整備工事に着手済→うち1地区(小細浦地区)において工事終了(泊地区は平成26年1月終了) 【課題】 ・事業の早期実施																		集団移転課



事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
74 ◎	中小企業被災資産 修繕補助事業	市	H23～H25	着手済		【現状】 ・補助対象事業所:42事業所(平成25年12月末現在) 【課題】 ・適切な補助対象の検討	243,964		121,982														商業観光課	
追9 ◎	中小企業被災資産 復旧補助事業	市	H24～H26	着手済		【現状】 ・平成24年度は→補助対象事業所:68事業所 ・平成25年度第1回受付(4月～5月)→申請件数:9事業所、補助限度額の見直しによる追加申請:26事業所 ・平成25年度第2回受付(10月～11月)→申請件数:8事業所 【課題】 ・財源の確保	796,048		398,020		398,020	8		126,826	469,214	200,008								商業観光課
◎	仮設店舗等貸与事業【再掲】	中小企業基盤整備機構 市	H23～	着手済		【現状】 ・80カ所493区画の整備を実施中(平成25年12月末現在) ・完成した施設から随時営業を開始 ・仮設施設の撤去などに係る基本方針を策定(平成25年12月) 【課題】 ・仮設施設撤去に係る財源確保 ・施設譲渡に係る事務調整(建築確認)																	商業観光課	
75 ◎	多機能型複合施設 整備事業	事業者 市	H23～H25	整理・統合等		【現状】 ・ある資金支援に応募するも採択されず、越喜来地区復興委員会としても施設解体に同意 【課題】																	保健介護センター	
施策イ 被災した商店街については、防災機能や利便性の向上などを考慮して再整備されるよう支援します。																								
△	津波避難ビル等の 指定【再掲】	市	H23～	検討中		【現状】 ・高台への迅速な避難を基本とし、津波浸水区域内の土地利用が具体化した時点で避難困難地域の設定について検討する ・大船渡地区津波復興拠点整備事業により整備される施設の指定について検討中 【課題】 ・浸水区域の復興状況を踏まえて検討する必要がある																	防災管理室	
追 ◎	大船渡駅周辺の産業 誘致・振興に向けた調査事業【再掲】	市	H24	実施済	※有	【現状】 ・事業終了 【課題】 ・津波復興拠点整備事業への反映 ・民間事業者との共通理解																	環境未来都市推進室	
方針⑥ 観光産業の早期再建を図ります。 施策ア 被災した観光資源・施設を復旧します。																								
76 △	大船渡市観光物産 協会運営支援事業	市	H23～	着手済		【現状】 ・補助金を交付し、誘客事業などを支援 【課題】 ・被災流失した事務所の早期整備 ・協会の法人化	110,600						110,600	11,300	11,300	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	商業観光課
77 ○	観光施設整備事業	市	H23～	整理・統合等		【現状】 ・No.81国立公園の再編事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン振興)に統合 【課題】																	商業観光課	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課	
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度		
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源
78 ○	東北沿岸地域観光力強化支援事業	県	H23～	着手済		【現状】 ・中核コーディネーターを1人配置済 ・JR、三陸鉄道合同による「駅-1グルメ」を企画・実施 【課題】 ・事業の周知と関係機関との調整を図る必要がある																	商業観光課
施策イ 観光関連イベントを復活するほか、復興に係るキャンペーンを実施します。																							
79 ○	いわてデスティネーションキャンペーン推進事業	推進協議会	H23～H25	実施済		【現状】 ・平成23年度はプレキャンペーンを実施 ・平成24年4月から6月まで、各種宣伝・誘客事業及び受入態勢事業実施(期間中の県内観光客数は約736万8千人) ・平成25年度から推進協議会の名称を変更し、「岩手観光キャンペーン推進協議会」として事業を継続 【課題】 ・JR大船渡線の復旧と旅行者の二次交通の確保(現在:BRTによる代替交通)	2,395					1,531	745	119									商業観光課
80 △	未知の奥・平泉観光振興事業	県	H23～	着手済		【現状】 ・平成23年7月から首都圏JR駅などにポスターを掲示 ・平成24年度以降は、上記いわてDCを通じて総合的に実施 【課題】 ・平泉町から当市への誘客、移動手段の確保																	商業観光課
81 △	国立公園の再編事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興)	国	H23～	着手済		【現状】 ・平成25年5月に三陸復興国立公園が創設 ・環境省による「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」計画に基づき、基石集団施設地区園地・野営場の整備に着手済 【課題】 ・再編・整備事業に関する関係機関との調整	621,000	621,000				35,000	226,000	360,000									商業観光課
82 △	三陸海岸長距離歩道整備事業(三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興)	国	H24～	着手済		【現状】 ・国において整備中 ・平成25年11月に八戸市から久慈市まで開通 【課題】 ・既存の遊歩道の有効活用																	商業観光課
施策ウ 農漁業体験などによる新たな観光振興を図ります。																							
追 10 ○	観光資源調査開発事業	市	H24～H25	着手済	※有	【現状】 ・大船渡ブランドブックを作成中 【課題】 ・意見などの的確な反映 ・事業成果の継承	17,430							17,430									商業観光課
新 ○	観光振興ビジョン策定事業	市	H25	着手済	※有	【現状】 ・アンケート調査(意識調査)を実施済→取りまとめ中 【課題】 ・意見などの的確な反映 ・事業成果の継承	28,140							28,140									商業観光課
83 △	体験インストラクター養成事業	市	H24～	着手済		【現状】 ・県などが開催する研修会に体験提供者などを派遣 【課題】 ・インストラクター候補者の高齢化	300								100	100	100						商業観光課



事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
90 ◎ 中小企業融資補給事業	融資を利用した中小企業者へ保証料及び利子を補給 ・中小企業融資保証料の負担 ・中小企業融資利子補給の実施	市	H23～	着手済		【現状】 ・市融資制度利用事業所へ1.5%の利子補給を実施 【課題】 ・融資制度利用の周知	803,063					78,823	54,440	88,000	95,800	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	商業観光課	
◎ 中小企業被災資産修繕補助事業【再掲】	中小企業の現有店舗・工場などの修繕に対する補助 ・対象事業者:被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など ・対象経費:災害復旧に伴う修繕に要する経費 ・補助率:1/2以内の額	市	H23～H25	着手済		【現状】 ・補助対象事業所:42事業所(平成25年12月末現在) 【課題】 ・適切な補助対象の検討																		商業観光課	
追9 ◎ 中小企業被災資産復旧補助事業【再掲】	中小企業の滅失した店舗・工場などの復旧に対する補助 ・対象事業者:被災した沿岸地域の中小小売業者、サービス業者など ・対象経費:被災資産・設備などの復旧に要する経費 ・補助率:1/2以内の額	市	H24～H26	着手済		【現状】 ・平成24年度は→補助対象事業所:68事業所 ・平成25年度第1回受付(4月～5月)→申請件数:9事業所、補助限度額の見直しによる追加申請:26事業所 ・平成25年度第2回受付(10月～11月)→申請件数:8事業所 【課題】 ・財源の確保																		商業観光課	
91 ◎ 被災工場再建支援事業	被災した企業の工場などの再建に対する補助 ・被災前常用雇用者30人以上の企業 ・補助率:1/10 ・上限5,000万円(100人以上は1億円)	市	H23～H24	整理・統合等		【現状】 ・申請なし 【課題】 ・各種補助事業に該当しない事業者への支援																		商業観光課	
92 ○ 物産販路拡大事業	物産展への出品、インターネットによる周知 ・各種物産展などへ出展参加 ・インターネットによる販路拡大への支援 ・食品見本市開催 ・物産パンフレットの印刷 ・アンテナショップ設置の調査研究	市	H23～	着手済		【現状】 ・各地での各種物産展の開催や出店を展開 ・震災後、東京、名古屋、大阪をはじめ、全国各地での被災地支援イベントへ参加 【課題】 ・被災地支援などでの交流を機に販路開拓につなげる必要がある	24,686					2,437	2,410	2,410	2,969	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	商業観光課
93 ◎ 東日本大震災中小企業復旧資金利子補給事業	岩手県中小企業災害復旧資金を借り受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付 ・貸付利率 3年以内:年1.7%以内(固定) 3年～10年以内:年1.9%以内(固定)	市	H23～H34	着手済		【現状】 ・利子補給承認額:64,348千円 ・申請件数:106件(平成23年度～平成25年3月末現在) 【課題】 ・制度利用の周知	79,732					1,522	13,110	13,000	10,800	11,200	9,500	7,700	6,000	4,300	2,600			商業観光課	
施策イ 地場産業の連携・高度化や新たな分野での起業などを支援します。																									
94 △ いわてものづくり産業人材育成事業	県内陸地域と沿岸・県北地域のものづくりネットワーク間の連携強化と産業集積を支える高度な産業人材の育成を支援 ・工業高校における技能士数:2,700人	県	H23～	着手済		【現状】 ・県内5つのものづくりネットワークが、各地域の工業高校の技能検定講習などをサポートしている 【課題】 ・実施状況についての情報共有																		港湾経済課	
施策ウ 北里大学など関係機関との産学官連携の取り組みを推進します。																									
◎ 北里大学海洋生命科学部早期再開促進事業【再掲】	北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスの早期再開に向けた取り組みを関係機関とともに積極的に展開	市	H23～	着手済		【現状】 ・平成25年10月に北里大学三陸キャンパス活用検討協議会を設立(今後のキャンパスの利活用について、大学、市などで検討中) ・平成25年12月の北里大学理事会において、北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターの設置(平成26年4月1日)が承認された 【課題】 ・三陸キャンパス活用促進 ・平成26年度以降の支援内容																		北里大学再開推進室	

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
95 ○	産学官連携交流促進支援事業	市	H23~	着手済		【現状】 ・平成25年度の共同研究事業(1件)について、補助金交付済 【課題】 ・北里大学と市内企業による共同研究事業の実施形態・内容について検討する必要がある	21,000					21,000	2,400	3,000	3,600	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	港湾経済課	
◎	北里大学海洋生命科学部施設利用促進事業【再掲】	市	H23~	着手済		【現状】 ・体育館やグラウンドなどの施設は、地元小・中学校や市内のスポーツ少年団が活用している 【課題】 ・特になし																		北里大学再開推進室	
96 △	三陸町養殖海域の水質調査事業	市	H23~H32	着手済		【現状】 ・平成23・24年度事業終了 ・平成25年度:夏季調査実施済 【課題】 ・北里大学海洋生命科学部との連携・協力体制の確保	9,597					9,597	903	945	945	972	972	972	972	972	972	972	972	972	水産課







事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
追1 ◎ 海岸施設災害復旧事業	被災した海岸施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸防潮堤、水門などの復旧を実施するとともに、地域住民に親しまれていた海水浴場としての砂浜を復旧 ・海岸施設:越喜来地区、下甫嶺地先	県	H23~H27	着手済		【現状】 ・海岸防潮堤高さをT.P+11.5mに設定 ・越喜来地区海岸の仮防潮堤工事は終了 ・平成25年3月に工事発注済 【課題】 ・隣接海岸災害復旧事業など関連事業との調整が必要	5,133,975		5,133,975					1,755,810	2,371,845	1,006,320									建設課
◎ 海岸保全施設災害復旧事業【再掲】	被災した農地海岸保全施設に係る応急的な復旧や、新たな基準に基づく海岸堤防の復旧・整備を実施 ・海岸保全施設:吉浜、沖田、合足	県	H23~H27	着手済		【現状】 ・沖田:防潮堤復旧工事は終了 ・吉浜、合足:防潮堤復旧工事に着手済(応急堤防工事は終了) 【課題】 ・吉浜海岸防潮林用地の取得																			農林課
○ 漁港関係施設等復旧事業(漁港施設)【再掲】	被災した防波堤・岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧 県管理:門の浜、大船渡、綾里、越喜来、崎浜、根白(6漁港) 市管理:碁石、泊里、蛸ノ浦、長崎、合足、小路、野野前、砂子浜、小石浜、鬼沢、泊、小壁、増館、吉浜、扇洞、千歳(16漁港)	県・市	H23~H27	着手済		【現状】 ・市内全22漁港(県営:6、市営:16)の本復旧事業に着手 ・市営漁港における施設数(186施設)ベースの着手率は88%→施設全部の使用を開始した施設は42施設(一部の使用を開始した施設を含めると54施設) 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある																			水産課
追 ◎ 漁港施設機能強化事業【再掲】	地盤沈下被害を受けた千歳、扇洞、吉浜、増館、小壁、泊、鬼沢、小石浜、砂子浜、野野前、小路、合足、長崎、蛸ノ浦、泊里、碁石の市営全16漁港の用地のかさ上げ	市	H24~H27	着手済	有	【現状】 ・測量・設計委託業務終了 ・全16漁港のうち11漁港で工事着手→2漁港(扇洞、碁石)が終了 ・未着手の漁港も災害復旧工事の進捗に合わせて随時発注予定 【課題】 ・災害復旧工事など関連事業との調整が必要																			水産課
施策エ 上水道・下水道を早期に復旧します。																									
11 ◎ 水道施設復旧事業	・破損配水管、給水設備などの布設替え・修理 ・破損給水設備の修理・交換 ・電気計装設備・ポンプ設備の修理・交換(上水道) ・土地区画整理事業などに伴う送配水管の布設替え ・防災集団移転促進事業で整備する住宅団地への配水管の布設など ・テレメーター設備の更新(簡易水道)	市	H23~H30	着手済		【現状】 ・応急復旧は終了 ・具体的な土地利用計画に対応した水道施設の復旧に着手する予定 【課題】 ・津波浸水区域などの具体的な土地利用が確定後、事業を実施する必要がある	3,888,632	2,766,766		28,600	923,242	170,024	155,850	175,632	438,773	780,743	1,091,080	778,200	315,000	153,354					水道事業所 簡易水道事業所

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課				
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度					
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源			
12 △	水道施設整備事業	市	H24~H32	着手済		【現状】 ・簡易水道事業分は平成24年度から、上水道事業分は平成25年度から着手済 【課題】 ・津波浸水区域などの具体的な土地利用が確定後、実施計画を検討する必要がある	2,657,557		2,179,900	12,557	465,100		2,457	195,500	240,500	525,900	457,000	584,500	402,200	124,500	125,000	水道事業所 簡易水道事業所				
13 ◎	公共下水道及び都市下水路災害復旧事業	市	H23~H25	着手済		【現状】 《大船渡浄化センター》 ・日本下水道事業団に委託して事業実施 ・生物処理は平成24年1月より開始 ・平成25年3月に本復旧工事終了 ・平成25年度：外構・周辺整備実施予定 《管渠施設》 ・流下機能に支障が生じる重大な損傷なく供用中 ・道路のかさ上げなど土地利用計画との調整を図りながら復旧を進めている 《都市下水路》 ・平成24年11月に水門工事終了 ・都市下水路復旧工事 平成24年度：実施設計 平成25年度：復旧工事施工 【課題】 ・特になし	2,012,094	1,800,311	37,100	174,683		694,527	895,467	350,600	71,500									下水道事業所		
追2 ◎	公共下水道整備事業	市	H24~H28	着手済	有 ※有	【現状】 《盛川左岸幹線推進工事》 ・平成25年7月に工事着手 《土地区画整理事業に伴う面整備》 ・協議・検討中 《新田都市下水路嵩上げ工事》 ・平成25年度に工事着手予定 《防災集団移転促進事業関連下水路工事》 ・下船渡・赤崎南地区 平成25年5月に実施設計着手 ・大船渡北地区 平成25年度に実施設計着手予定 《浄化センター緊急情報配信システム》 ・平成25年度に工事着手予定 【課題】 ・まちづくり関連事業などとの調整を図りながら、事業を実施する必要がある	2,525,187		114,050	2,411,137			10,047	977,580	277,560	230,000	1,030,000							下水道事業所		
14 ◎	漁業集落排水施設復旧事業	市	H23~H25	着手済		【現状】 《蛸ノ浦》 ・国土交通省から無償で借り受けた汚水処理設備(MBR施設)により供用 ・MBR施設の改良により平成25年3月に本復旧工事終了(将来的には公共下水道に接続予定) 《砂子浜・小石浜・千歳》 ・平成24年4月に本復旧工事終了 《根白》 ・国土交通省から無償で借り受けたMBR施設により供用 ・平成24年9月に本復旧中の施設に切替え供用開始 ・平成24年10月に本復旧工事終了 《その他》 ・平成25年度以降は、軽微な復旧事業を実施予定 【課題】 ・特になし	717,718	549,801	10,700	157,217		169,449	516,769	14,000	17,500											下水道事業所

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
追3 ◎ 漁業集落排水施設整備事業	蛸ノ浦地区漁業集落排水区域内の防災集団移転促進事業及び災害公営住宅整備事業に係る下水道施設整備	市	H25～H26	検討中	有 ※有	【現状】 ・事業実施に向けて関係セクションとともに協議・検討中 【課題】 防災集団移転促進事業などと調整を図りながら事業を推進する必要がある	56,640																	下水道事業所
施策オ 都市基盤施設の復旧・整備にあたっては、防災機能の向上に配慮するほか、広域幹線交通網の強化や防災拠点として有用な「道の駅」の適正配置など、重要施設などへの重点・優先投資を行います。																								
15 ○ 防災・連携道路ネットワークの整備	広域的な防災・連携機能を発揮するための三陸沿岸道路、国道、県道及びそれらと連絡する道路の整備 ・三陸縦貫自動車道吉浜道路 ・国道397号(早期改良) ・三陸縦貫自動車道新インター ・市道滝の沢線(三陸インター接続)	国・県・市	H23～	着手済		【現状】 ・三陸沿岸道路吉浜道路は工事着手済 ・その他の路線などは、附帯工事などを発注したほか、事業計画を調整中 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要があります	288,000	172,800		109,000							58,000	80,000	50,000	50,000	50,000			建設課
16 ◎ 交通安全施設災害復旧事業	地震や津波の被害を受け損傷した信号機など、交通安全施設の復旧	国・県・市	H23～	着手済		【現状】 ・概ね復旧済 【課題】 ・効果的な事業推進を図る必要がある	20,883					6,998	6,885	7,000										建設課
17 △ 被災都市公園修繕事業	被災した都市公園の遊具や施設の修繕 ・盛川河川敷、笹崎、大田、大田南、みどり町、諏訪前、石橋前公園 ・トイレ、フェンス・遊具などの修繕	市	H23～	着手済		【現状】 ・盛川河川敷公園災害復旧工事終了 ・諏訪前・石橋前公園災害復旧工事終了 【課題】 ・津波浸水区域であることから、周辺の整備と調整する必要がある	197,715						9,733	34,982			50,000	50,000	53,000					住宅公園課
18 △ 災害対応強化都市公園事業	災害時の対応を考慮した都市公園の整備 ・総合公園予定地を災害時に避難施設として活用できるように整備 ・基本設計委託、測量詳細設計委託、基盤整備、体育館など施設整備(備蓄倉庫、災害対応受水槽、発電設備、非常時トイレ、ソーラー照明灯)	市	H26～H32	未着手		【現状】 ・整備予定地に応急仮設住宅が建設されている 【課題】 ・整備が応急仮設住宅撤去後となる	495,000	247,500										95,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	住宅公園課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
19 ○	メモリアル公園等整備事業	国・県・市	H23～H30	未着手		【現状】 ・整備について検討中 【課題】 ・市全体の土地利用計画の中で検討する必要がある	560,000	420,000							280,000	280,000									住宅公園課 防災管理室
20 ◎	防災センター整備事業	市	H23～H28	着手済		【現状】 ・平成24年度:建設用地選定 ・平成25年度:測量・基本設計着手済 【課題】 ・周辺で実施される他事業との調整と円滑な事業推進	2,423,275			2,423,200					227,250	361,116	821,703	1,013,206							防災センター 建設推進室
21 ◎	衛生センター復旧事業	気仙広域連合	H23	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	1,337,847	1,058,974																	気仙広域連 合衛生課
<p>施策カ 道路を盛土構造とすることなどについて、防災上の効果を十分に検討したうえで整備を図るほか、災害時に集落が孤立しないよう代替路線を整備・確保します。</p>																									
○	道路新設・改良事業【再掲】	県・市	H23～	着手済	有 ※有	【現状】 県道:道路計画について用地測量などを実施中 市道:19路線の測量設計・工事発注済(平成25年12月末現在) →1路線で工事終了 【課題】 ・高台移転事業やまちづくりなどの土地利用計画や国道・県道の整備計画との整合を図る必要がある ・必要性・緊急性などを考慮しながら計画的に事業を実施する必要がある																			建設課
<p>施策キ 鉄道施設については、関係自治体などとの連携・協力のもとに、災害への対応や公共交通サービスの水準、将来を見据えた交通システムの構築などに関して幅広い検討を行いながら、できるだけ早期の復旧・整備を目指します。</p>																									
22 ◎	路線バス運行事業	市	H23～	着手済		【現状】 ・平成23年10月17日以降は、甫嶺・砂子浜線を除き、バス事業者による運行に移行 ・甫嶺・砂子浜線は、三陸鉄道の運行再開により、平成25年5月1日で廃止 【課題】 ・高台移転先などへの路線開設を検討する必要がある	457,472	57,086	16,096		22,000	362,290	67,645	31,707	34,000	45,000	46,520	46,520	46,520	46,520	46,520	46,520	46,520	46,520	商業観光課
追4 ○	大船渡市コミュニティバス事業	市	H24～H27	着手済	※有	【現状】 ・大船渡市総合交通体系検討会議を開催(3回開催済) ・市における公共交通の方向性に関する報告書、コミュニティバスに係る事業計画などを策定(作成)予定 【課題】 ・関係機関との調整	192,296				152,403	39,893		16,126	54,907	77,259	44,004								商業観光課

事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
23 ◎ 震災緊急生活交通確保事業	被災により県立病院が機能不全となった市町について、県が広域生活路線バスを運行し、被災住民の県立病院などへの移動手段を確保 ・陸前高田市内～県立大船渡病院	県	H23	実施済		【現状】 ・無料バス運行(平成23年4月～7月):陸前高田市内～県立大船渡病院 ・平成23年8月以降は、事業者によるバス路線運行に移行 【課題】 ・特になし	1,543		1,543															商業観光課
24 ◎ 三陸鉄道南リアス線代替バス運行事業	三陸鉄道の復旧まで代替バスを運行 ・釜石市上大畑～県立大船渡病院	三陸鉄道	H23～H25	着手済		【現状】 ・釜石・大船渡線を運行している ・沿線市などの負担金拠出を予定していたが、国庫補助による運行に切り替えた 【課題】 ・三陸鉄道復旧までの路線の維持・継続																		商業観光課
25 ◎ JR大船渡線の復旧事業	JR大船渡線の復旧に向けた沿線自治体、関係機関との整備方針の協議・検討	JR	H23～	着手済		【現状】 ・復興計画に基づき、鉄路復旧については、復興調整会議(事務局:東北運輸局)などの場や個別にJRと協議中 ・BRTによる仮復旧を陸前高田市及び気仙沼市とともに受け入れ(平成24年10月) ・BRTについては、専用道化工事を経て、平成25年3月から運行が開始された ・平成25年9月からは専用道が小友駅付近まで延伸されたほか、碓石海岸口駅も設置 【課題】 ・津波浸水区域内での線路のかさ上げ	1,765																	商業観光課
26 ◎ 三陸鉄道復旧支援事業	三陸鉄道の早期再開に向け復旧費用の一部を支援 ・南リアス線延長:37km ・南リアス線被害箇所数:247	市	H23～H26	着手済		【現状】 ・復旧工事着手済 ・平成26年4月に全線運行再開予定 ・平成25年4月に部分開通(盛～吉浜間) 【課題】 ・沿線自治体の負担金の拠出	1,445,351		963,567				481,784	143,990	510,069	791,292								商業観光課
27 ◎ 岩手開発鉄道の復旧支援事業	岩手開発鉄道の復旧費用の一部を支援 ・補助率:国1/4、市1/4	市	H23	実施済		【現状】 ・岩手開発鉄道において、国と市の補助から別の補助金活用に切り替えた 【課題】 ・特になし																		商業観光課
方針② 土地利用のあり方を検討のうえ見直します。 施策ア それぞれの被災地域の特性を考慮した土地利用計画を定めます。																								
28 ◎ 復興計画策定等支援事業	被災地の被災状況調査の実施や復興計画策定に係る市の取り組みなどへの支援	国	H23	実施済		【現状】 ・復興計画の策定や防災集団移転促進事業などまちづくり事業の取り組みに対する支援を受けた 【課題】 ・特になし	200,000	200,000																復興政策課





事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
追9 ◎ 大船渡駅周辺の産業誘致・振興に向けた調査事業	大船渡駅周辺地区を対象に市街地の再整備に係る諸事業と整合を図りながら、魅力ある新たなまちづくりと産業振興を目指し、市民や来訪者にとって価値のあるブランドを構築するための調査	市	H24	実施済	※有	【現状】 ・事業終了 【課題】 ・津波復興拠点整備事業への反映 ・民間事業者との共通理解	35,280																	環境未来都市推進室
31 ○ 小規模住宅地区等改良事業	不良住宅の集合など、生活環境の整備が遅れている地区での住宅などの整備 ・不良住宅の買収除去 ・改良住宅の建設 ・公共施設、地区施設の整備	市	H23～	整理・統合等		【現状】 ・他の住宅再建関連事業の進捗に伴い、実施する可能性が低くなった 【課題】																		住宅公園課
施策イ 沿岸地域を中心とした住宅の高台移転や宅地のかさ上げなどに伴い、移転先地域なども含めた複数のエリアで土地利用のあり方を検討し、用途を定めます。																								
◎ 防災集団移転促進事業【再掲】	居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転の促進 ・住民の意向を踏まえて移転促進区域を設定するほか、住宅団地の整備、移転者に対する助成などを行う ・住宅団地の規模は5戸以上(移転しようとする住居の数が10戸を超える場合には、その半数以上の戸数) ・土地利用にあたっては、所有者の意向を確認しながら遊休農地の活用を図る ・移転後の跡地については、再び住宅が建設されて危険が生じることはないよう、条例により建築基準法第39条の規定による災害危険区域として指定する	市	H23～H28	着手済	有	【現状】 ・市内各地で対象住民の合意形成を図るとともに、必要に応じて事業計画を見直しながら事業を実施中 ・復興交付金配分決定及び大臣同意取得済地区… 21地区(事業実施予定全地区) ・9地区(泊地区、小細浦地区、田浜地区、門之浜地区、港・岩崎地区、細浦地区、佐野地区、清水地区、浦浜南地区)において移転住宅団地整備工事に着手済→うち1地区(小細浦地区)において工事終了(泊地区は平成26年1月終了) 【課題】 ・事業の早期実施																	集団移転課	
○ 土地区画整理事業【再掲】	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備 ・地盤沈下した宅地のかさ上げ	市	H23～H32	着手済	有	【現状】 ・各種測量調査を実施中 ・緊急防災空地整備事業により用地買収を実施済 ・平成25年8月に事業認可 ・申出換地意向調査結果を基に仮換地設計中 ・土地区画整理審議会及び評価委員会を開催 【課題】 ・関係機関や権利者などの調整																	土地利用課	
追8 ◎ 津波復興拠点整備事業【再掲】	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地の整備 ・復興拠点の施設計画及び都市計画の決定 ・津波防災拠点施設、津波復興拠点施設、特定業務施設、公益的施設などの整備	市	H23～H29	着手済	有	【現状】 《大船渡地区》 ・先行整備地区の用地買収終了 ・津波復興拠点施設基本設計実施中 ・盛土造成工事に着手済(平成25年11月) 《その他地区》 ・事業導入地区選定中 【課題】 ・関係機関や権利者などの調整																	土地利用課	



事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興 交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源	
新 ◎ 情報通信技術利活用事業	震災によりテレビ難視聴地域に転居した世帯のテレビ視聴に必要な施設整備を行うテレビ共同受信施設組合に対し、整備費用を助成(補助率:10/10)	市	H25~	検討中		【現状】 ・平成25年度:2組合へ助成予定 ・平成26年度:5組合へ助成予定 【課題】 ・円滑な視聴に係る関連事業などとの調整	29,475	9,824																商業観光課
35 ◎ 地上デジタル放送難視聴地域解消事業	テレビ共同受信施設組合などが行う、地上デジタル放送の難視聴(災害による影響を含む)を解消するための施設改修を支援	市	H23~H24	実施済		【現状】 ・対象8組合のうち、6組合が平成24年度までに工事を終了し、2組合が事業を中止した 【課題】 ・特になし	26,612	26,612																商業観光課



事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
4 ◎ 防災行政無線整備事業	・デジタル防災行政無線システムの整備(市内全域) [目標]親局1,中継局1,遠隔操作卓2,子局210,戸別受信機全戸配布,監視カメラ1など ・被災したアナログ施設の応急復旧(旧大船渡市地域) ・応急仮設住宅の難聴対策(旧大船渡市地域)	市	H23~	着手済	※有	【現状】 ・デジタル防災行政無線→平成25年5月にデジタル放送開始 ・上記整備内容:親局1、中継局1、拡声子局197(うち再送信子局5)、再送信局3、戸別受信機は約11,000、監視カメラ1、移動系防災行政無線50局 ・アナログ20局を応急復旧済 ・応急仮設住宅の難聴解消(2局) ・平成25年度:アナログ設備の撤去、文字表示装置付戸別受信機の無償貸与などを実施 【課題】 ・特になし	1,137,349	614,400		79,200	29,720	414,029	4,551	277,200	657,800	44,900	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	防災管理室
5 ◎ 災害時情報伝達方法の整備	・市災害対策本部・地区本部、地域公民館、避難所などの相互連絡体制の確立(相互連絡手段及び情報収集体制)	市	H23~H27	着手済		【現状】 ・災害対策本部に衛星電話を設置 ・避難所に防災行政無線(移動系)を整備(30局整備済) ・平成26年1月に特設公衆電話回線を整備 【課題】 ・避難所などにおける通信機器の管理	42,689	13,811				28,878	1,196	41,433		60									防災管理室
追1 ◎ 防災市民メディア構築事業	災害時などにおける情報伝達手段の多様化を図るため、情報通信基盤を整備する ・サーバの設置及び市内無線通信網の構築 ・FM放送機器の整備 ・市内企業などで構成するNPOによる運用体制の構築	市	H24	実施済		【現状】 ・市内無線通信網構築工事終了(WiMAX基地局) ・FM放送設備構築工事終了 【課題】 ・特になし	352,469	116,089				236,380		352,469											防災管理室
6 ◎ 潮位観測装置等整備事業	・潮位観測装置の復旧(下平、門之浜、越喜来)	市	H27~	未着手		【現状】 ・潮位観測装置は未復旧 【課題】 ・設置場所となる防潮堤などが未復旧	15,000					15,000				15,000									防災管理室
7 ◎ 防災行政無線復旧事業	(三陸町地域) ・津波で流失した子局(6局)、漁港局(17局)、遠隔制御局(3局)の整備 ・津波被害を受けた親局の移設 1局 ・津波で流失した戸別受信機を対象世帯へ貸与 100台 ・応急仮設住宅への簡易子局整備 4局	市	H23	実施済		【現状】 ・流失子局対応として田浜、崎浜、鳥頭、岩崎に簡易子局を設置し、仮復旧済 ・根白沿岸子局は復旧済 ・市役所本庁に親局を置き、三陸支所、綾里・吉浜地域振興出張所を直接専用回線で接続する方法で復旧済 ・戸別受信機については貸与を開始 ・応急仮設住宅への簡易子局については整備終了 ・デジタル化への移行を踏まえ、簡易方式で復旧 【課題】 ・特になし	8,239					8,239	8,239												三陸支所
8 ◎ 本庁舎改修事業	非常用発電機、内外壁、配管などの改修	市	H23~H25	着手済		【現状】 ・非常用発電機、外壁欠陥部及び階段内壁亀裂は改修済 【課題】 ・特になし	9,285					9,285	6,063	1,884	1,338										財政課
9 ◎ 三陸支所仮庁舎の整備	被災した市役所三陸支所の機能を回復するため、三陸保健福祉センターを仮庁舎として復旧整備	市	H23	実施済		【現状】 ・仮庁舎として復旧済 【課題】 ・特になし	29,864			28,100		1,764	29,864												財政課









事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)										担当課			
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度				
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他												一般財源		
方針③ 地域コミュニティ機能の維持・強化を図ります。																									
施策ア 自主防災組織の育成・強化を支援します。																									
25 △	地域防災力強化推進事業	自主防災組織の育成・強化(結成促進、リーダー養成、連合会組織の結成など)	市	H24～	着手済	【現状】 ・自主防災組織などに対する説明会を開催 ・新たに結成した自主防災組織に本部旗、腕章を作成・交付 ・結成組織数:98(平成25年12月末現在) 【課題】 ・未結成地域の解消 ・活動が停滞している自主防災組織の活性化	8,703					8,703		73	770	780	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	防災管理室	
施策イ ボランティア組織の育成・強化を支援します。																									
26 ○	おおふなとボランティア活動連絡会支援事業(活動センター運営事業)	ボランティア組織の育成・強化の支援	社会福祉協議会	H23～	着手済	【現状】 ・支えあいまちづくり事業を実施中 ・平成24年度から復興ボランティアセンター運営補助事業を実施 【課題】 ・被災者のニーズとボランティア活動のマッチング	56,396	25,000				6,396	25,000	5,000	7,900	6,400	6,048	6,048	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	地域福祉課 保健介護センター
施策ウ 市民の自主的な地域づくり活動や拠点となる施設の整備などに対して支援します。																									
27 ○	市民活動支援事業	市民活動の活性化、公益団体などの連携及び行政との協働を図るため、さまざまな情報の提供、活動団体の相互交流の機会及び活動場所が提供できる施設の整備など	市	H23～	着手済	【現状】 ・平成25年12月に市民活動団体スキルアップ講座を開催→団体間の情報を共有 ・大船渡市市民活動支援協議会(構成団体:市・社会福祉協議会・NPO法人、平成25年9月設立)が、市民活動支援センターを開設 【課題】 ・上記協議会の運営費の確保	18,688								200	18,488								企画調整課	
28 ○	越喜来地区拠点センター建設事業	被災した市役所三陸支所を移転し、地区住民の避難所を兼ねた拠点センターとして整備	市	H24～	整理・統合等	【現状】 ・三陸支所(機能)については、三陸保健介護センターを改修し、業務を再開済→新たな施設は整備しない(地元復興委員会から同意を得ている) 【課題】																		三陸支所	
◎	地域公民館整備支援事業【再掲】	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援	地域公民館市	H23～H28	着手済	【現状】 ・被災地域の意向を調査しながら対応している(11地域について支援済→使用開始済) 【課題】 ・用地の確保が課題であり、地域との協議を十分に行う必要がある																		生涯学習課	
29 ◎	綾里地区コミュニティ施設災害復旧事業	綾里地区コミュニティ施設の補修	市	H23～H24	実施済	【現状】 ・復旧済 【課題】 ・特になし	15,717						15,717	7,616	8,101									三陸支所	







事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画					事業費(千円)								担当課		
							事業費(千円)	財源内訳				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度		31年度	32年度
								国庫支出金	県支出金	地方債	その他											
施策ウ 災害時にすばやく対応できるボランティアネットワークを強化します。																						
○ 市民活動支援事業【再掲】	市民活動の活性化、公益団体などの連携及び行政との協働を図るため、さまざまな情報の提供、活動団体の相互交流の機会及び活動場所が提供できる施設の整備など	市	H23～	着手済		<b>【現状】</b> ・平成25年12月に市民活動団体スキルアップ講座を開催→団体間の情報を共有 ・大船渡市市民活動支援協議会(構成団体:市・社会福祉協議会・NPO法人、平成25年9月設立)が、市民活動支援センターを開設 <b>【課題】</b> ・上記協議会の運営費の確保														企画調整課		
○ おおふなとボランティア活動連絡会支援事業(活動センター運営事業)【再掲】	ボランティア組織の育成・強化の支援	社会福祉協議会	H23～	着手済		<b>【現状】</b> ・支えあいまちづくり事業を実施中 ・平成24年度から復興ボランティアセンター運営補助事業を実施 <b>【課題】</b> ・被災者のニーズとボランティア活動のマッチング														地域福祉課 保健介護センター		
