
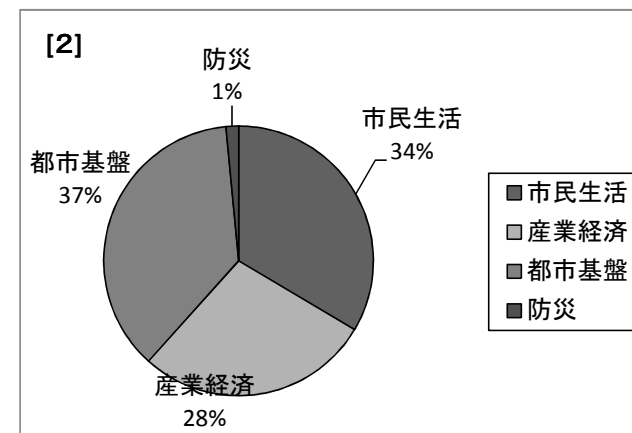


# 大船渡市復興計画事業の進捗状況について

平成25年3月31日現在

## [1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	8
検討中	30
着手済	167
実施済	48
整理・統合等	12
計	265

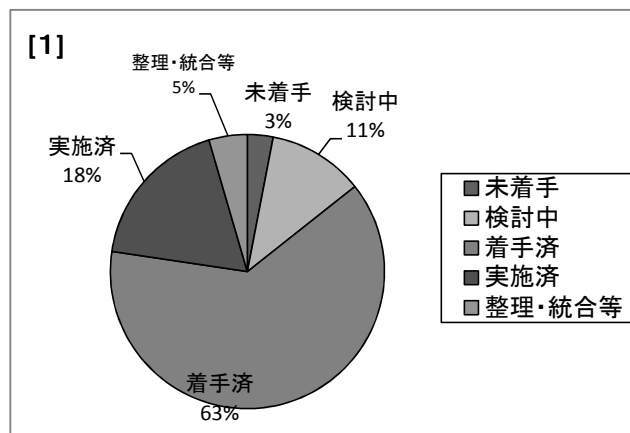

## [2] 事業費の内訳 (※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	119,285	52,704	8,946	8,040	40,499	9,096	22,069	24,288	31,469	20,805	17,998	873	501	490	422	370
産業・経済の復興	100,162	62,541	13,359	2,397	11,499	10,366	8,548	29,583	37,241	9,494	12,546	650	678	476	474	472
都市基盤の復興	131,180	41,792	28,379	4,417	42,074	14,518	4,100	21,772	30,555	30,157	25,114	9,475	4,981	2,239	1,489	1,298
防災まちづくり	5,286	2,386	1	902	105	1,892	1,097	1,853	1,003	796	348	56	32	32	32	37
合計	355,913	159,423	50,685	15,756	94,177	35,872	35,814	77,496	100,268	61,252	56,006	11,054	6,192	3,237	2,417	2,177
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					213,578 (60.0%)			128,312 (36.1%)			14,023 (3.9%)			
(H24.12.31現在)	337,161	158,608	44,897	20,842	80,332	32,482	39,348	94,474	90,111	45,200	36,800	10,887	7,562	5,308	4,378	3,093
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					223,933 (66.4%)			92,887 (27.6%)			20,341 (6.0%)			

★事業費による進捗状況→(平成23年度事業費+平成24年度事業費) : 113,310百万円/総事業費 : 355,913百万円=31.8%

## ■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 528億円	・漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設) 263億円	・港湾施設復旧事業 205億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・防災集団移転促進事業 250億円	・水産物等残渣処理事業 120億円	・湾口防波堤復旧事業 200億円	・防災行政無線整備事業 10億円
・漁村集落復興事業 141億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・津波復興拠点整備事業 200億円	・コミュニティ消防センター新築事業 10億円
