
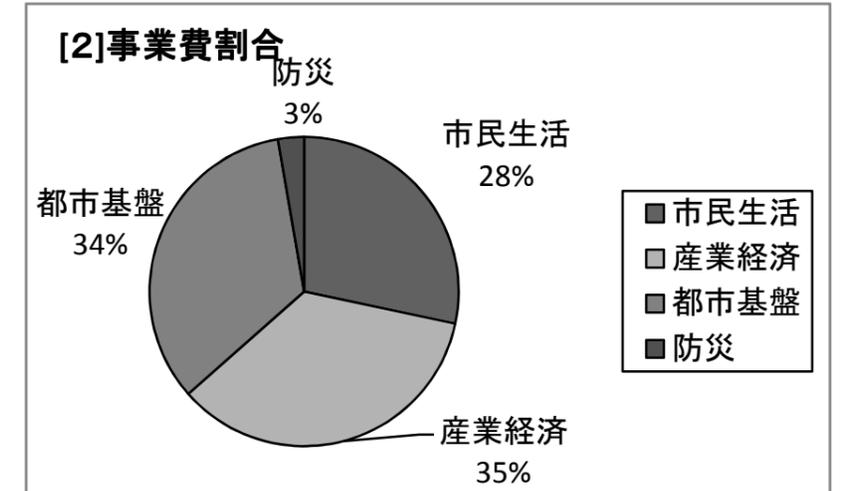


# 大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成29年9月30日現在

## [1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		124	
着手済	(1)	132	35
	(2)		43
	(3)		7
	(4)		47
検討中		0	
未着手		0	
計		256	
整理・統合等		20	

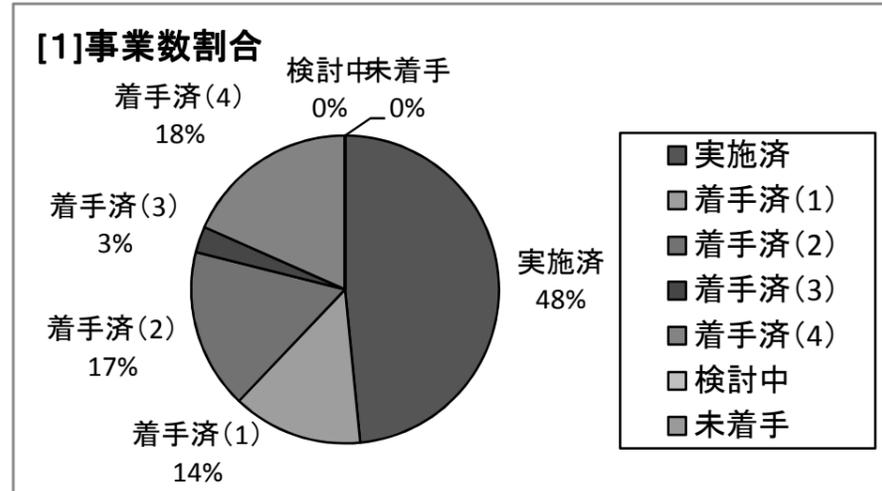

### ※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

## [2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画(百万円)															
		財源内訳(百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源											
市民生活の復興	108,062	48,573	9,323	2,263	36,844	11,059	18,178	17,397	23,563	11,625	13,731	13,404	5,023	4,255	443	443	
産業・経済の復興	134,115	46,443	61,715	3,471	15,992	6,494	8,914	17,888	30,526	22,020	15,965	11,475	10,913	8,744	6,472	1,198	
都市基盤の復興	128,794	31,956	53,117	4,416	29,316	9,989	3,922	10,212	17,534	22,321	17,490	22,992	24,121	7,706	1,444	1,052	
防災まちづくり	10,398	2,123	24	69	6,407	1,775	131	2,173	2,415	4,554	414	366	221	42	41	41	
合計	381,369	129,095	124,179	10,219	88,559	29,317	31,145	47,670	74,038	60,520	47,600	48,237	40,278	20,747	8,400	2,734	
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							152,853 (40.1%)			156,357 (41.0%)			72,159 (18.9%)				

★事業費による進捗状況(平成23年度～平成28年度)→: 309,210百万円÷総事業費: 381,369百万円=81.1%

※着手済事業の(1)・(2)の平成29年度以降の事業費を「0」とした場合の進捗状況=82.0%

参考(前回調査時)

(H29.3.31現在)	388,130	129,284	125,033	11,333	92,662	29,818	31,147	47,669	74,017	61,427	50,453	54,703	39,433	18,354	8,384	2,543	
復興計画の期間別事業費(全事業費に占める割合)							152,833 (39.4%)			166,583 (42.9%)			68,714 (17.7%)				

### ■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 458億円	・漁港関係施設等復旧事業(漁港施設) 706億円	・港湾施設復旧事業 323億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 197億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・湾口防波堤復旧事業 255億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・被災学校移転改築事業 112億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・土地区画整理事業 234億円	・防災行政無線整備事業 10億円
