

被災跡地利用の検討 地区別進捗管理表


○土地利用方針図の見直し（実現化方策の策定）を行う地区

No.	地区名	状況					土地利用方針の改定に向けた作業									計画に位置付けた事業				
		H23利用 方針	復興組織 の有無	提言書等	土地 買取	土地 集約	復興組織の検討状況			素案 作成	素案 合意 (※1)	懇談会	素案 修正	議会 説明	公表	事業数	実施 調整 (※2)	事業 着手	事業 完了	着手済の主な事業
							準備	検討	まとめ											
1	地ノ森（新田）	●	●	●	○	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	1	1	1	0	内水排水対策事業
2	下船渡	●	—	●	○	—	—	—	—		—		—	—		1	1	1	0	内水排水対策事業
3	細浦	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	2	2	0	広場整備事業、道路新設改良事業
4	小河原	●	●	—	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	1	産業用地整備事業
5	泊里	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	1	1	0	浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備
6	碁石	●	●	●	○	○														
7	赤崎	●	●	●	○	○	●	●	●	○						0	0	0	0	
8	綾里	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	1	1	0	道路改良事業
9	甫嶺	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3	1	0	道路新設改良事業
10	泊	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	2	2	1	道路改良事業、広場整備事業
11	浦浜	●	●	●	○	○														
12	崎浜	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	1	0	消防屯所検討

(※1) 復興組織の合意状況 (※2) 財源の確保、実施所管課の調整、復興組織とのすり合わせ等

○土地利用方針図の見直しを行わない地区

No.	地区名	状況					備考
		H23利用 方針	復興組織 の有無	提言書等	土地 買取	土地 利用	
13	盛	●	—	—	●	○	譲渡・貸付
14	赤土倉	—	—	—	—	—	
15	蛸ノ浦	●	—	●	○	○	譲渡・貸付
16	長崎	●	—	●	—	—	
17	合足	●	—	●	—	—	
18	小路	—	—	—	—	—	
19	野々前・白浜	●	—	●	—	—	
20	砂子浜	●	—	●	—	—	
21	小石浜	●	—	●	●	—	譲渡・貸付
22	小壁	—	—	—	—	—	
23	吉浜	●	—	—	●	—	譲渡・貸付
24	扇洞	●	—	—	—	—	
25	根白	—	—	—	—	—	
26	千歳	●	—	—	—	—	

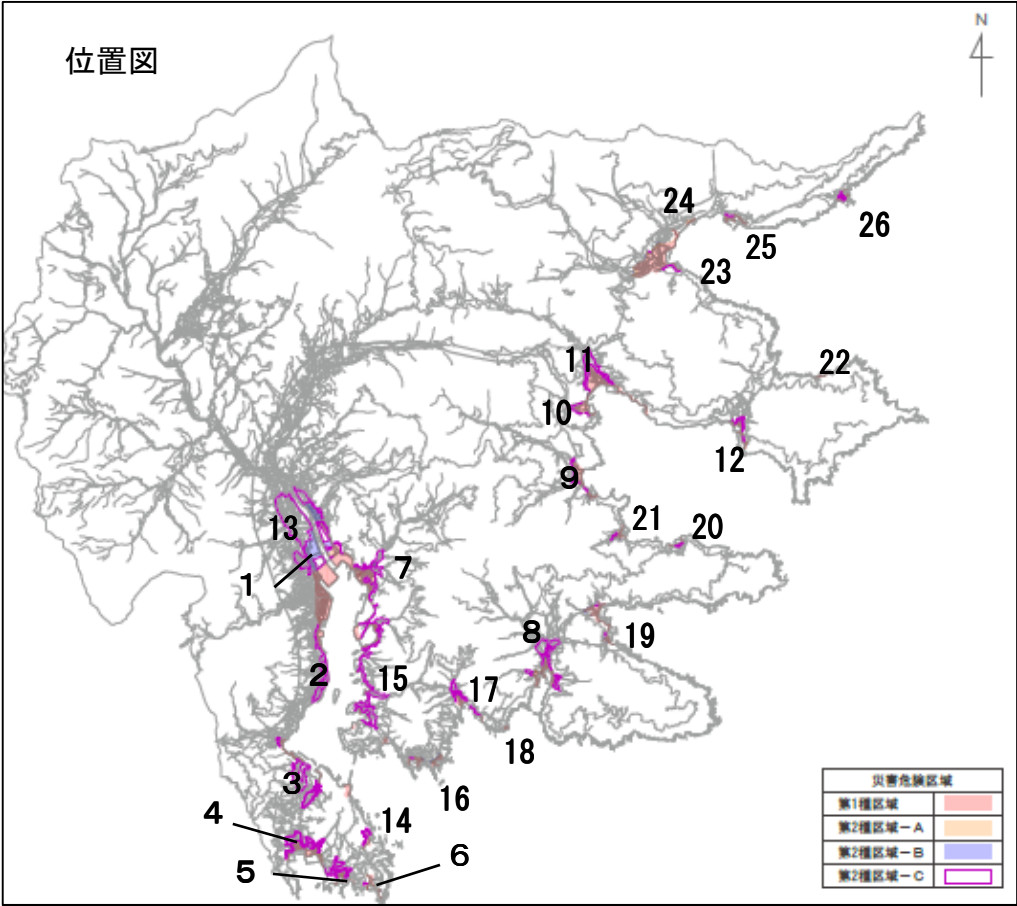

被災跡地土地利用実現化方策に位置づけた事業（予定を含む）の状況について

見込区分（目安）：A＝実施中・実現の見込み大、B＝実現の可能性はあるが時期等調整、C＝見込みがたっていないもの															凡例		「●」＝実施済		「○」＝実施中		「－」＝該当なし								
地区	No.	実施主体	事業名	概要	見込区分	進捗（市）				進捗（地域）			現在の状況	活用する移転元地（㎡）	概算事業費（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		担当課等	
						実施調整	財源確保	測量設計	工事	完了	検討	実施				完了	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月			
地ノ森（新田）	1	市	内水排水対策事業	地ノ森（新田）地区 道路、橋梁、小水路の嵩上げ	A	●	●	●	○		－	－	－	・復興交付金（一件審査）配分済 ・測量設計 H28. 9月完了済、工事施工中 ・公共残土により民有地の嵩上げ（仕上げ残し）を実施済 ・県道整備施工中	－	389, 063			設計		工事								建設課
	2	市	内水排水対策事業	下船渡地区 小水路の嵩上げ	A	●	●	○			－	－	－	・復興交付金（一括配分）配分済 ・県道整備に合わせて工程を調整 ・設計は完了済、県道の関係で一部測量が未完	－	97, 784					設計		工事						建設課
下船渡	3	県	復興関連道路整備事業 （県道丸森権現堂線）	L=2, 100m、W=6. 0（11. 5, 16. 0）m	－	－	－	－	－	－	－	－	・久保田鉄工～カメイタンク下付近のスケジュール H28. 9月 個別工事説明 H28. 10月～H29. 3月 用地測量・調査 H29. 7月～H30. 3月 用地説明・買収・移転補償 H30. 4月以降 工事着手	－	－			※本スケジュールは久保田鉄工～カメイタンク下付近	設計		工事						土木C （道路整備課）		
	4	市	コミュニティ広場の整備	A=約0. 3ha 四阿、ベンチ、水飲み場等	A	●	●	○			－	－	－	・約0. 3haの用地を確保見込み（土地交換は約263㎡） ・交換不能な民有地 1筆は買収済 ・復興交付金（一括配分）配分済 ・地域と広場レイアウトを協議中 ・測量設計中	3, 100	50, 631							設計		工事				土地利用課
細浦	5	市	避難路の整備	避難路の新設（陸間からの避難階段） L=25m、W=2. 0m	B	○					－	－	－	・陸間整備（H32年度）と調整を図り整備 ・復興交付金の再協議を予定（H31年度）	－	11, 333								↓陸間整備と調整		設計	工事	土地利用課	
	6	県	海岸保全施設整備事業 （細浦漁港分）	防潮堤・水門	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・陸間整備の前倒しを検討 →陸間整備はH32年度整備で確定とのこと。	－	－	工事						※陸間はH32年度整備					水産振興C （漁港管理課）	
	7	市	嵩上げの検討	水路改修・道路の嵩上げ	C	○					－	－	－	・復興庁へ相談済 →周辺土地利用の確度を示すことが要件 →広場利用（イベント等）や事業者意向を示す予定 ・単費整備を検討する必要あり ・一体利用A区域を土砂の仮置場として利用中	－	99, 911			※財源調整中・スケジュール未定								土地利用課		
	8		市道の整備	峰岸防集団地からまちづくり連携道路への接続道路整備	A	●	●	●			－	－	－	・社総交は非該当 ・復興交付金（一括配分）配分済 ・測量設計 H30. 3月完了済	－	64, 500						設計		工事				建設課	
	9	地域	朝市の運営・広場の維持管理	復興朝市の継続運営・広場の維持管理	－	－	－	－	－	－	○	○		・復興朝市は継続して運営中 ・広場管理は継続協議していく予定	－	－	朝市の継続運営						広場の維持管理						地域
小河原	10	市	産業用地の整備	企業誘致を行う産業用地の整備 A=約3. 2ha	A	●	●	●	●	●	－	－	－	・復興交付金（一括配分）配分済 ・測量設計 H29. 6月完了済 ・敷地造成工事 H30. 1月完了済 ・その2工事（防火水槽）H30. 3月完了済	19, 704	109, 430					設計		工事						土地利用課
	11	企業	誘致企業の施設整備	大規模施設園芸 ・トマトの施設栽培 ・高規格太陽光利用型グリーンハウス ・施設面積 約1. 7ha（作付 約1. 5ha）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・産地PU補助内示済 ・当初の施設工事契約は不履行を理由に解除済 ・H29. 12月に再入札を実施済 → 不調 ・H30. 3月に再々入札（指名競争）を実施→業者決定済 ・H30. 4月下旬に着工予定（地鎮祭4/13予定）	－	－							施設整備						企業
泊里・基石	12	市	避難路の整備	避難路の復旧 （赤道の復旧改良）	C	○					－	－	－	・復興交付金、社総交とも非該当 ・単費整備を検討する必要あり	－	12, 000			※財源調整中・スケジュール未定										土地利用課
	13		浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備	基石浜背後地を盛土整地し、駐車場として利用（盛土材は県と市の工事発生土を利用、水路等の処理は県工事負担を想定）	A	○	－	●	○		－	－	－	・県の財源で整備予定（残土処理事業での対応） ・12/18～19地域主体のモニターツアーを実施 ・活用を検討するワークショップを予定 ・測量設計済、国立公園許可済（土砂受入可能） ・防潮堤工事（水産振興C）と水道工事の発生土を受入中 →4月以降防潮堤工事（土木C）の発生土を受入予定	－	0				設計		工事（土砂搬入）		（工程再調整）					土地利用課
	14		津波資料としての地層の保存	過去津波の痕跡資料 過去に大学教授が取り出した地層（博物館に保管）の展示	B	○	－	－	－		－	－	－	・上記の駐車場整備と合わせて地域と協議 ・既存資料の活用であり、基本的に財源は不要（展示のために体裁を整える可能性はあり）	－	0			調整							（工程再調整）			土地利用課
	15	地域	多目的広場の整備	地域が地権者から土地の借受け等を行い、広場として利用 A=約1. 0ha	－	－	－	－	－	－	○			・地域が継続検討中 ・民有地の利用状況を踏まえた区域設定が必要 ・民有地の利用意向を尊重した検討が必要	－	－				地域の取組									地域
	16		蓮田の管理	鎮魂や自然学習のための蓮田 民地を借り受けた地域による整備・管理	－	－	－	－	－	－	●	●	●	・地域において整備済 ・適切な管理が継続されている	－	－	地域の取組												地域
	17		椿の葉集荷場・椿畑の整備	椿利用のための集荷場・畑の整備 将来的に実や葉を活用した産業創出を模索	－	－	－	－	－	－	○	○		・買取地約600㎡を先行整備 ・椿学習の一環で2中学校で70本のヤブツバキを植樹 ・地域による管理が継続されている	2, 000	－			地域の取組										地域
18	避難路の整備		地域による避難路整備 （市は資材を提供）	－	－	－	－	－	－	●	○		・計画3路線のうち1路線を整備済 （市から資材提供） ・今後、地域では段階的な整備を予定	－	－			地域の取組（1路線を先行整備）										地域	

地区	No.	実施 主体	事業名	概要	見込 区分	進捗（市）				進捗（地域）			現在の状況	活用する 移転元地 （㎡）	概算 事業費 （千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		担当課等	
						実施 調整	財源 確保	測量 設計	工事	完了	検討	実施				完了	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月		10～3月
赤 崎	19	－	※地域と協働で検討中	〔構想〕 ・復興市の常設化 ・スポーツ交流ゾーンの整備 ・防災交流拠点の整備									・第1弾のワークショップ終了→H28/11/30要望受け →スポーツ施設＝野球場を中心とした構想 ・総合公園の見直しに係る庁内検討を実施済 ・野球場整備に向けた庁内検討を実施中 ・地域においてまちづくりワークショップを実施中 →第3回WSを2/17に実施済（次回5/12予定） ・市道拡幅に向けた用地交渉に取組中	36,000	未定													土地利用課 建設課 生涯学習課	
綾 里	20	市	緑化広場の整備	A=約0.2ha	A	○	○				－	－	－	・H29.9～10月復興委員会と共に整備方針を決定 →用地確保に取組中 ・3/17に第1回まちづくりワークショップを開催 →公募メンバー1名を含む17名が参加 →第2回WSは5/20を予定	2,000	42,719			調整				設計	工事				土地利用課	
	21		市道開墾線道路改良事業	拡幅改良 L=430m、W=6.0m	A	●	●	●	○		－	－	－	・復興交付金（一件審査）配分済 ・測量設計 H28.11月完了済 ・工事施工中（～H30.6月予定）	－	90,896			設計		工事							建設課	
	22	市	市道港黒土田線道路改良事業	道路の嵩上げ L=125m、W=6.0m	C	○					－	－	－	・防潮堤整備（～H32年度）と要調整 ・水産施設用地に合わせた嵩上げを予定 →水産仮設倉庫の継続使用を踏まえた整備を検討 →事業の取りやめを含めて地域と協議予定	－	21,489							設計	工事	（工程再調整）		水産課		
	23	県	漁港関係施設等災害復旧事業 （綾里漁港海岸）	防潮堤等の整備	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・用地買収 ～H28.12月 ・工事施工中（～H33.3月） ※綾里漁港分	－	－	設計	工事										水産振興C （漁港復旧課）	
	24	市	市道港田浜線道路改良事業	拡幅改良 L=180m、W=6.0m	C	○					－	－	－	・漁集の効果促進事業を予定 ・岩手復興局ヒア→整備理由が不適、対象外 ・避難機能確保に主眼を置いた相談を予定 ・狭隘箇所のための部分改良も視野に入れ検討	－	56,000						調整		設計	工事	（工程再調整）		土地利用課	
	25	市	漁業集落防災機能強化事業	水産施設用地・集落道の整備	－	●	●	●	○		－	－	－	・水産用地は田浜地区の一部を除き完了 ・2号避難路はH30年度着工予定	4,967	275,119		設計	工事									水産課	
	26	市	市道石浜線・石浜海岸線道路 改良事業	拡幅改良 L=未定、W=未定	C	○					－	－	－	・県の機能補償は対象外（地域要望に基づくため） ・他財源や単費整備、簡易な改良を検討する必要あり →ガード下の自動車通行不可はH32年度予定	－	未定			※財源調整中・スケジュール未定								土地利用課		
27	地域	緑化広場の維持管理	広場の維持管理	－	－	－	－	－	－				・活用と維持管理についてワークショップ検討を実施	－	－					検討（整備後に維持管理）								地域	
甫 嶺	28	市	市道甫嶺横断線道路新設改良 事業	迂回路となる道路を新設 L=720m、W=5.0m	A	●	●	○			－	－	－	・社総交（復興）採択済 ・測量設計 H29.3月完了済 ・ルート変更後、用地交渉中	－	440,000			設計		用地・調整		工事					建設課	
	29		住民協働による拠点の検討・ 運営	旧甫嶺小学校校舎等の利活用検討	B	○	○				－	－	－	〔構想〕 ・地域が参画する株式会社がテナント事業を実施 ・店子である各事業体がアクティビティ等を提供 （地活研の提案） ・H29.2月 越喜来地区震災復興委員会から要望受け →内容は地域・民間・行政の連携した取組・検討等 ・H29.6月に地域役員へ、9月に地域へ構想を説明済 ・官民会議（実務者会議）を継続中 ・H29.12月の復興交付金策定支援で相談済 →都市局協議は終了（調査事業を行うべきとの示唆） →調査事業の内容を復興庁に協議中 ・H30.3月に先進地視察を実施（南三陸町と最上町）	－	240,674	検討					調査	設計	工事	※H32年4月 オープン		新産業戦略室 土地利用課 学校教育課		
	30		農業的土地利用への誘導（先行誘導地）	農業のための土地利用への誘導	－	●	－	－	－	－	－	－	－	・景観形成のための植樹などへ取組をシフト	－	－												土地利用課	
	31		避難路の整備 （既設の取付改良）	主要地方道への取付勾配改良	A	○	●				－	－	－	・取付改良について復興交付金（一括配分）配分済 →H30.6月に補正予算計上を予定 ・地域に概要は説明済	－	19,011						設計	工事				水産課		
	32	地域	三陸鉄道との協働による植樹 帯の整備	甫嶺駅前への植樹帯整備	－	－	－	－	－	－	○			・現在は三鉄海側の植樹を優先検討 ・夢ネット大船渡と植生を調査中（桜の植樹4/1実施） ・草刈を継続実施	－	－			地域の取組									地域	
	33		蕎麦栽培	共同菜園 蕎麦を共同で栽培 イベント化	－	－	－	－	－	－	●	●	●	・H27年度から本格実施 ・H29年度は7/30種まき→10月収穫祭を実施 ・地域主体の取組として定着	－	－	地域の取組										地域		
	34		ビオトープ	甫嶺駅海側を自然体験場と位置付け	－	－	－	－	－	－	○			・段階的に検討 ・残地利用（保存）という位置づけ	－	－					地域の取組							地域	
	35		見晴台	矢作川河口付近への見晴台整備	－	－	－	－	－	－	○			・用地確保が叶わず一度断念、H28.7月可能性が出てきたため再検討を開始 ・見晴台と地元カフェを構想中 →防潮堤工事後にベンチを置くなどして使いながら徐々に整備予定 （防潮堤整備業者が敷均し予定）	1,100	－			※再度検討中・スケジュール未定								地域		
36			シーカヤック活動拠点	鬼沢漁港南側をシーカヤック体験場と位置付け	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・担い手等の関係から一旦取りやめという整理	－	－											地域		

地区	No.	実施 主体	事業名	概要	見込 区分	進捗（市）					進捗（地域）			現在の状況	活用する 移転元地 （㎡）	概算 事業費 （千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		担当課等
						実施 調整	財源 確保	測量 設計	工事	完了	検討	実施	完了				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	
浦 浜・ 泊	37	市	浦浜川東側添線道路改良事業	津波等時に溢水しないよう嵩上げ L=200m	A	●	●	●	●	●	—	—	—	・社総交（復興）採択済 ・測量設計 H29. 3月完了済 ・工事 H30. 3月完了済	400	70,000			設計		工事								建設課
	38		沖田シミア沢線改良事業	道路改良 L=145m、橋梁復旧	C	○					—	—	—	・復興交付金、社総交（復興）とも非該当 ・H28. 8月地元要望→車道橋要望は地元の総意 ・仮橋の暫定使用にあたり、県から受け継ぎ済 ・今後、通行量調査を実施の上、本設の可否検討を予定	—	153,117			仮橋利用（本設の可否検討） （H30～31年度 通行量調査を予定）								土地利用課		
	39		浦浜地区多目的広場整備事業 備	A=2,400㎡ トイレ、四阿、ベンチ、水飲み場等の整備	A	●	●	●	○		—	—	—	・復興交付金（一件審査）配分済 ・測量設計完了→第18回復興交付金で協議、配分済 ・工事施工中（～H30. 4月） ・指定管理5/1開始予定 ・地域でオープニングイベントの開催を検討	2,400	56,722			設計		工事							土地利用課	
	40	市	漁業集落防災機能強化事業 （浦浜地区・嵩上げ）	県道・主要地方道の背後地の嵩上げ	—	●	●	●	●	●	—	—	—	・復興交付金配分済 ・工事（H26. 12月～H29. 9月） ・H29. 9月完成	—	499,460	工事					●H29. 9月完了							水産課
	41		漁業集落防災機能強化事業 （浦浜地区・水産施設用地）	水産施設用地の整備	—	●	●	●	○		—	—	—	・復興交付金一部配分済 ・測量設計 H29. 3月完了済 ・工事（H29. 5月に延長）	3,770	46,700			設計		工事							水産課	
	42		漁業集落防災機能強化事業 （泊地区・水産施設用地）	水産施設用地の整備	—	●	●	●	○		—	—	—	・復興交付金一部配分済 ・測量設計 H29. 3月完了済 ・工事（H30. 6月に延長）	4,202	41,100		設計			工事							水産課	
	43	地域	雄滝・雌滝の遊歩道づくり	泊防集団地から雄滝・雌滝へ通じる遊歩 道づくり	—	—	—	—	—	—	●	●	●	・地域で継続して取組中 ・今後も1～2回/年の整備が行われる予定 ・地域主体の取組として定着	—	—	地域の取組												地域
	44		三陸駅～大王杉観光ルートづ くり	まちづくりの軸とする観光ルートづくり	—	—	—	—	—	—	○			・仮置き土砂の撤去後に本格検討 ・仮置き土砂は一部を除き撤去済	—	—			地域の取組										地域
	45	県	まちづくり連携道路整備事業 （主要地方道大船渡綾里三陸 線）	L=1,000m、W=6.0(10.0)m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	・H27 着工 ・H28 道路改良工、舗装工 ・H29. 9月完成	—	—	工事					●H29. 9月完了							土木C （復興まちづくり 課）
	46	地域	原っぱの整備	地域が主体となり被災跡地を原っぱとし て活用	—	—	—	—	—	—	○			・仮置き土砂の撤去後に本格検討 →ワークショップを踏まえ検討	2,000	—				地域の取組									地域
	47	県	まちづくり連携道路整備事業 （一般県道崎浜港線）	L=700m、W=6.0(10.0)m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	・H27 着工 ・H28 道路改良工、舗装工 ・H29. 9月完成	—	—	工事					●H29. 9月完了							土木C （復興まちづくり 課）
	48	地域	四阿の設置	鎮魂・憩場として未音崎（みねざき）湾 望台を整備	—	—	—	—	—	—	●	●	●	・地域において未音崎（みねざき）湾望台を整備済 ・適切な管理が継続されている	—	—	地域の取組 ●H27. 7月完了												地域
	49		商店街整備	さんりくの園跡地へ商業店舗を集積	—	—	—	—	—	—	●	●	●	・浦浜サイコー商店街として整備済 ・現在はイベント支援などの取組	—	—	地域の取組 ●H27. 7月完了												地域
	50		ポプラの樹広場の整備	※浦浜地区多目的広場として整備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※浦浜地区多目的広場として整備	—	—	●浦浜地区多目的広場へ振り替え											地域	
	51		結いの道	泊地区の集落を結ぶ歩道づくり	—	—	—	—	—	—	●	○		・ウッドチップの敷設を実施中（継続）	—	—			地域の取組										地域
	52		結っ小屋	地域の小さな拠点（集会所）づくり	—	—	—	—	—	—	●	●	●	・H27年度に建設（移設）済 ・適切な管理が継続されている	—	—	●H27. 4月完了												
崎 浜	53	市	コミュニティ広場の整備	憩いや交流の場としての広場整備	—	●	—	—	—	—	—	—	・用地確保ができず取りやめ ・取りやめは地域と協議済 ・旧小学校跡地への機能配置を検討予定	—	—	※取りやめ（用地集約不可能）												土地利用課	
	54		消防屯所の整備箇所検討	旧崎浜小学校校庭への整備検討	A	●	○	●			—	—	—	・仮設住宅は撤去済 ・用地測量 H29. 12月完了 ・H30年度工事に向け財源調整中	—	未定			検討（地域調整）		測量	（工程再調整）							消防署
	55	地域	コミュニティ広場の維持管理	広場の維持管理	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※取りやめ （機能移設により再検討を予定）	—	—	※取りやめ（用地集約不可能）												地域
	56		浜らいんの運営	地域集会施設の運営	—	—	—	—	—	—				・適切な管理が継続されている （旧小学校への移設を検討予定）	—	—	地域の取組												地域
	57	市	漁業集落防災機能強化事業 （水産施設用地・集落道）	水産施設用地・集落道の整備	—	●	●	●	○		—	—	—	・復興交付金一部配分済 ・H29. 3月 一期工事完了 現在、二期工事中	3,772	—	設計	工事											
全 地 区	58	市	移転元地の譲渡・貸付	防集買取地の譲渡・貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	・買取済 796筆 235,685㎡ ・譲渡貸付 160筆 51,394㎡（約22%） ・民有地を含めた被災跡地の有効活用に取組中	51,394	—			段階的に公募→譲渡貸付											土地利用課

活用する（予定を含む）移転元地（㎡）

計

136,809

被災跡地（防集買取地）の譲渡・貸付け状況

平成30年3月31日現在

地区		買取状況						土地利用の状況								未利用・未活用の状況					
		買取対象		買取予定		買取済 A		譲渡 ①		貸付 ②		土地利用 ③		合計 B ①+②+③		公募 ④		調整中 ⑤		合計 A－B ④+⑤	
		筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）	筆数	面積（㎡）
土地利用方針図の改定を行う12地区	大船渡	75	17,307	75	17,307	72	15,715	3	211	12	2,754	19	3,622	34	6,587	12	3,851	26	5,277	38	9,128
	下船渡																				
	細浦	85	25,798	85	25,798	83	24,963	3	717	22	5,870	9	3,176	34	9,763	34	10,990	15	4,210	49	15,200
	小河原	161	43,460	161	43,460	161	43,460			9	5,491	87	20,161	96	25,652	53	13,394	12	4,414	65	17,808
	泊里																				
	基石	16	7,140	16	7,140	13	5,246			2	855	1	515	3	1,370	4	1,634	6	2,242	10	3,876
	赤崎	189	56,631	189	56,631	167	50,629			54	19,246	2	478	56	19,724	17	4,689	94	26,216	111	30,905
	綾里	65	16,362	65	16,362	65	16,362	1	230	5	1,225	25	6,585	31	8,040	23	5,701	11	2,621	34	8,322
	泊	27	13,447	27	13,447	27	13,447	2	416	3	2,639	9	4,994	14	8,049	13	5,398			13	5,398
	甫嶺	18	6,561	18	6,561	18	6,561			4	1,441			4	1,441	7	2,639	7	2,481	14	5,120
	浦浜	106	36,960	106	36,960	105	36,854	1	250	5	1,349	13	6,338	19	7,937	12	3,860	74	25,057	86	28,917
	崎浜	39	9,879	39	9,879	39	9,879			14	3,815	15	3,832	29	7,647	6	878	4	1,354	10	2,232
	小 計	781	233,545	781	233,545	750	223,116	10	1,824	130	44,685	180	49,701	320	96,210	181	53,034	249	73,872	430	126,906
その他の地区	盛	11	2,247	11	2,247	11	2,247	5	981	1	99			6	1,080	3	569	2	598	5	1,167
	赤土倉																				
	蛸ノ浦	33	9,617	33	9,617	30	9,044			14	3,806			14	3,806	15	4,824	1	414	16	5,238
	長崎																				
	合足																				
	小路																				
	野々前・白浜																				
	砂子浜																				
	小石浜	1	516	1	516	1	516									1	516			1	516
	小壁																				
	吉浜	4	763	4	763	4	763											4	763	4	763
	扇洞																				
	根白																				
	千歳																				
	小 計	49	13,143	49	13,143	46	12,570	5	981	15	3,905	0	0	20	4,886	19	5,909	7	1,775	26	7,684
合 計		830	246,688	830	246,688	796	235,686	15	2,805	145	48,590	180	49,701	340	101,096	200	58,943	256	75,647	456	134,590

※ 土地利用の主な事業
 大船渡地区……津波復興拠点事業
 細浦地区……広場整備事業
 小河原地区……産業用地整備事業
 綾里地区……漁業集落防災強化事業
 泊地区……漁業集落防災強化事業
 浦浜地区……漁業集落防災強化事業、広場整備

貸付内訳
 工事関係 106件
 工事以外 39件

土地利用計画に位置付けた事業の状況写真

1 地ノ森地区 内水排水対策事業（No.1）施工中



2 細浦地区 コミュニティ広場の整備（No.4）測量設計中



3 小河原地区 産業用地の整備（No.10）完成済



4 泊里・碁石地区 浜の暮らし体験ゾーン・駐車場の整備（No.13）施工中



- 5 綾里地区 緑化広場の整備（No.20）検討中 ※赤枠
綾里地区 漁業集落防災機能強化事業（No.25）施工中 ※青枠



- 6 綾里地区 市道港田浜線道路改良事業（No.24）検討中



- 7 住民協働による拠点の検討・運営（旧甫嶺小学校校舎の利活用：No.29）検討中



- △ 教室
▽ 左側から体育館、廊下、教室



- 8 浦浜地区 多目的広場整備事業（No.39）完成

