

■大船渡市復興計画事業（主要事業）スケジュール（事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。）

※ _____ は、前回作成時（平成27年12月31日現在）以後における変更箇所。（平成28年3月31日現在）

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 ※工事等が終了している箇所については網かけをしています。	平成24年度		平成25年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度以降	
				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺（大船渡町：33.8ha）		●都市計画決定	●都市計画変更	●事業計画第1回変更				●事業計画第2回変更														
				測量	道路等設計・換地設計等	仮換地手続き	仮換地指定（段階的に実施）																		
							移転・補償・造成工事（●仮換地手続きの進捗により段階的に実施）																		
							●造成工事の進捗により段階的に建物建設																		
			用地取得																						
津波復興拠点整備事業	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備	市	大船渡地区周辺（大船渡町：7.7ha） 〔土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha〕		●事業計画決定	●都市計画決定	●都市計画変更	●事業計画変更																	
						先行地区用地取得	基本設計				津波復興拠点施設				詳細設計				●建設						
						造成工事（●完了）	●道路・交通広場工事																		
							●段階的に民間による商業施設等建設																		
						拡大地区用地取得（●完了）				盛土造成工事（●土地区画整理事業により段階的に実施）															
				●段階的に民間による商業施設等の建設																					
			その他地区		導入地区検討・事業計画策定																				
防災集団移転促進事業	居住に適當でないと認められる区域内にある住居の集団移転の促進 ※すべての防災集団移転促進事業実施予定地区において、事業実施に係る国土交通大臣の同意を得ています。（366戸）	市	大船渡地区（大船渡町）：18戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			峰岸地区（末崎町）：21戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			神坂地区（末崎町）：9戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			細浦地区（末崎町）：13戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			小細浦地区（末崎町）：8戸	設計	造成工事（●完了）				●住宅建設																
			小河原地区①（末崎町）：35戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			小河原地区②（末崎町）：6戸	設計			造成工事（●完了）				●住宅建設														
			梅神地区①（末崎町）：10戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			梅神地区②（末崎町）：3戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			門之浜地区（末崎町）：13戸	設計	造成工事（●完了）				●住宅建設																
			泊里地区（末崎町）：17戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			佐野地区（赤崎町）：5戸	設計		造成工事（●完了）				●住宅建設															
			中赤崎【久保前】地区（赤崎町）：7戸	設計				住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設													
			中赤崎【駅周辺】地区（赤崎町）：5戸	設計				住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設													
			清水地区（赤崎町）：6戸	設計		造成工事（●完了）				●住宅建設				※「●住宅建設」には、敷地造成工事終了後の諸手続き期間を含みます。											
			永浜地区①（赤崎町）：1戸	設計		造成工事（●完了）				●住宅建設															
			蛸ノ浦地区（赤崎町）：16戸	設計				住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設													
			田浜地区（三陸町綾里）：12戸	設計		造成工事（●完了）				●住宅建設															
			港・岩崎地区（三陸町綾里）：23戸	設計		造成工事（●完了）				●住宅建設															
			泊地区（三陸町越喜来）：13戸	設計	造成工事（●完了）				●住宅建設																
			浦浜南地区（三陸町越喜来）：11戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			浦浜仲・西地区（三陸町越喜来）：10戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			浦浜東・南嶺地区（三陸町越喜来）：9戸	設計			住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設														
			崎浜地区（三陸町越喜来）：21戸	設計		住宅敷地造成工事（●完了）				●住宅建設															
			中赤崎【森っこ】地区（赤崎町）：34戸	設計							住宅敷地造成工事（着手済）													●住宅建設	
			中赤崎【洞川原】地区（赤崎町）：3戸	設計							住宅敷地造成工事（着手済）													●住宅建設	
			中赤崎【山口】地区（赤崎町）：10戸	設計							住宅敷地造成工事（着手済）													●住宅建設	
			永浜地区②（赤崎町）：27戸	設計							住宅敷地造成工事（着手済）													●住宅建設（工程再調整）	

※ _____は、前回作成時(平成27年12月31日現在)以後における変更箇所。

(平成28年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 ※工事等が終了している箇所については網かけをしています。	平成24年度		平成25年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度以降
				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備(801戸) ※泊里地区及び崎浜地区における敷地造成は、両地区それぞれの防災集団移転促進事業による住宅団地造成と一体(双方の造成地が隣接)で実施します。→よって、他地区と「工事」時期が異なります。	県 (511戸)	みどり町①(盛町):97戸		設計				建築工事					●入居済										
			上平(大船渡町):65戸	設計				建築工事					●入居済											
			沢田(赤崎町):20戸	設計					建築工事						●入居済									
			長谷堂(猪川町):53戸	設計				建築工事				●入居済												
			下欠(立根町):33戸	設計				建築工事				●入居済												
			清水(三陸町綾里):30戸	設計				建築工事				●入居済(随時募集中)												
			みどり町②(盛町):50戸		設計				建築工事							●入居								
			下館下(盛町):58戸			設計					建築工事							●入居						
			平林②(末崎町):55戸	設計						建築工事						●入居(手続中)								
			関谷(立根町):50戸	設計						建築工事						●入居(工程再調整)								
		市 (290戸)	盛中央(盛町):44戸	工事 ●入居済(随時募集中)																				
			宇津野沢(盛町):20戸	設計			建築工事			●入居済														
			田中東①(明神前①)(大船渡町):12戸	設計	建築工事		●入居済																	
			田中東②(明神前②)(大船渡町):7戸	設計			建築工事			●入居済														
			赤沢(大船渡町):23戸	設計			建築工事			●入居済														
			上山東(大船渡町):11戸	設計			建築工事			●入居済														
			川原(大船渡町):29戸				設計	建築工事				●入居済												
			平林①(末崎町):11戸	設計			建築工事			●入居済														
			蛸ノ浦(赤崎町):14戸			設計		敷地造成工事	建築工事				●入居済											
			所通(三陸町越喜来):20戸				設計			建築工事				●入居済										
			土地区画整理地区(大船渡町):50戸						設計			建築工事						●入居						
			泊里(末崎町):6戸			設計					敷地造成工事				建築工事	●入居								
			大洞(赤崎町):9戸						設計						建築工事	●入居								
			後ノ入(赤崎町):4戸						設計						建築工事	●入居								
			山口(赤崎町):13戸						設計				建築工事			●入居(工程再調整)								
			杉下(三陸町越喜来):9戸				設計								建築工事	●入居								
			崎浜(三陸町越喜来):8戸			設計				敷地造成工事					建築工事	●入居								
地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援(うち4地域公民館:中央通・内田・小河原・佐野地域については、右記とは別にコンテナハウスなどにより整備支援済)	地 域 公 民 館 市	北笹崎公民館(大船渡町)		設計	工事	●使用開始済																	
			平地域公民館(大船渡町)	工事	●使用開始済																			
			神坂地域公民館(末崎町)	工事	●使用開始済																			
			小細浦地域公民館(末崎町)	設計			工事	●使用開始済																
			門之浜地域公民館(末崎町)								工事	●使用開始済												
			港地域公民館(三陸町綾里)		工事	●使用開始済																		
			岩崎地域公民館(三陸町綾里)	設計	工事	●使用開始済																		
			石浜多目的集会施設(三陸町綾里)	工事	●使用開始済																			
			浦浜西区公民館(三陸町越喜来)				工事	●使用開始済																
			泊地域公民館(三陸町越喜来)					工事	●使用開始済															
			山口地域公民館(赤崎町)									設計	工事			●使用開始(工程再調整)								
			永沢地域公民館(大船渡町)												設計	工事	●使用開始							
			西館地域公民館(末崎町)										造成・設計	工事		●使用開始(工程再調整)								
			宿地域公民館(赤崎町)													設計	工事	●使用開始(新規掲載)						
			その他地域公民館	設計												工事	※完成次第使用開始							
地域防災コミュニティセンター整備事業	被災したむらづくり研修施設などを防災機能を備えたコミュニティ施設として整備	市	清水地域防災コミュニティセンター(赤崎町)									測量・調査設計		敷地造成工事・建築工事		●使用開始								
			合足地域防災コミュニティセンター(赤崎町)								設計	敷地造成工事・建築工事			●使用開始(工程再調整)									
			田浜地域防災コミュニティセンター(三陸町綾里)									設計		建築工事		●使用開始(工程再調整)								
			甫嶺地域防災コミュニティセンター(三陸町越喜来)									設計	敷地造成工事・建築工事		●使用開始									

※ _____は、前回作成時(平成27年12月31日現在)以後における変更箇所。

(平成28年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 ※工事等が終了している箇所については網かけをしています。	平成24年度		平成25年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度以降														
				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月															
被災学校移転改築事業	津波により被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	赤崎小学校	設計							敷地造成工事・建築工事								●使用開始																			
			赤崎中学校	設計							敷地造成工事・建築工事								●使用開始																			
			越喜来小学校	設計			敷地造成工事・建築工事										●H28.11月使用開始																					
公立社会教育施設復旧事業	被災した公立社会体育施設の修繕など	市	市民体育館	設計		工事(●完了) ●使用開始済																																
			体育センター	設計 工事(●完了)	●使用開始済																																	
			市民テニスコート	設計 工事(●完了)	●使用開始済																																	
			市民弓道場	設計 工事(●完了)	●使用開始済																																	
			田中島グラウンド		設計	廃棄物除去 (使用期間)				建築工事				●使用開始済																								
			三陸体育館	設計 工事●完	●使用開始済																																	
			三陸総合運動公園グラウンド	設計	←(使用期間)→ 工事(●完了) ●使用開始済																																	
			綾里小学校校庭夜間照明施設	設計 工事(●完了)	●使用開始済																																	
			三陸公民館	設計	建築工事(着手済)				●使用開始済																													
市営球場	※応急仮設住宅撤去後着手【時期未定】																																					
漁業集落防災機能強化事業	地盤のかさ上げ	市	浦浜地区(三陸町越喜来)			測量・調査設計																																
	水産用地造成、集落道整備など		泊地区(三陸町越喜来)														測量・調査設計	敷地造成等	(工程再調整)																			
			崎浜地区(三陸町越喜来)														測量・調査設計	敷地造成等	(工程再調整)																			
			港・田浜・石浜・小石浜地区(三陸町綾里)														測量・調査設計	敷地造成等	(工程再調整)																			
水産業共同利用施設復興整備事業	民間団体が行う機器類、生産流通加工施設など共同利用施設の整備に対する補助	民間団体	水産流通加工施設整備支援	公募 施設等整備	公募 施設等整備		公募 施設等整備																															
			設備導入等支援	公募 設備導入等	公募 設備導入等実施	公募 設備導入等実施																																
新大船渡魚市場整備事業	新大船渡魚市場施設及び関連施設の整備(手戻り復旧工事を含む)	市	新大船渡魚市場(埋立埠頭部)	建設工事(●完了)				●使用開始済																														
			新大船渡魚市場関連施設(製氷施設等)	建設工事(●完了)				●使用開始済																														
			新大船渡魚市場(南側岸壁上屋)			測量調査設計				解体工事	建設工事								●使用開始済																			
漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設)	被災した岸壁・臨港道路など漁港施設の復旧	県	根白漁港	漁港災害復旧工事(●完了)													●使用開始済																					
			崎浜漁港	漁港災害復旧工事(●完了)														●使用開始済																				
			越喜来漁港	漁港災害復旧工事(●完了)														●使用開始済																				
			綾里漁港	漁港災害復旧工事(●完了)														●使用開始済																				
			門の浜漁港	漁港災害復旧工事(●完了)														●使用開始済																				
			大船渡漁港	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済																																		
		市	泊里漁港	漁港災害復旧工事(●完了)														●使用開始済																				
			碁石漁港	設計	漁港災害復旧工事(●完了)							●使用開始済																										
			合足漁港	設計	漁港災害復旧工事(●完了)											●使用開始済																						
			小路漁港	設計	漁港災害復旧工事(●完了)											●使用開始済																						
			小石浜漁港	漁港災害復旧工事(●完了)													●使用開始済																					
			鬼沢漁港	漁港災害復旧工事(●完了)								●使用開始済																										
			泊漁港	設計	漁港災害復旧工事(●完了)												●使用開始済																					
			鵜洞漁港	設計	漁港災害復旧工事(●完了) ●使用開始済				※工種ごとに完成箇所から使用開始				●使用開始済																									
			小壁漁港		漁港災害復旧工事(●完了)				●使用開始済				●使用開始済																									
			千歳漁港	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済																																		
			吉浜漁港	設計	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済																																	
			増館漁港	設計	漁港災害復旧工事(着手済)													(工程再調整)																				
			砂子浜漁港	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済													(工程再調整)																					
			野野前漁港	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済																																		
			長崎漁港	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済													(工程再調整)																					
			蛸ノ浦漁港	漁港災害復旧工事(着手済) ●一部使用開始済																																		

※ _____は、前回作成時(平成27年12月31日現在)以後における変更箇所。

(平成28年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 ※工事等が終了している箇所については網かけをしています。	平成24年度		平成25年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度以降		
				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
漁港関係施設等復旧事業 (漁港海岸施設)	被災した防潮堤など漁港海岸施設の復旧	県	崎浜漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事(着手済)																				
			越喜来漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事(着手済)																				
			綾里漁港海岸	設計								防潮堤復旧工事														
			大船渡漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事(着手済)																			
			門の浜漁港海岸	設計		防潮堤復旧工事(着手済)																				
		市	吉浜漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事(着手済)																			
			泊漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事(着手済)																			
			小石浜漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事(着手済)																			
			野野前漁港海岸	設計			防潮堤復旧工事(着手済)																		(工程再調整)	
蛸ノ浦漁港海岸	設計								防潮堤復旧工事(着手済)																	
基石漁港海岸	設計								防潮堤復旧工事(着手済)																	
泊里漁港海岸	設計													防潮堤復旧工事									(工程再調整)			
漁港施設機能強化事業	地盤沈下被害を受けた16漁港の用地のかさ上げ	市	基石漁港	設計	工事	●使用開始済																				
			長嶺漁港	設計	用地かさ上げ工事											●使用開始済										
			合足漁港	設計	用地かさ上げ工事											●使用開始済										
			小路漁港	設計					用地かさ上げ工事							●使用開始済										
			小石浜漁港	設計	用地かさ上げ工事											●使用開始済										
			鬼沢漁港	設計	用地かさ上げ工事								●使用開始済													
			泊漁港	設計						用地かさ上げ工事							●使用開始済									
			増館漁港	設計						用地かさ上げ工事							●使用開始済									
			小壁漁港	設計						用地かさ上げ工事							●使用開始済									
			扇洞漁港	設計	工事	●使用開始済																				
			千歳漁港	設計		用地かさ上げ工事										●使用開始済										
			吉浜漁港	設計						用地かさ上げ工事(着手済)				※完成箇所から 使用開始												
			砂子浜漁港	設計	用地かさ上げ工事(着手済)																					
			野野前漁港	設計	用地かさ上げ工事(着手済)																					
			蛸ノ浦漁港	設計	用地かさ上げ工事(着手済)																					
			泊里漁港	設計	用地かさ上げ工事(着手済)				●一部使用開始済																	
海岸保全施設復旧・整備事業 (一般海岸・港湾海岸)	被災した防潮堤など一般海岸・港湾海岸施設の復旧及び整備	県	盛川(塩場)	設計	堤防かさ上げ工事(着手済)																					
			須崎川	設計			水門整備工事																			
			後の入川	設計										水門整備工事												
			越喜来海岸	設計	防潮堤復旧工事(着手済)																					
			下甫嶺海岸	設計	防潮堤復旧工事(着手済)																					
			野々田地区海岸	設計			防潮堤整備工事																			
			大船渡港海岸	設計	防潮堤復旧工事(着手済)																					
海岸保全施設復旧事業 (農地海岸)	被災した防潮堤など農地海岸施設の復旧	県	沖田海岸	設計	工事	●完了																				
			吉浜海岸	設計	防潮堤復旧工事(着手済)																					
			合足海岸	設計	防潮堤復旧工事(着手済)										●完了											
農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場などを整備	県	吉浜地区		設計	工事(区画整理)(着手済)				工事(舗装・補完工事)																
								●営農(一部営農再開)																		
					換地原案作成											確定測量					換地処分					
			吉浜大野地区			設計	工事(区画整理)(着手済)				工事(補完工事)															
						通常営農								●営農(一部営農再開)												
			換地原案作成										確定測量								換地処分(工程再調整)					



※ _____ は、前回作成時(平成27年12月31日現在)以後における変更箇所。(平成28年3月31日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 ※工事が終了している箇所については網かけをしています。	平成24年度		平成25年度		平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度以降	
				4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
道路新設・改良事業	高台や防災拠点へのアクセス道路、災害時の避難路、緊急車両が進入できない狭隘道路、地盤沈下により冠水する道路、浸水区域内のまちづくりと一体となった道路などの整備	県	県道崎浜港線（三陸町越喜来）	設計						用地買収・道路改良工事												●使用開始			
			主要地方道大船渡綾里三陸線（三陸町越喜来）	設計						用地買収・道路改良工事												●使用開始			
			主要地方道大船渡綾里三陸線（赤崎町）		設計						用地買収・道路改良工事														
			主要地方道大船渡広田陸前高田線（末崎町）	設計							用地買収・道路改良工事														
			県道基石海岸線（末崎町）	設計							用地買収・道路改良工事														
		市	小細浦中野線	設計		道路改良工事				●使用開始済															
			平林大田線	設計		工事		●使用開始済																	
			沢田宮野線	設計		道路改良工事				●使用開始済															
			山田線	工事 設計		道路改良工事（●完了）				●使用開始済															
			道合大久保線	設計 工事	設計	道路改良工事（●完了）				●使用開始済															
			永沢線	設計						道路改良工事（着手済）														●改良次第使用開始	
			吉浜漁港線	設計		道路改良工事（着手済）															●使用開始				
			富岡線			道路改良工事（着手済）															●使用開始				
			道路新設事業（小河原地区）		設計						用地買収・道路新設工事													●使用開始	
野々田川口橋線				設計					用地買収・道路新設工事													●完成後使用開始			
その他路線（防災集団移転促進事業関連道路等）	設計																								
		防災集団移転促進事業などと調整しながら道路工事を完了 ※完成次第使用開始																							
防災センター整備事業	防災拠点施設である防災センターの整備	市	盛町下館下地区	建設用地選定		測量・調査設計／用地買収				敷地造成工事・建築工事											●使用開始				
消防庁舎（三陸分署綾里分遣所本庁舎）復旧整備事業	津波で全壊した三陸分署綾里分遣所本庁舎の復旧	市	綾里地区	建設用地選定		測量・調査設計／埋蔵文化財調査				実施設計				建設工事	移設 開始 準備	●使用開始（6月1日）（工程再調整）									
コミュニティ消防センター新築事業	地区の防災拠点施設である消防屯所の建設	市	1分団4部（盛町田茂山）				測量・調査設計				建設工事 ●使用開始済														
			2分団1部（大船渡町茶屋前）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			2分団3部（大船渡町笹崎）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			3分団1部（大船渡町下平）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			4分団1部（末崎町細浦）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			4分団5部（末崎町泊里）					測量・調査設計				建設工事 ●使用開始済													
			5分団2部（赤崎町蛸ノ浦）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			6分団2部（赤崎町中赤崎）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			11分団1部（三陸町越喜来南嶺）					測量・調査設計				建設工事 ●使用開始済													
			11分団4部（三陸町越喜来浦浜）			測量・調査設計								建設工事		●使用開始済									
			2分団2部（大船渡町新田）															測量・調査設計	建設工事		●使用開始				
			3分団3部（大船渡町永沢）															測量・調査設計	建設工事		●使用開始				
			4分団4部（末崎町小中井）																測量・調査設計	建設工事		●使用開始			
			5分団3部（赤崎町清水）					測量・調査設計											建設工事		●使用開始				
			6分団1部（赤崎町永浜）											測量・調査設計					建設工事		●使用開始				
			10分団2部（三陸町綾里田浜）																測量・調査設計	建設工事		●使用開始			
			11分団3部（三陸町越喜来泊）																測量・調査設計	建設工事		●使用開始			
11分団6部（三陸町越喜来崎浜）																	測量・調査設計	建設工事		●使用開始					
湾口防波堤復旧事業	大船渡湾の水質に配慮した構造による湾口防波堤の復旧	国	大船渡港湾湾口防波堤	湾口防波堤災害復旧工事（着手済）																●完了					

担当: 災害復興局復興政策課 電話0192-27-3111(内線353)

■ 事業実施(予定)地区位置図 (土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業・防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業)

(平成28年3月31日現在)

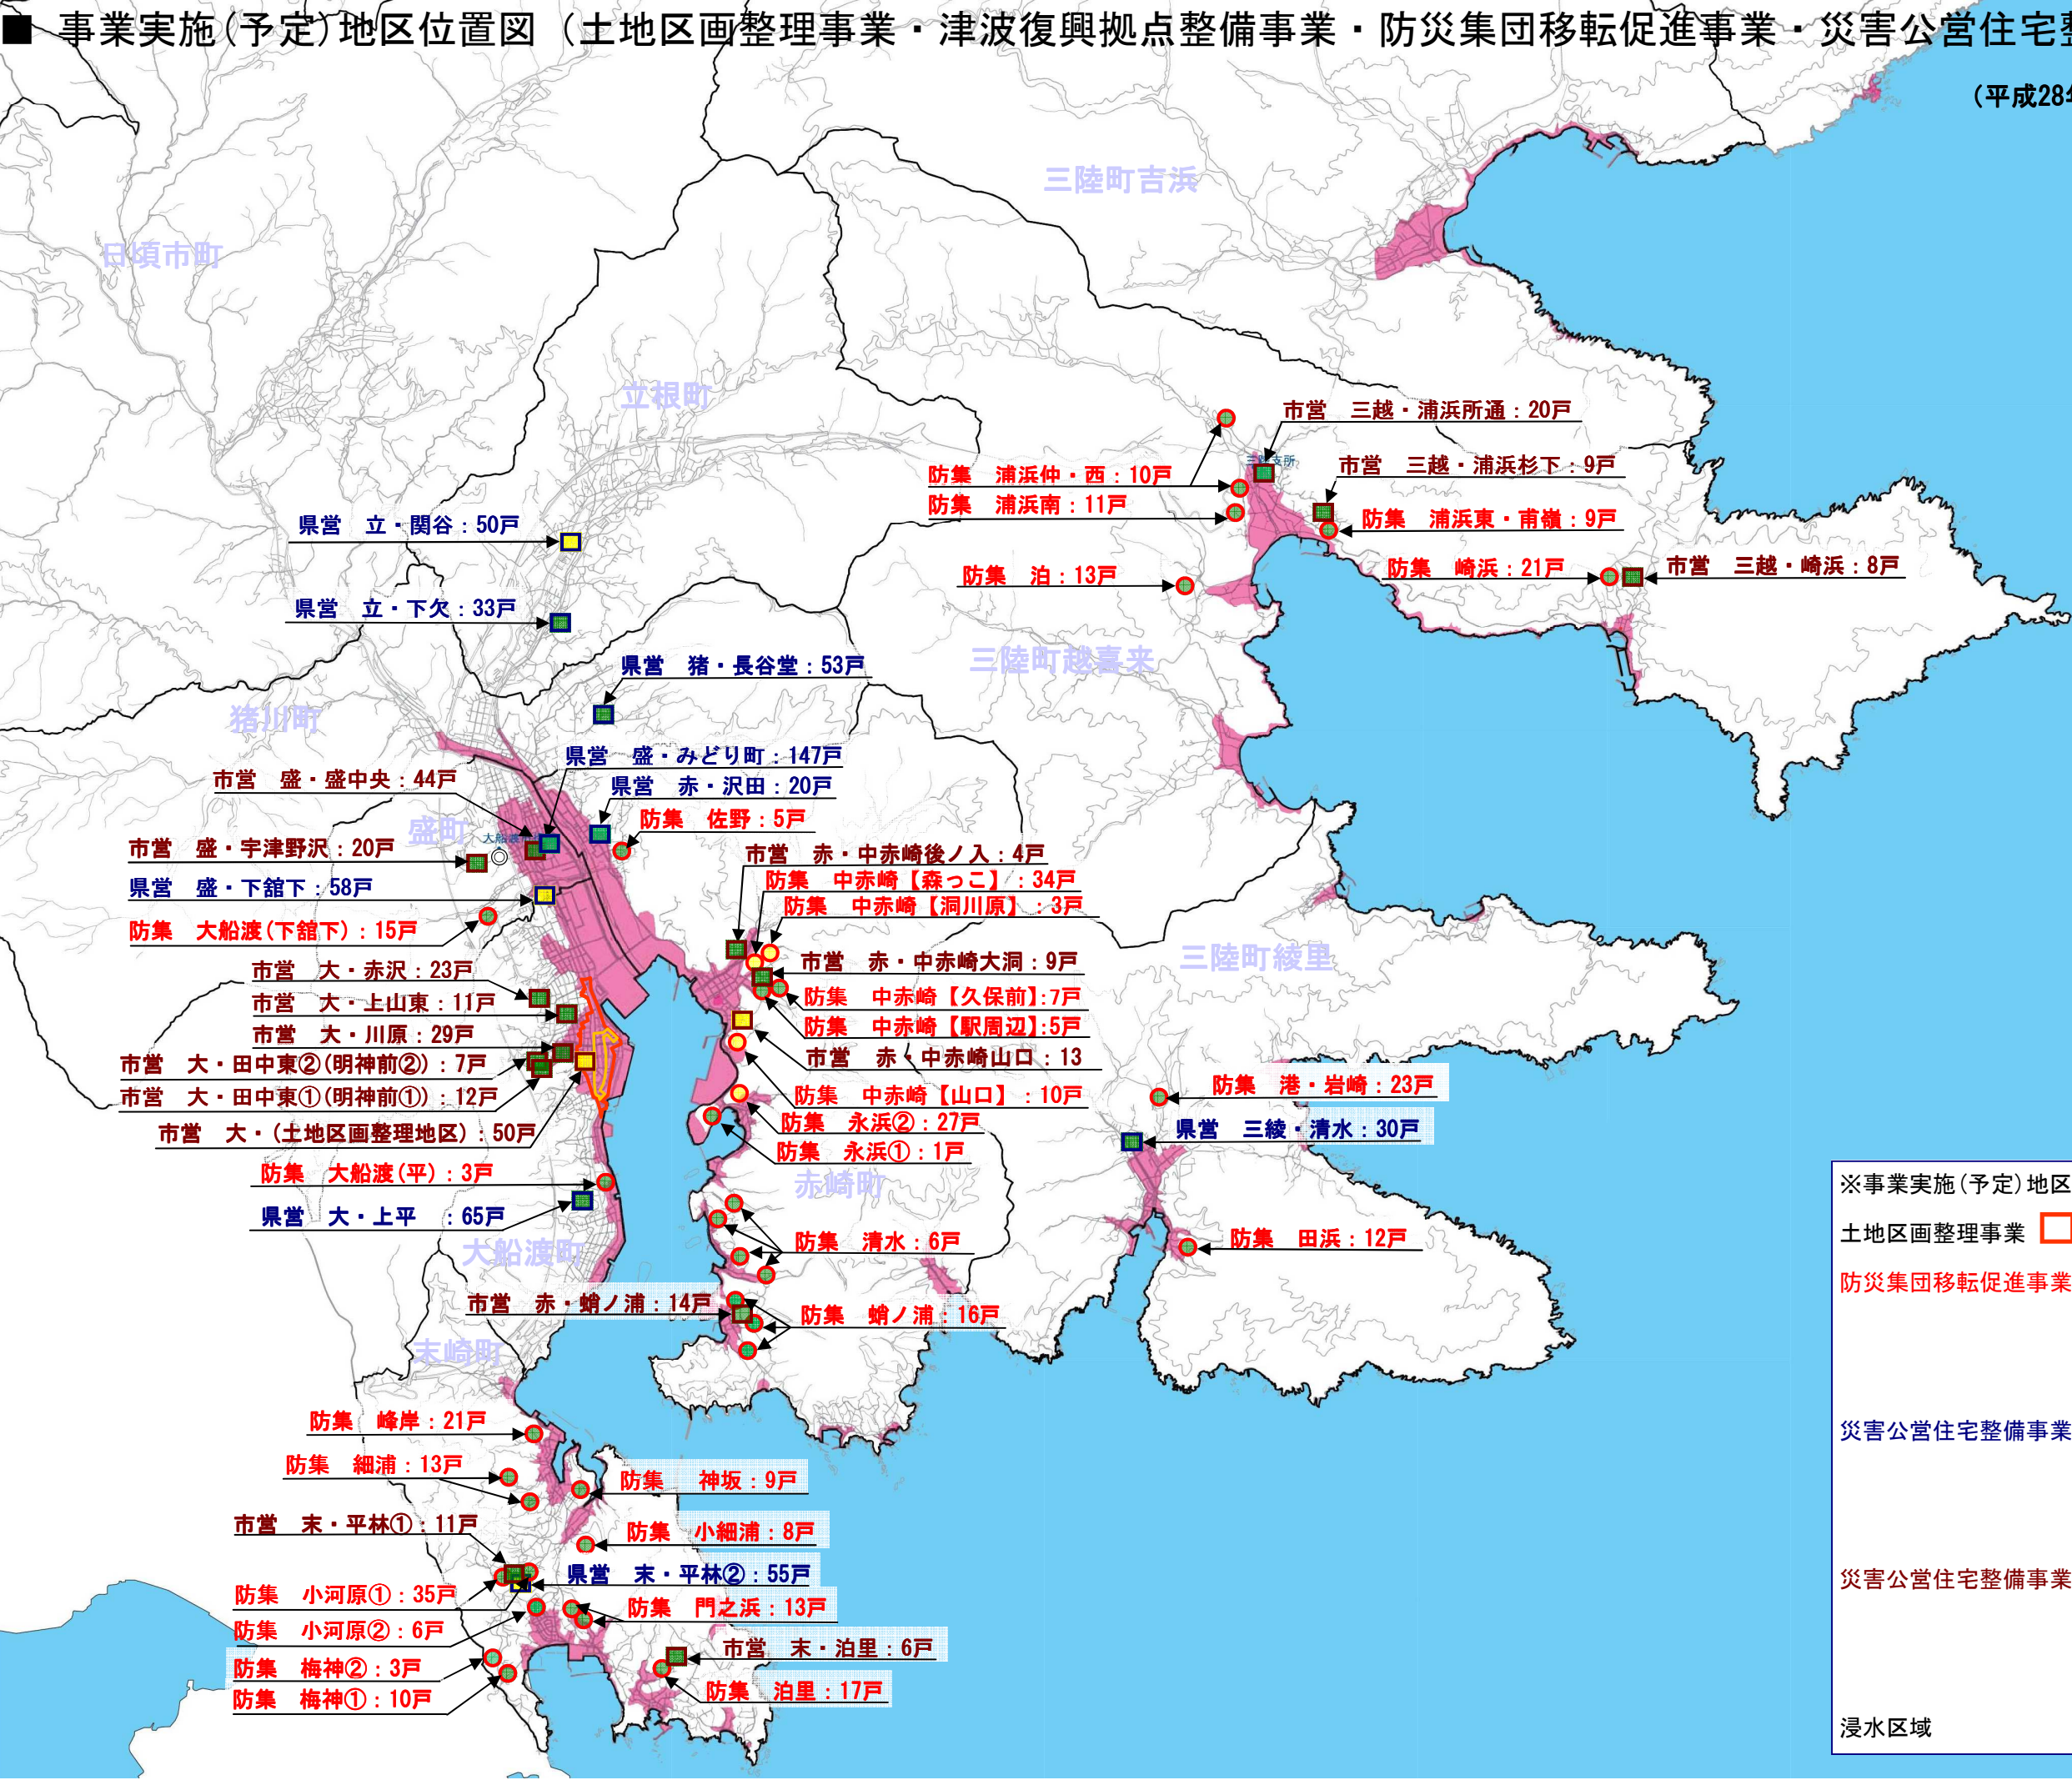

※事業実施(予定)地区は、変更・増減する場合があります。

土地区画整理事業  津波復興拠点事業 

防災集団移転促進事業

-  : 住宅敷地造成工事完了
-  : 住宅敷地造成工事着手
-  : 測量・調査設計中

災害公営住宅整備事業(県営)

-  : 建築工事完了
-  : 建築工事中
-  : 測量・設計中

災害公営住宅整備事業(市営)

-  : 建築工事完了
-  : 建築工事中
-  : 測量・設計中

浸水区域 
