


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成28年3月31日現在


[1] 事業の進捗状況

進捗状況		事業数	
実施済		97	
着手済	(1)	155	37
	(2)		47
	(3)		11
	(4)		60
検討中		3	
未着手		2	
計		257	
整理・統合等		17	

[1]

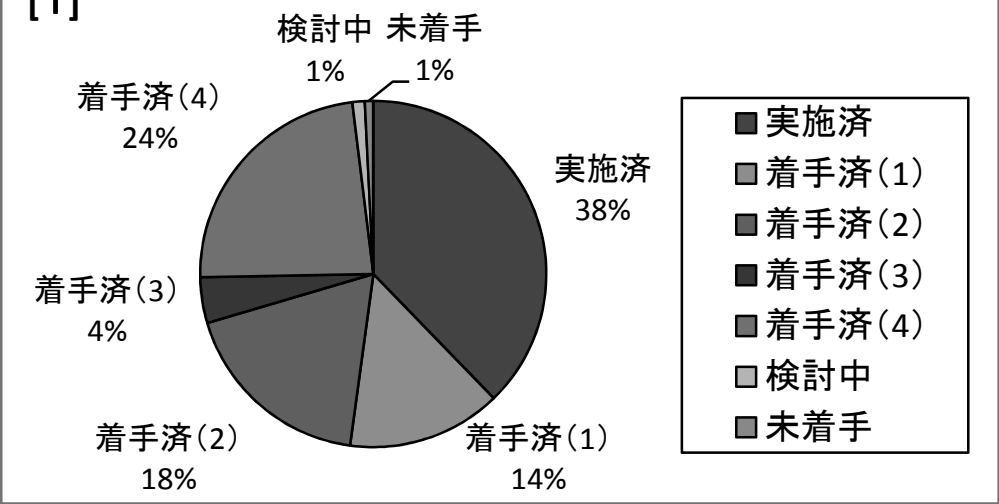

[2]

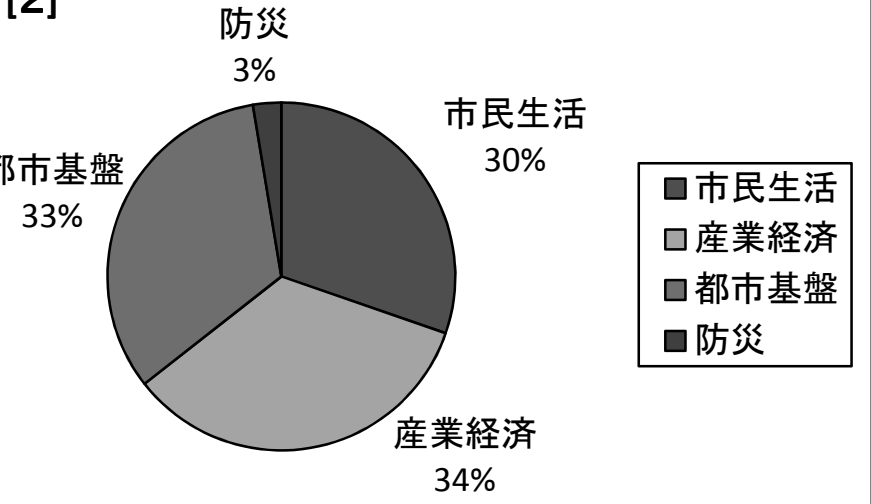

※着手済の細分類

- (1) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開し、既に軌道に乗っているもの⇒(実質的に実施済)
- (2) 震災後からの事業で、既に軌道に乗り、単年度の繰り返しで、今後も継続するもの
- (3) 震災前からの事業で、震災により中断後、再開したものの、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの
- (4) 震災後からの事業で、まだ完成(完了)していないもの、若しくは軌道に乗っていないもの

[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	全体計画 (百万円)															
	事業費	財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	121,160	49,811	23,589	2,342	33,640	11,778	18,411	20,161	24,057	12,294	15,150	23,537	5,488	1,494	284	284
産業・経済の復興	136,447	48,404	61,999	3,473	15,862	6,709	8,104	17,748	31,181	22,134	37,551	12,776	5,530	477	475	471
都市基盤の復興	131,901	27,406	66,268	4,717	24,691	8,819	3,922	10,240	17,575	34,367	38,012	15,250	7,407	2,952	1,270	906
防災まちづくり	10,435	2,157	24	93	6,366	1,795	131	2,152	2,415	4,554	529	318	171	55	55	55
合 計	399,943	127,778	151,880	10,625	80,559	29,101	30,568	50,301	75,228	73,349	91,242	51,881	18,596	4,978	2,084	1,716
	復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)						156,097 (39.0%)			216,472 (56.6%)			27,374 (4.4%)			
(H27.12.31現在)	410,769	123,732	155,940	10,004	89,754	31,339	30,568	50,301	75,231	76,725	121,064	38,590	10,114	4,775	2,120	1,281
	復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)						156,100 (38.0%)			236,379 (57.6%)			18,290 (4.5%)			

★事業費による進捗状況 (平成23年度～平成27年度) → : 320,688百万円÷総事業費 : 399,943百万円=80.2%

■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 4 5 8 億円	・漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設) 7 2 8 億円	・港湾施設復旧事業 3 7 6 億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 6 0 億円
・防災集団移転促進事業 1 9 7 億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 1 1 8 億円	・湾口防波堤復旧事業 2 0 0 億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 1 4 億円
・災害公営住宅整備事業 1 7 1 億円	・水産業共同利用施設復興整備事業 8 5 億円	・土地区画整理事業 1 9 1 億円	・防災行政無線整備事業 1 1 億円
