
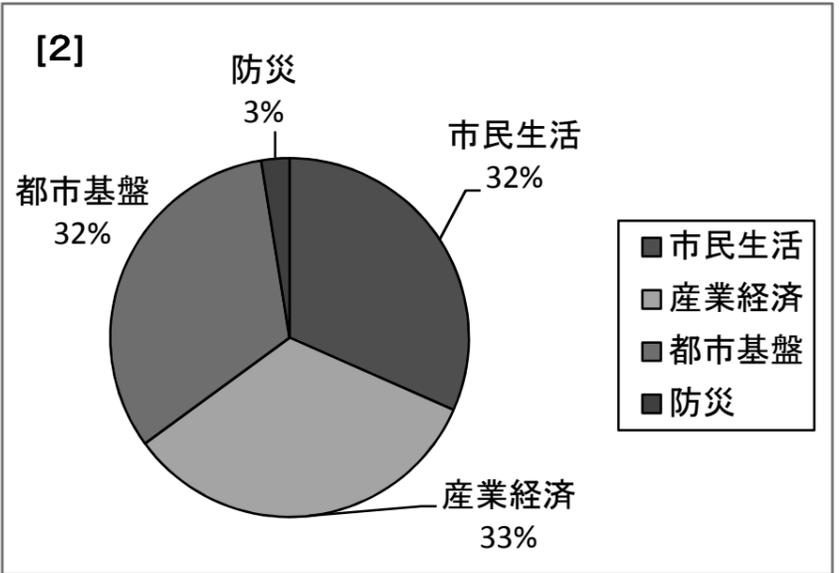


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成27年9月30日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	3
検討中	2
着手済	162
実施済	90
計	257
整理・統合等	17

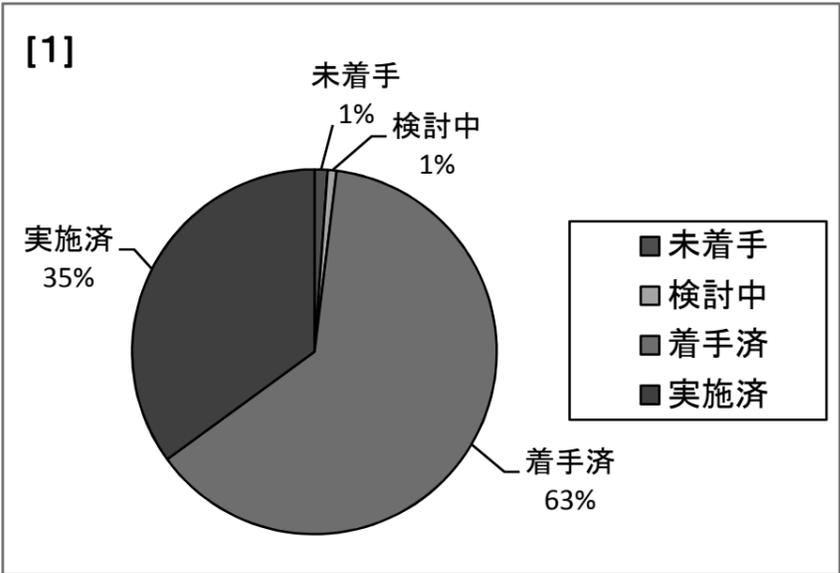

[2] 事業費の内訳 (※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	129,887	48,871	23,373	1,897	42,441	13,305	18,411	20,161	24,060	15,769	39,836	7,759	2,067	1,254	285	285
産業・経済の復興	136,967	44,996	66,250	3,113	15,957	6,651	8,104	17,748	31,197	23,817	39,454	14,718	516	473	471	469
都市基盤の復興	133,600	27,904	66,268	4,801	24,952	9,675	3,922	10,240	17,575	34,254	39,821	15,555	7,466	2,990	1,306	471
防災まちづくり	10,467	2,160	21	111	6,355	1,820	131	2,152	2,415	4,554	765	226	56	56	56	56
合計	410,921	123,931	155,912	9,922	89,705	31,451	30,568	50,301	75,247	78,394	119,876	38,258	10,105	4,773	2,118	1,281
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					156,116 (38.0%)			236,528 (57.6%)			18,277 (4.4%)			
(H27.3.31現在)	409,553	123,845	148,322	10,271	98,355	28,760	30,568	50,301	75,428	79,347	114,902	42,084	8,060	5,414	2,193	1,256
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					156,297 (38.2%)			236,333 (57.8%)			16,923 (4.1%)			

★事業費による進捗状況 (平成23年度～平成26年度) → : 234,510百万円 ÷ 総事業費 : 410,921百万円 = 57.1%

■ 主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・ 災害廃棄物処理事業 458億円	・ 漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設) 728億円	・ 港湾施設復旧事業 376億円	・ 再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・ 防災集団移転促進事業 197億円	・ 共同利用漁船等復旧支援対策事業 118億円	・ 湾口防波堤復旧事業 200億円	・ 消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・ 災害公営住宅整備事業 171億円	・ 水産業共同利用施設復興整備事業 85億円	・ 土地区画整理事業 191億円	・ 防災行政無線整備事業 11億円
