
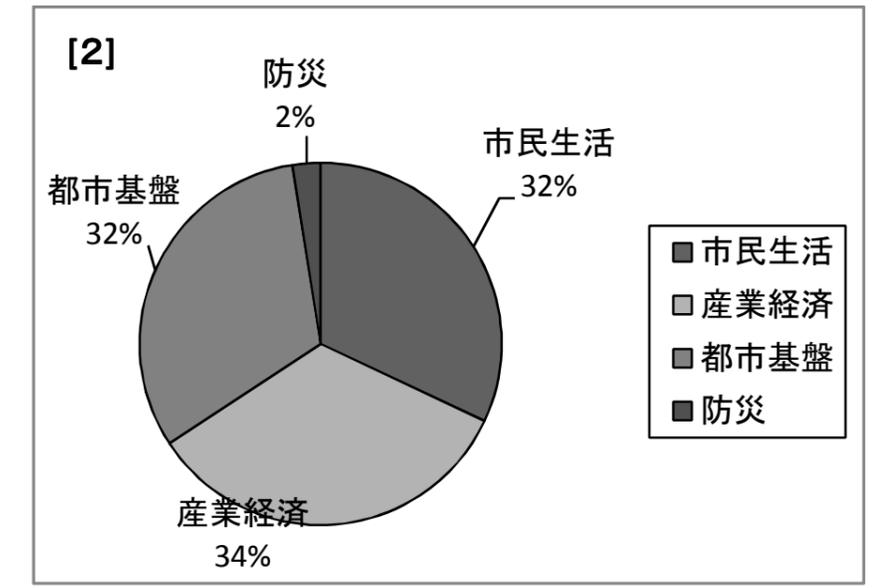


# 大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成25年6月30日現在

[1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	6
検討中	26
着手済	175
実施済	49
整理・統合等	13
計	269

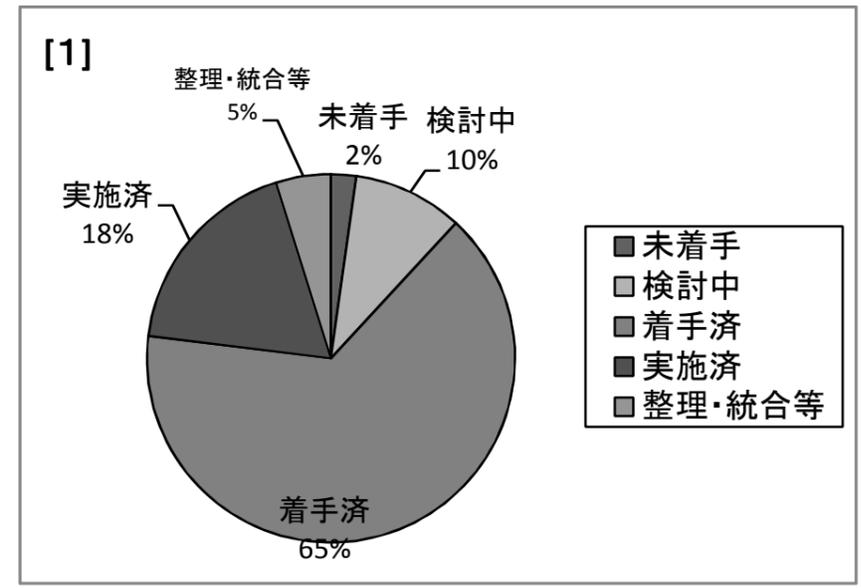

[2] 事業費の内訳 (※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	事業費	全体計画 (百万円)														
		財源内訳 (百万円)					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	135,123	49,845	21,906	7,955	46,717	8,700	19,109	20,426	39,112	32,512	20,594	1,583	502	491	423	371
産業・経済の復興	142,541	51,161	66,442	3,032	11,929	9,977	9,790	19,025	69,123	20,744	21,164	639	667	465	463	461
都市基盤の復興	133,971	28,384	54,258	4,438	34,318	12,573	3,919	10,382	23,285	41,103	38,268	8,405	6,442	1,289	580	298
防災まちづくり	10,605	2,452	1	107	6,294	1,751	131	2,152	2,765	4,930	363	71	47	47	47	52
合計	422,240	131,842	142,607	15,532	99,258	33,001	32,949	51,985	134,285	99,289	80,389	10,698	7,658	2,292	1,513	1,182
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					219,219 (51.9%)			190,376 (45.1%)			12,645 (3.0%)			
(H25.3.31現在)	355,913	159,423	50,685	15,756	94,177	35,872	35,814	77,496	100,268	61,252	56,006	11,054	6,192	3,237	2,417	2,177
		復興計画の期間別事業費 (全事業費に占める割合)					213,578 (60.0%)			128,312 (36.1%)			14,023 (3.9%)			

★事業費による進捗状況→(平成23年度事業費+平成24年度事業費) : 84.934百万円/総事業費 : 422.240百万円=20.1%

■主な事業

① 市民生活の復興	② 産業・経済の復興	③ 都市基盤の復興	④ 防災まちづくり
・災害廃棄物処理事業 472億円	・漁港関係施設等復旧事業 (漁港施設) 698億円	・港湾施設復旧事業 335億円	・再生可能エネルギー導入促進事業 60億円
・防災集団移転促進事業 252億円	・水産物等残渣処理事業 121億円	・湾口防波堤復旧事業 200億円	・消防救急無線施設・設備整備事業 14億円
・災害公営住宅整備事業 182億円	・共同利用漁船等復旧支援対策事業 120億円	・津波復興拠点整備事業 200億円	・防災行政無線整備事業 10億円
