

森林災害復旧事業等の実施状況について

1 被害状況

(1) 森林の被害面積及び被害額（令和 7 年 10 月 28 日公表）

- ① 被害面積 3,370.15ha
- ② 被害額 59 億 3,921 万 5 千円

2 激甚災害の指定

令和 7 年 3 月 28 日 激甚災害の指定（2 月 19 日、26 日発生 of 林野火災が対象）

3 森林災害復旧事業の概要

- (1) 激甚災指定された場合に適用される補助事業（対象：人工林）
- (2) 災害査定の内容

事業期間：令和 7 年度～令和 10 年度

事業区分	計画量	事業費(千円)
被災木の伐採及び搬出(ha)	1,248.66	6,952,819
跡地造林(ha)	1,279.19	4,688,291
作業路開設(m)	34,176	116,609
計	—	11,757,719

4 森林災害復旧事業等の実施状況（8/26 現在※）

※ 第 5 回大船渡市林地再生対策協議会（R8.5.28 開催）資料からの変更箇所は赤字で表示。

(1) 森林再生対策

① 森林災害復旧事業（担当：市）

事業区分	年度	施行場所	実施数量	実施区分
伐採搬出	R7	三陸町綾里字熊之入地内	市有林 19.37ha	完了
	R7(繰)	〃	市有林 3.47ha	実施中(R8.8 まで)
	R8	三陸町綾里字坂本地内	市有林 5.26ha	実施中(R9.1 まで)
		赤崎町字合足地内	私有林 14.94ha	実施中(R9.2 まで)
		三陸町綾里地内ほか	市有林 69.36ha 私有林 125.89ha	計画 (別紙のとおり)
跡地造林	R8	三陸町綾里字熊之入地内	市有林(スギ) 19.37ha	完了
		〃	市有林(防護柵) 10,018m	実施中(R8.12 まで)
		〃	市有林(スギ) 3.47ha	計画 (別紙のとおり)
	R9 以降	三陸町綾里地内ほか	市有林 69.36ha 私有林 125.89ha	計画 (別紙のとおり)
作業路開設	R7	—	実績なし	—
	R8	三陸町綾里地内ほか	私有林 6,146m	計画 (別紙のとおり)

② 森林整備事業（担当：県）

事業区分	年度	施行場所	実施数量	実施区分
伐採搬出	R8	三陸町綾里地内	私有林 3.00ha	計画

事業区分	年度	施行場所	実施数量	実施区分
跡地造林	R8	三陸町綾里地内	造林 6.50ha	計画
		三陸町綾里地内	防護柵 3,540m	計画
作業路開設	R8	-	計画なし	-
下刈り	R8	三陸町綾里地内	3.00ha	計画

③ いわて環境の森整備事業（森林環境再生造林）（担当：県）

事業区分	年度	施行場所	実施数量	実施区分
跡地造林	R8	三陸町綾里地内	造林(コナラ等) 1.89ha ※	完了
		〃	造林 3.99ha	実施中
		〃	防護柵 1,132m※	完了
		〃	防護柵 2,174m	実施中
作業路開設	R8	-	計画なし	-

※ 林野火災の被災区域内であるが、被災前に伐採作業が実施された箇所。

(2) 土砂流出対策

① 治山事業（担当：県）

区分		治山ダム等(箇所)	森林整備(ha)
災害関連緊急治山	計画	9 地区 10 施設	-
	うち完了 R7	3 地区 3 施設	-
	〃 R8	4 地区 4 施設	
防災林造成	計画	1 地区 2 施設	1 地区 7.50ha
林地荒廃防止	計画	1 地区 1 施設	-

② 砂防事業（担当：県）

区分		砂防堰堤等(箇所)
災害関連緊急砂防	計画	5 地区 5 施設
通常砂防	計画	1 地区 1 施設

(3) 関連する取組

① 新たな取組や新技術の導入

ア 被災木の集積ポイントの設置

所在地	面積	状況
三陸町綾里字港地内	約 0.10ha	使用中
三陸町吉浜字扇洞地内	約 1.00ha	使用可能。搬入実績なし。
猪川町字長洞地内	約 1.50ha	使用可能。搬入実績なし。

② 路網の整備

ア 林道の開設（担当：県）

林道甫嶺線 計画 5,600m 開設済み 980m

年度	工事場所	工事数量	実施区分
R8	三陸町綾里字小石浜地内	延長 160m 幅員 4.0m	実施中

(4) 関連事業

① 大船渡市被災危険木除去事業（担当：市）

年度	施行場所	実施数量		実施区分
R7	三陸町綾里字小路地内ほか	23件	補助金額11,540千円	完了
R8	赤崎町字長崎地内ほか	2件	補助金額 334千円	完了

② 水源林造成事業（担当：国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター）

事業区分	年度	施行場所	実施数量		実施区分
伐採搬出	R8	赤崎町字清水地内	私有林	11.94ha	実施中
跡地造林	R8	〃	造林	11.94ha	実施中
	R8	〃	防護柵	9,000m	実施中
作業路開設	R8	〃		3,315m	実施中

③ 市有林J-クレジット創出事業（担当：市）

プロジェクト登録に係る計画書の作成に着手。（専門事業者へ登録支援に係る業務委託契約を締結）

(5) その他

① 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出状況（担当：市）

事業区分	年度	施行場所	実施数量	
伐採	R7	三陸町綾里地内ほか	私有林 14 件	22.83ha
	R8	〃	私有林 13 件	19.65ha
造林	R7	〃	天然更新	20.05ha
			人工造林	2.48ha
			その他(砂防用地へ)	0.30ha
	R8	〃	天然更新	16.99ha
			人工造林	2.66ha

5 参考

(1) 森林災害復旧事業等の概要

引用元：「令和7年大船渡市大規模林野火災等に係る森林再生計画」から抜粋。

① 森林再生対策

ア 森林災害復旧事業 【国庫補助】 (ア)概要 激甚災害を受けた人工林を復旧するために行う事業 (イ)主な事業内容 ⑦被災木の伐採及び搬出 ①跡地造林 ⑦作業路開設 (ウ)事業主体 市 (エ)対象森林所有形態 ⑦私有林※ ①市有林 ※ 私有林には、焼損が著しく分収林として管理を継続することが困難となり、契約を解除した県行造林を含む	イ 森林整備事業 【国庫補助】 (ア)概要 ⑦特定機能回復事業 気象害等による被害森林において、地方公共団体と所有者等が締結する協定に基づき、被害森林を復旧する事業 ①森林環境保全直接支援事業 森林施業の集約化等を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的に整備する事業 (イ)主な事業内容 ⑦被災木の伐採及び搬出 ①跡地造林 ⑦下刈り (ウ)主な事業主体 ⑦市 ①林業事業体 ⑦森林経営計画作成者 (エ)対象森林所有形態 ⑦私有林 ①市有林	ウ いわて環境の森整備事業 (森林環境再生造林) 【県補助】 (ア)概要 公益上重要でありながら、植栽によらなければ早期の更新が困難な森林について、人工造林等を行う事業 (イ)主な事業内容 ⑦人工造林 ①下刈り (ウ)主な事業主体 ⑦林業事業体 ①特定非営利活動法人 (エ)対象森林所有形態 私有林
---	---	--

※ 森林整備事業、いわて環境の森整備事業の事業内容については、大船渡市の「大船渡市森林整備推進事業」による上乗せ助成により、森林所有者等の実質負担は「なし」となるもの。

② 土砂流出対策

ア 治山事業【国庫補助】 (ア)概要 国の災害関連緊急治山事業等を活用し、治山ダム等の整備を進めるとともに、治山ダム整備と一体的に森林整備を進める。 (イ)主な事業内容 治山ダム 9か所、森林整備 40ha (ウ)事業主体 県	イ 砂防事業【国庫補助】 (ア)概要 国の災害関連緊急砂防事業を活用し、砂防堰堤等の整備を進める。 (イ)事業内容 砂防堰堤 5か所 (新設3か所、既設堰堤改築2か所) (ウ)事業主体 県
---	--

③ 関連事業

ア 大船渡市被災危険木除去事業【市補助】 (ア)概要 道路等の公共施設や建造物などに倒木被害を与えるおそれがある私有の被災危険木の伐倒処理経費の一部を助成。 (イ)補助対象者 被災危険木を所有する個人、団体 (ウ)補助対象経費 ⑦被災危険木の伐倒経費 ⑧被災危険木の除去及び処理経費 (エ)補助金額 対象経費の10分の9(上限90万円)	イ 水源林造成事業 (ア)概要 土地所有者の自助努力では適正な森林整備が見込めない保安林等において、土地所有者等と国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターが締結する分収造林契約に基づき、水源をかん養するための森林「水源林」を造成する事業 (イ)事業内容 水源かん養保安林又は予定地における植栽及び保育等の森林施業の実施 (ウ)事業主体 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター
---	--

令和8年度森林災害復旧事業発注計画（令和8年8月現在）

資料1 別紙


令和8年度（令和8年8月26日現在）の発注計画を公表します。

なお、記載のない施行場所の発注や記載した内容変更等について、予告なく行われる場合がありますのでご注意ください。

No.	施行場所	実施数量	予定工期	業務内容	契約方法※	発注時期	備考（所有区分）
1	三陸町綾里字熊之入地内	3.47ha	R8.9～R8.11	跡地造林 (R8秋植栽：スギ)	随意契約	R8.9	市有林
2	三陸町綾里字野々前地内	17.08ha	R8.9～R9.8	被害木の伐採・搬出、作業路開設1,057m、跡地造林 (R9春植栽：樹種未定)	随意契約	R8.9	私有林
3	三陸町綾里字野々前地内	11.29ha	R8.9～R9.8	被害木の伐採・搬出、跡地造林 (R9春植栽：樹種未定)	随意契約	R8.9	私有林
4	三陸町綾里字田浜下地内	19.29ha	R8.10～R9.8	被害木の伐採・搬出、跡地造林 (R9春植栽：樹種未定)	随意契約	R8.10	市有林
5	三陸町綾里字田浜下地内	29.36ha	R8.10～R9.8	被害木の伐採・搬出、跡地造林 (R9春植栽：樹種未定)	随意契約	R8.10	市有林27.84ha 私有林 1.52ha
6	三陸町綾里字砂子浜地内	11.78ha	R8.12～R10.2	被害木の伐採・搬出、作業路開設1,397m、跡地造林 (R9秋植栽：樹種未定)	随意契約	R8.12	私有林
7	三陸町綾里字砂子浜地内	26.62ha	R8.12～R10.2	被害木の伐採・搬出、作業路開設1,311m、跡地造林 (R9秋植栽：樹種未定)	随意契約	R8.12	私有林
8	三陸町綾里字田浜下ほか	22.23ha	R9.1～R10.8	被害木の伐採・搬出、跡地造林 (R10春植栽：樹種未定)	随意契約	R9.1	市有林
9	三陸町綾里字打越ほか	13.25ha	R9.1～R10.8	被害木の伐採・搬出、作業路開設1,245m、跡地造林 (R10春植栽：樹種未定)	随意契約	R9.1	私有林
10	三陸町綾里小石浜地内	14.29ha	R9.3～R10.8	被害木の伐採・搬出、作業路開設539m、跡地造林 (R10春植栽：樹種未定)	随意契約	R9.3	私有林
11	三陸町越喜来西甫嶺地内	30.06ha	R9.3～R10.8	被害木の伐採・搬出、作業路開設597m、跡地造林 (R10春植栽：樹種未定)	随意契約	R9.3	私有林
	合計	198.72ha					


※ 契約については、岩手県が公表している「令和8・9年度森林整備事業請負契約等指名競争入札参加資格者名簿」を参考に、見積対象事業者を選定し、見積合わせ会を実施の上、決定する。

森林災害復旧事業等位置図 (資料 1 関係)

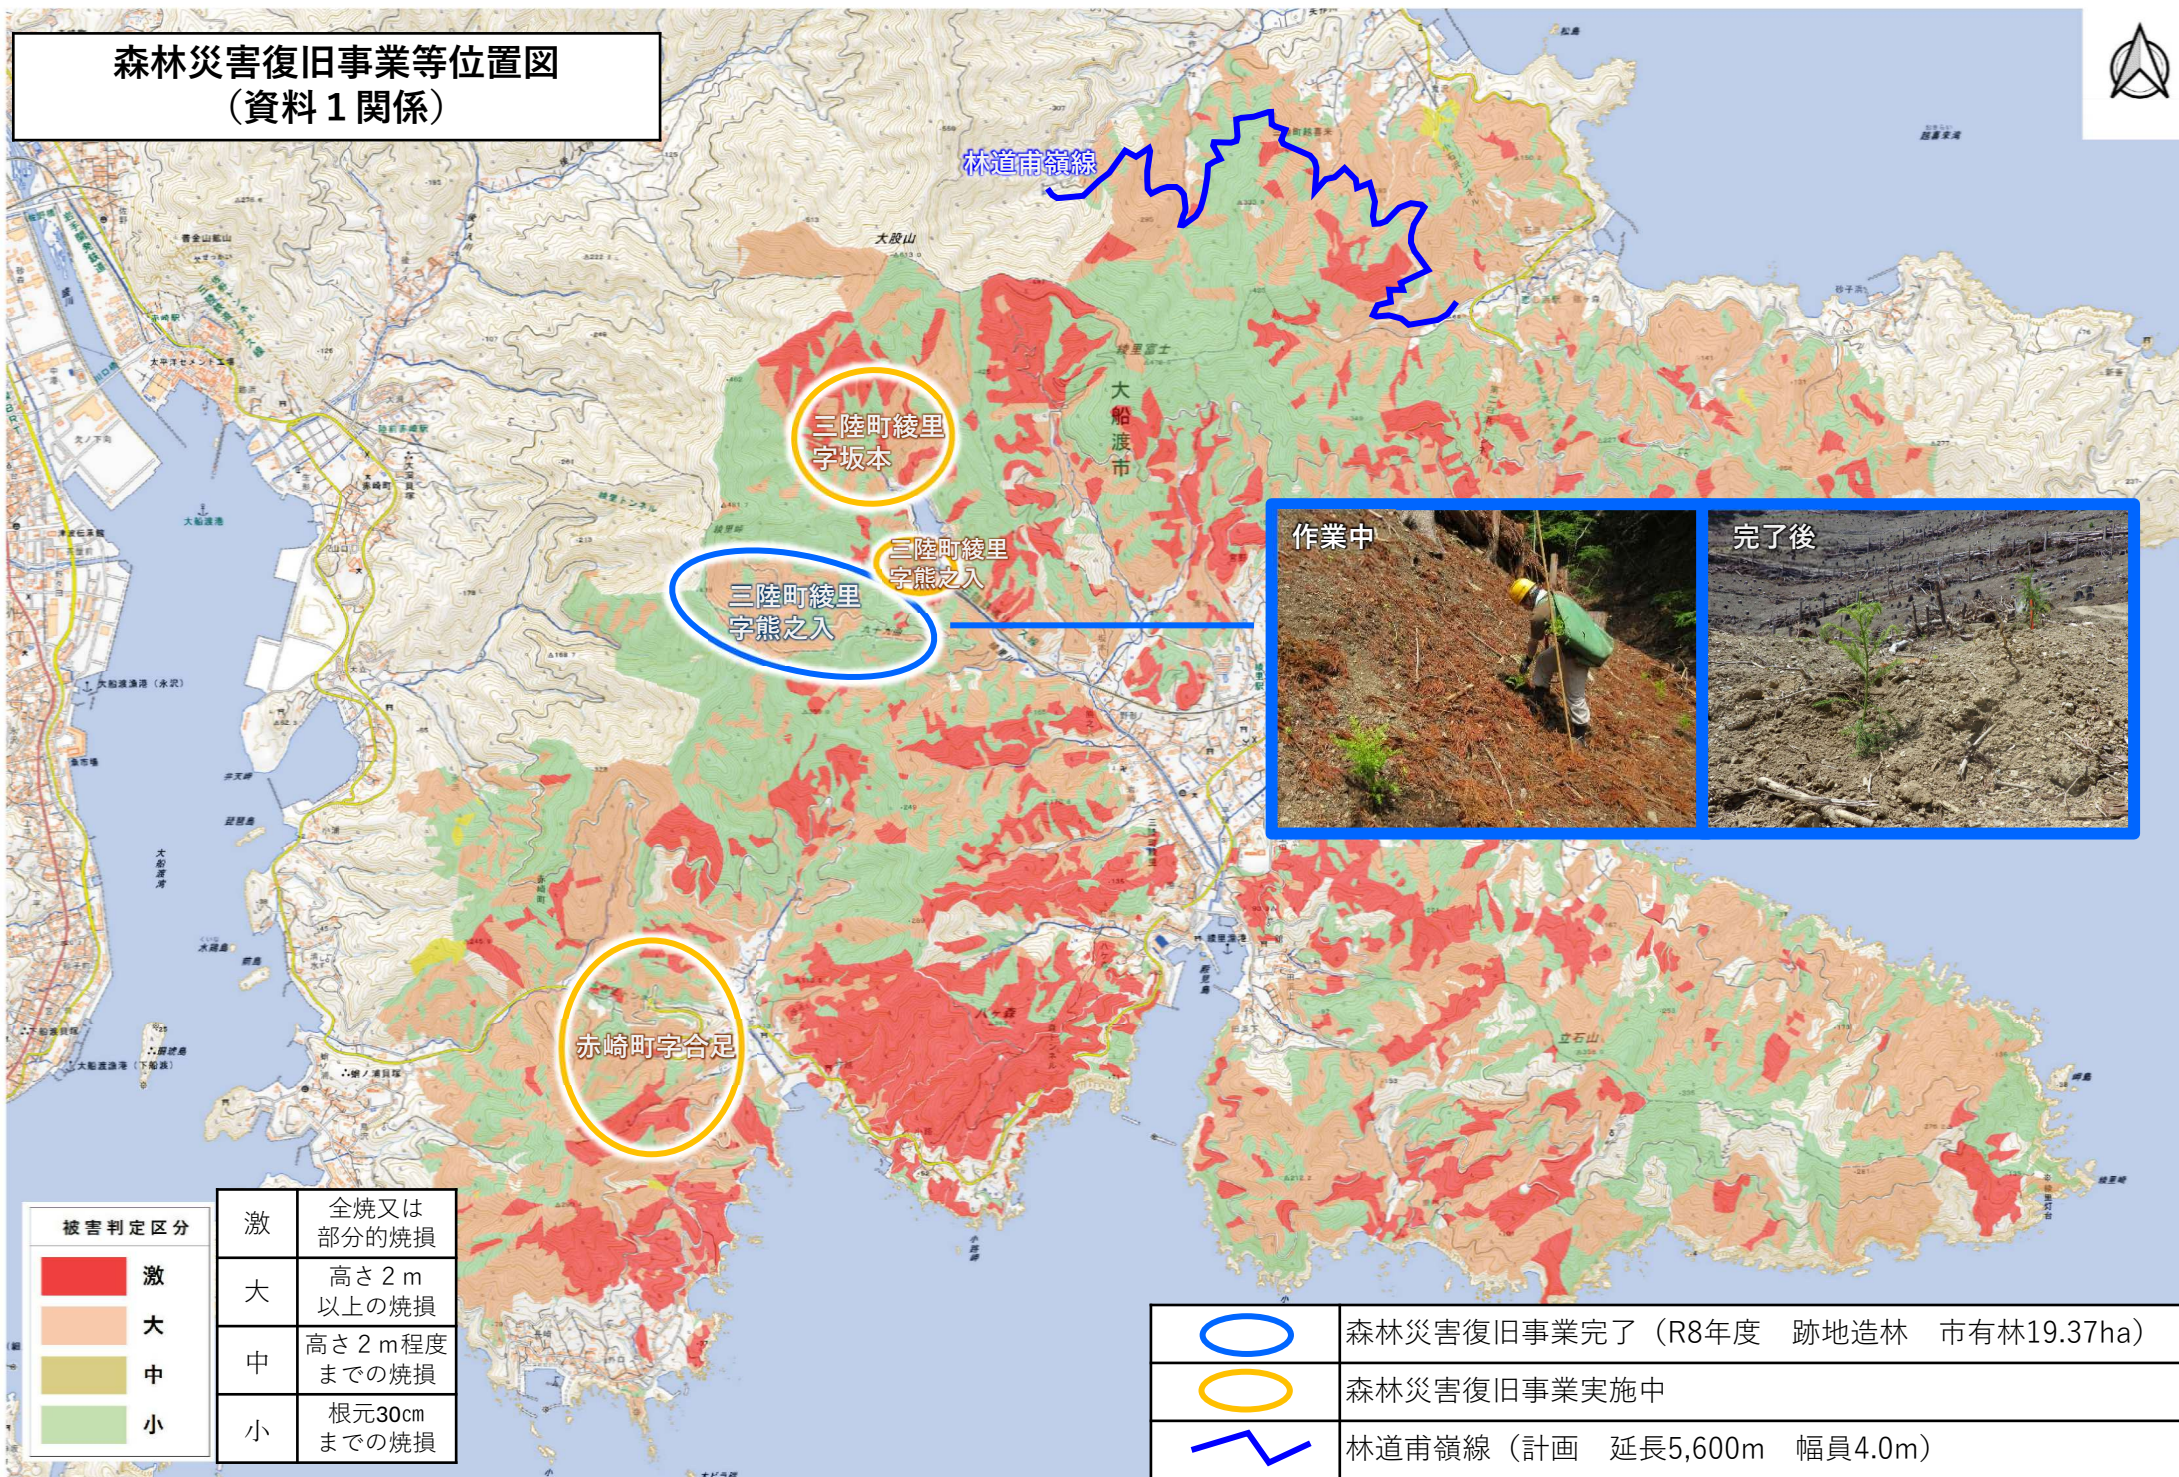


背景図には国土地理院地図を利用しています。
樹種や林齢が同一の森林ごとに図示したもので延焼範囲と一致しない場合があります。

土砂流出対策位置図 (資料1 関係)

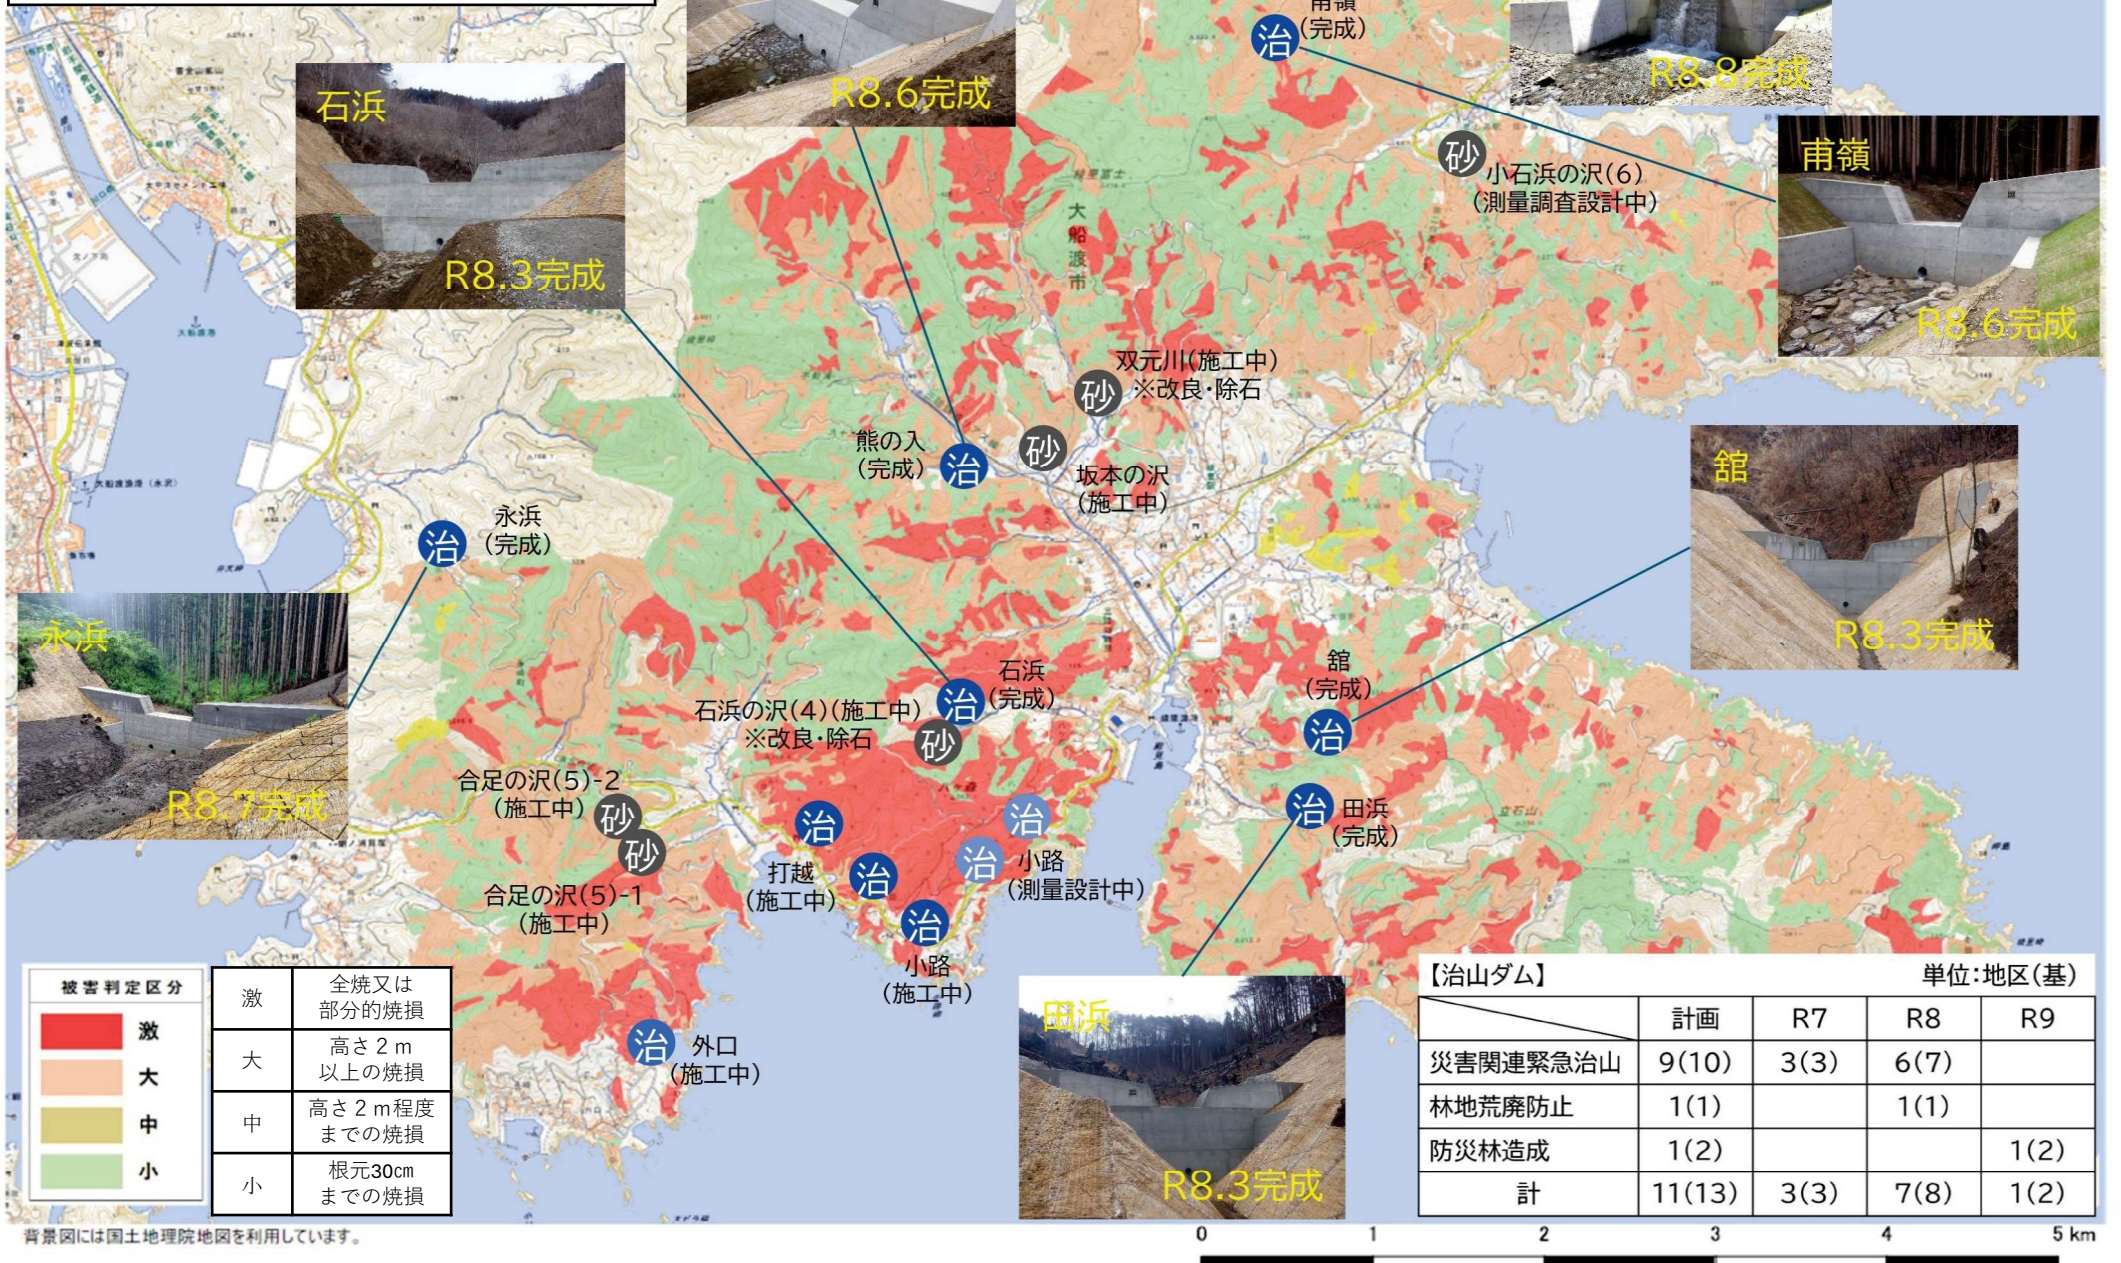

森林災害復旧事業発注計画位置図 (資料 1 別紙関係)

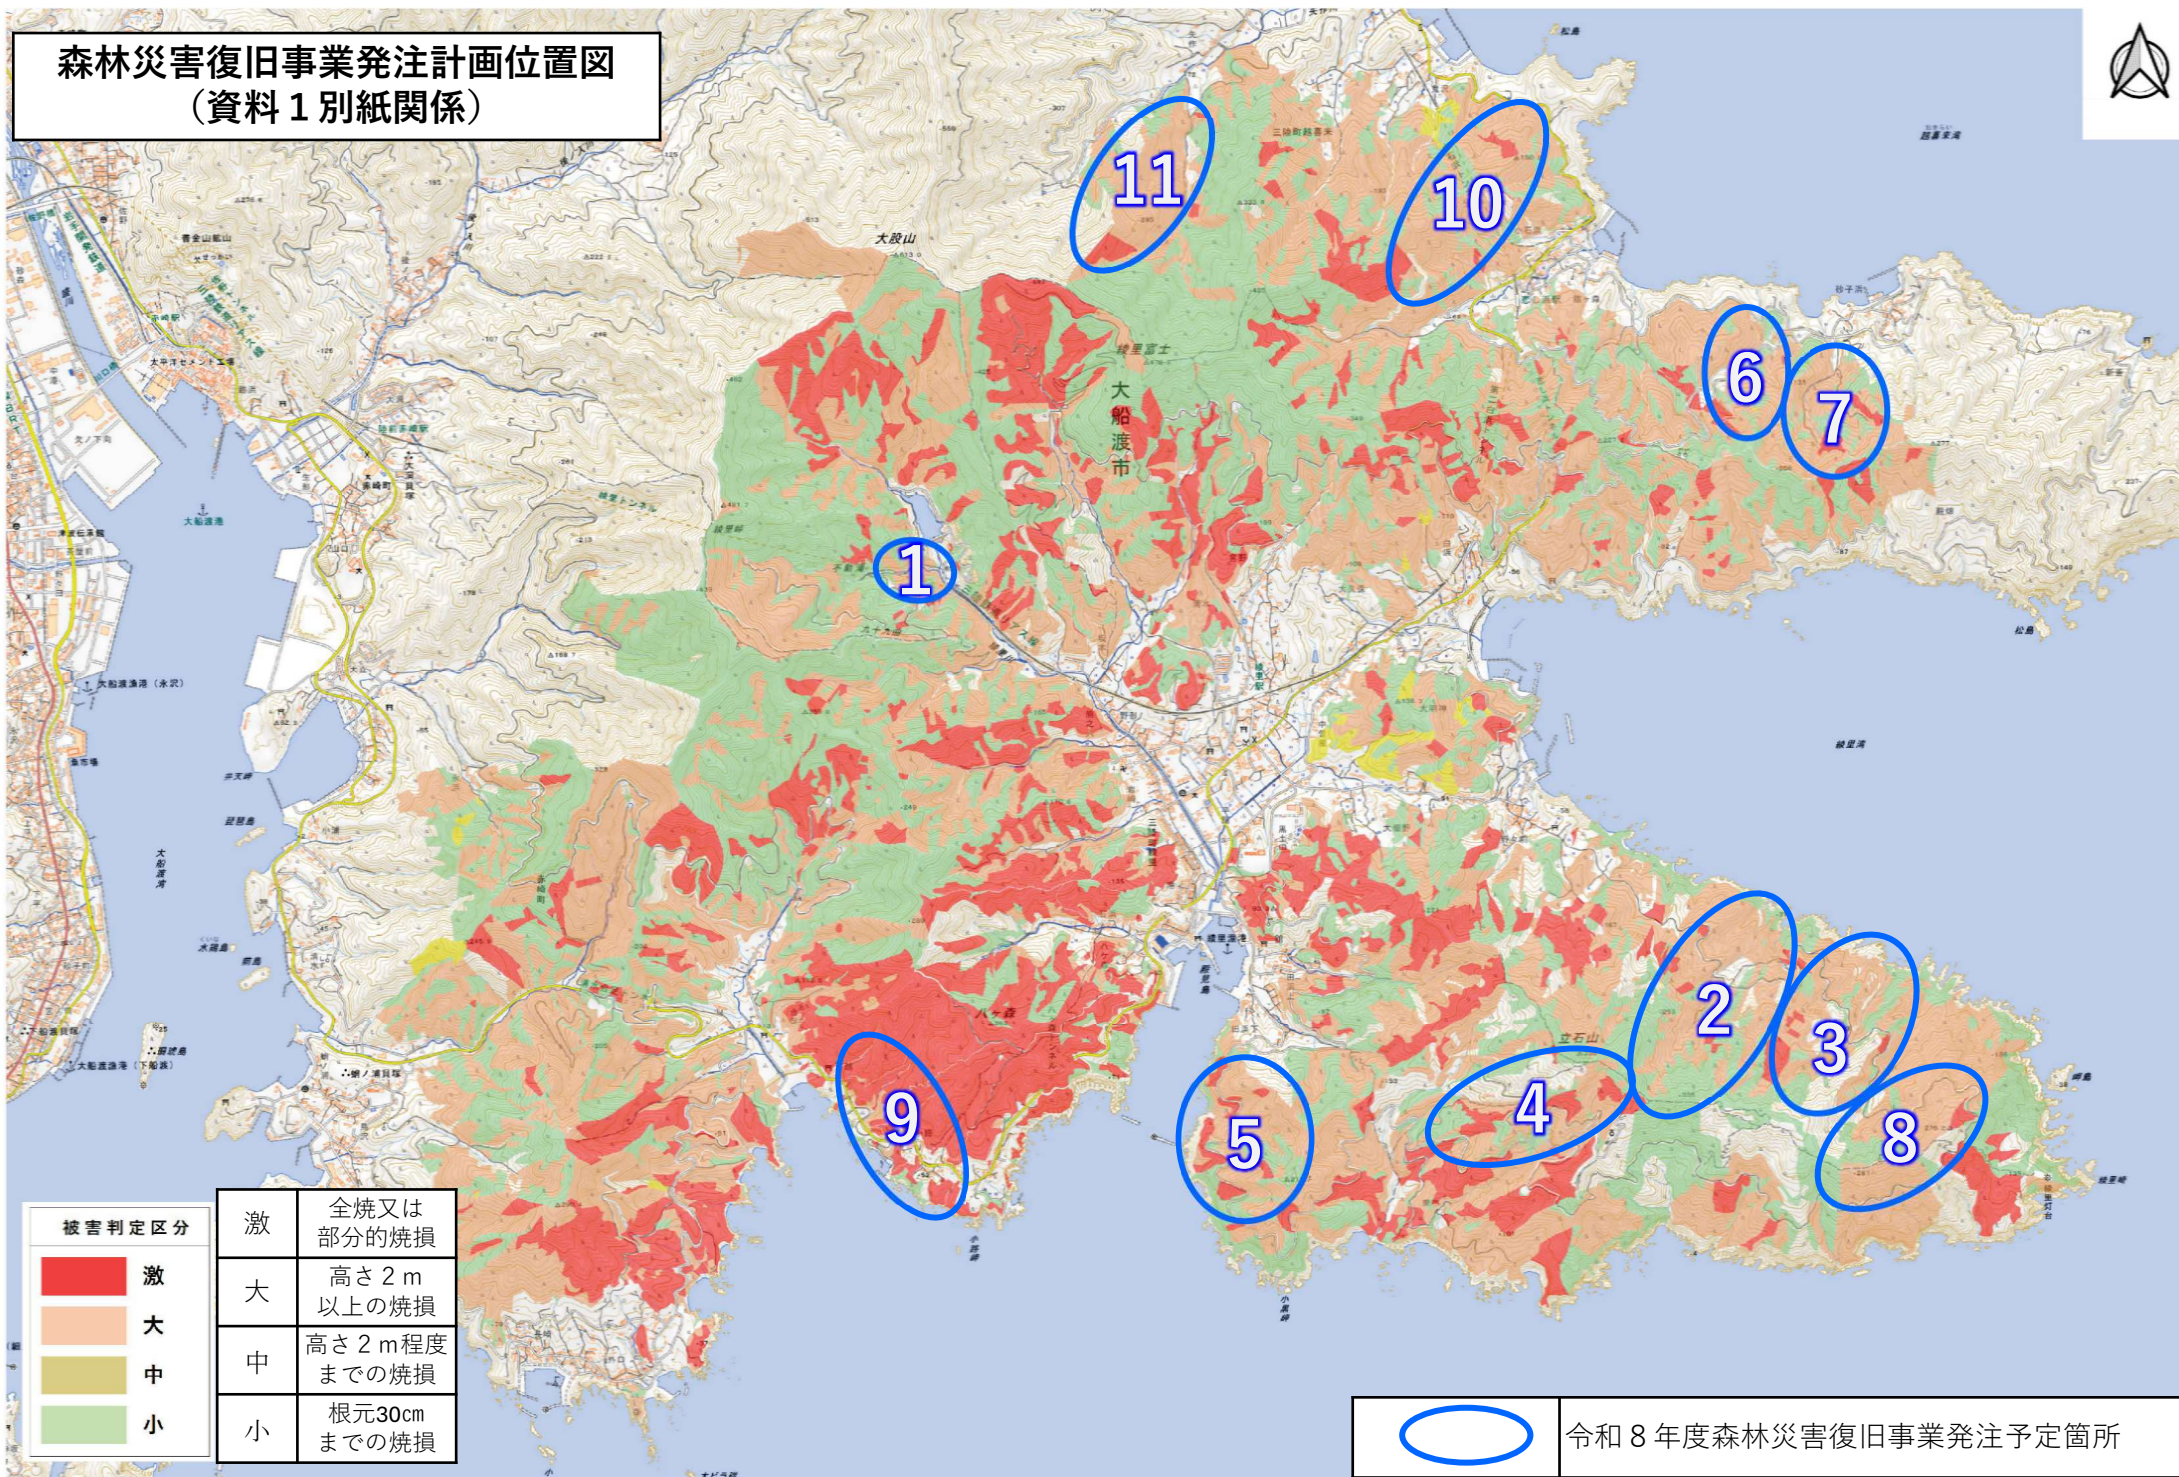

背景図には国土地理院地図を利用しています。
樹種や林齢が同一の森林ごとに図示したもので延焼範囲と一致しない場合があります。
