

■大船渡市復興計画事業(主要事業)スケジュール(事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールなどは、変更になる場合があります。)

※ _____ は、前回作成時(平成28年3月31日)以後における変更箇所。


(平成28年9月30日現在)

事業名	事業概要	事業主体	事業箇所 <small>※工事等が終了している箇所については網かけをしています。</small>	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				平成31年度以降
				4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~9月	10~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
土地区画整理事業	土地の区画を整えながら、宅地造成などによる新たな住環境の整備	市	大船渡駅周辺(大船渡町:33.8ha)	測量	●都市計画決定 ●事業計画決定	●都市計画変更 ●事業計画決定	●事業計画第1回変更	●事業計画第2回変更	仮換地指定(段階的に実施)								(工程再調整)									
					用地取得				移転・補償・造成工事(●仮換地手続きの進捗により段階的に実施) ●造成工事の進捗により段階的に建物建設																	
津波復興拠点整備事業	既往最大津波に対しても都市機能を維持するための拠点市街地整備	市	大船渡地区周辺(大船渡町:7.7ha) <small>(土地区画整理事業区域外の先行地区2.3ha 土地区画整理事業区域と重複する拡大地区5.4ha)</small>		●事業計画決定 ●都市計画決定	●都市計画変更 ●事業計画第1回変更			津波復興拠点施設				●建設													
					先行地区用地取得	造成工事			●道路・交通広場工事 ●段階的に民間による商業施設等建設																	
			其他地区		導入地区検討・事業計画策定				●段階的に民間による商業施設等の建設																	
防災集団移転促進事業	居住に不当でないと思われる区域内にある住居の集団移転の促進 <small>※すべての防災集団移転促進事業実施予定地区において、事業実施に係る国土交通大臣の同意を得ています。(366戸)</small>	市	造成済 25箇所:302戸 中赤崎【森っこ】地区(赤崎町):34戸 中赤崎【洞川原】地区(赤崎町):3戸 永浜地区②(赤崎町):27戸	設計					造成工事				●住宅建設				●住宅建設(工程再調整)									
災害公営住宅整備事業	住宅を失った被災者を対象に公営住宅を整備(801戸) <small>※泊里地区及び崎浜地区における敷地造成は、両地区それぞれの防災集団移転促進事業による住宅団地造成と一体(双方の造成地が隣接)で実施します。→よって、他地区と「工事」時期が異なります。</small>	県(511戸) 市(290戸)	入居済 9箇所:453戸 下館下(盛町):58戸 入居済 17箇所:290戸						建築工事				●入居													
地域公民館整備支援事業	市内地域公民館132館のうち、被災した地域公民館34施設の修繕、改築あるいは移転新築などの整備を支援(うち4地域公民館:中央通・内田・小河原・佐野地域については、右記とは別にコンテナハウスなどにより整備支援済)	地域公民館	使用開始済 13箇所 永沢地域公民館(大船渡町) その他地域公民館								設計	工事	●使用開始													
												工事 ※完成次第使用開始														
地域防災コミュニティセンター整備事業	被災したむらづくり研修施設などを防災機能を備えたコミュニティ施設として整備	市	使用開始済 2箇所 清水地域防災コミュニティセンター(赤崎町) 合足地域防災コミュニティセンター(赤崎町)								測量・調査設計	敷地造成工事・建築工事				●使用開始										
											設計	敷地造成工事・建築工事				●使用開始(工程再調整)										
被災学校移転改築事業	被災した赤崎小学校、越喜来小学校及び赤崎中学校を地区の拠点となるよう防災機能をあわせ持つ施設として移転改築	市	赤崎小学校 赤崎中学校 越喜来小学校	設計							敷地造成工事・建築工事				●年度内使用開始に向け工程調整中											
											敷地造成工事・建築工事				●年度内使用開始に向け工程調整中											
											敷地造成工事・建築工事				●H28.11月使用開始											

※「●住宅建設」には、敷地造成工事終了後の諸手続き期間を含みます。

事業実施(予定)地区位置図 (土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業・防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業)

(平成28年9月30日現在)

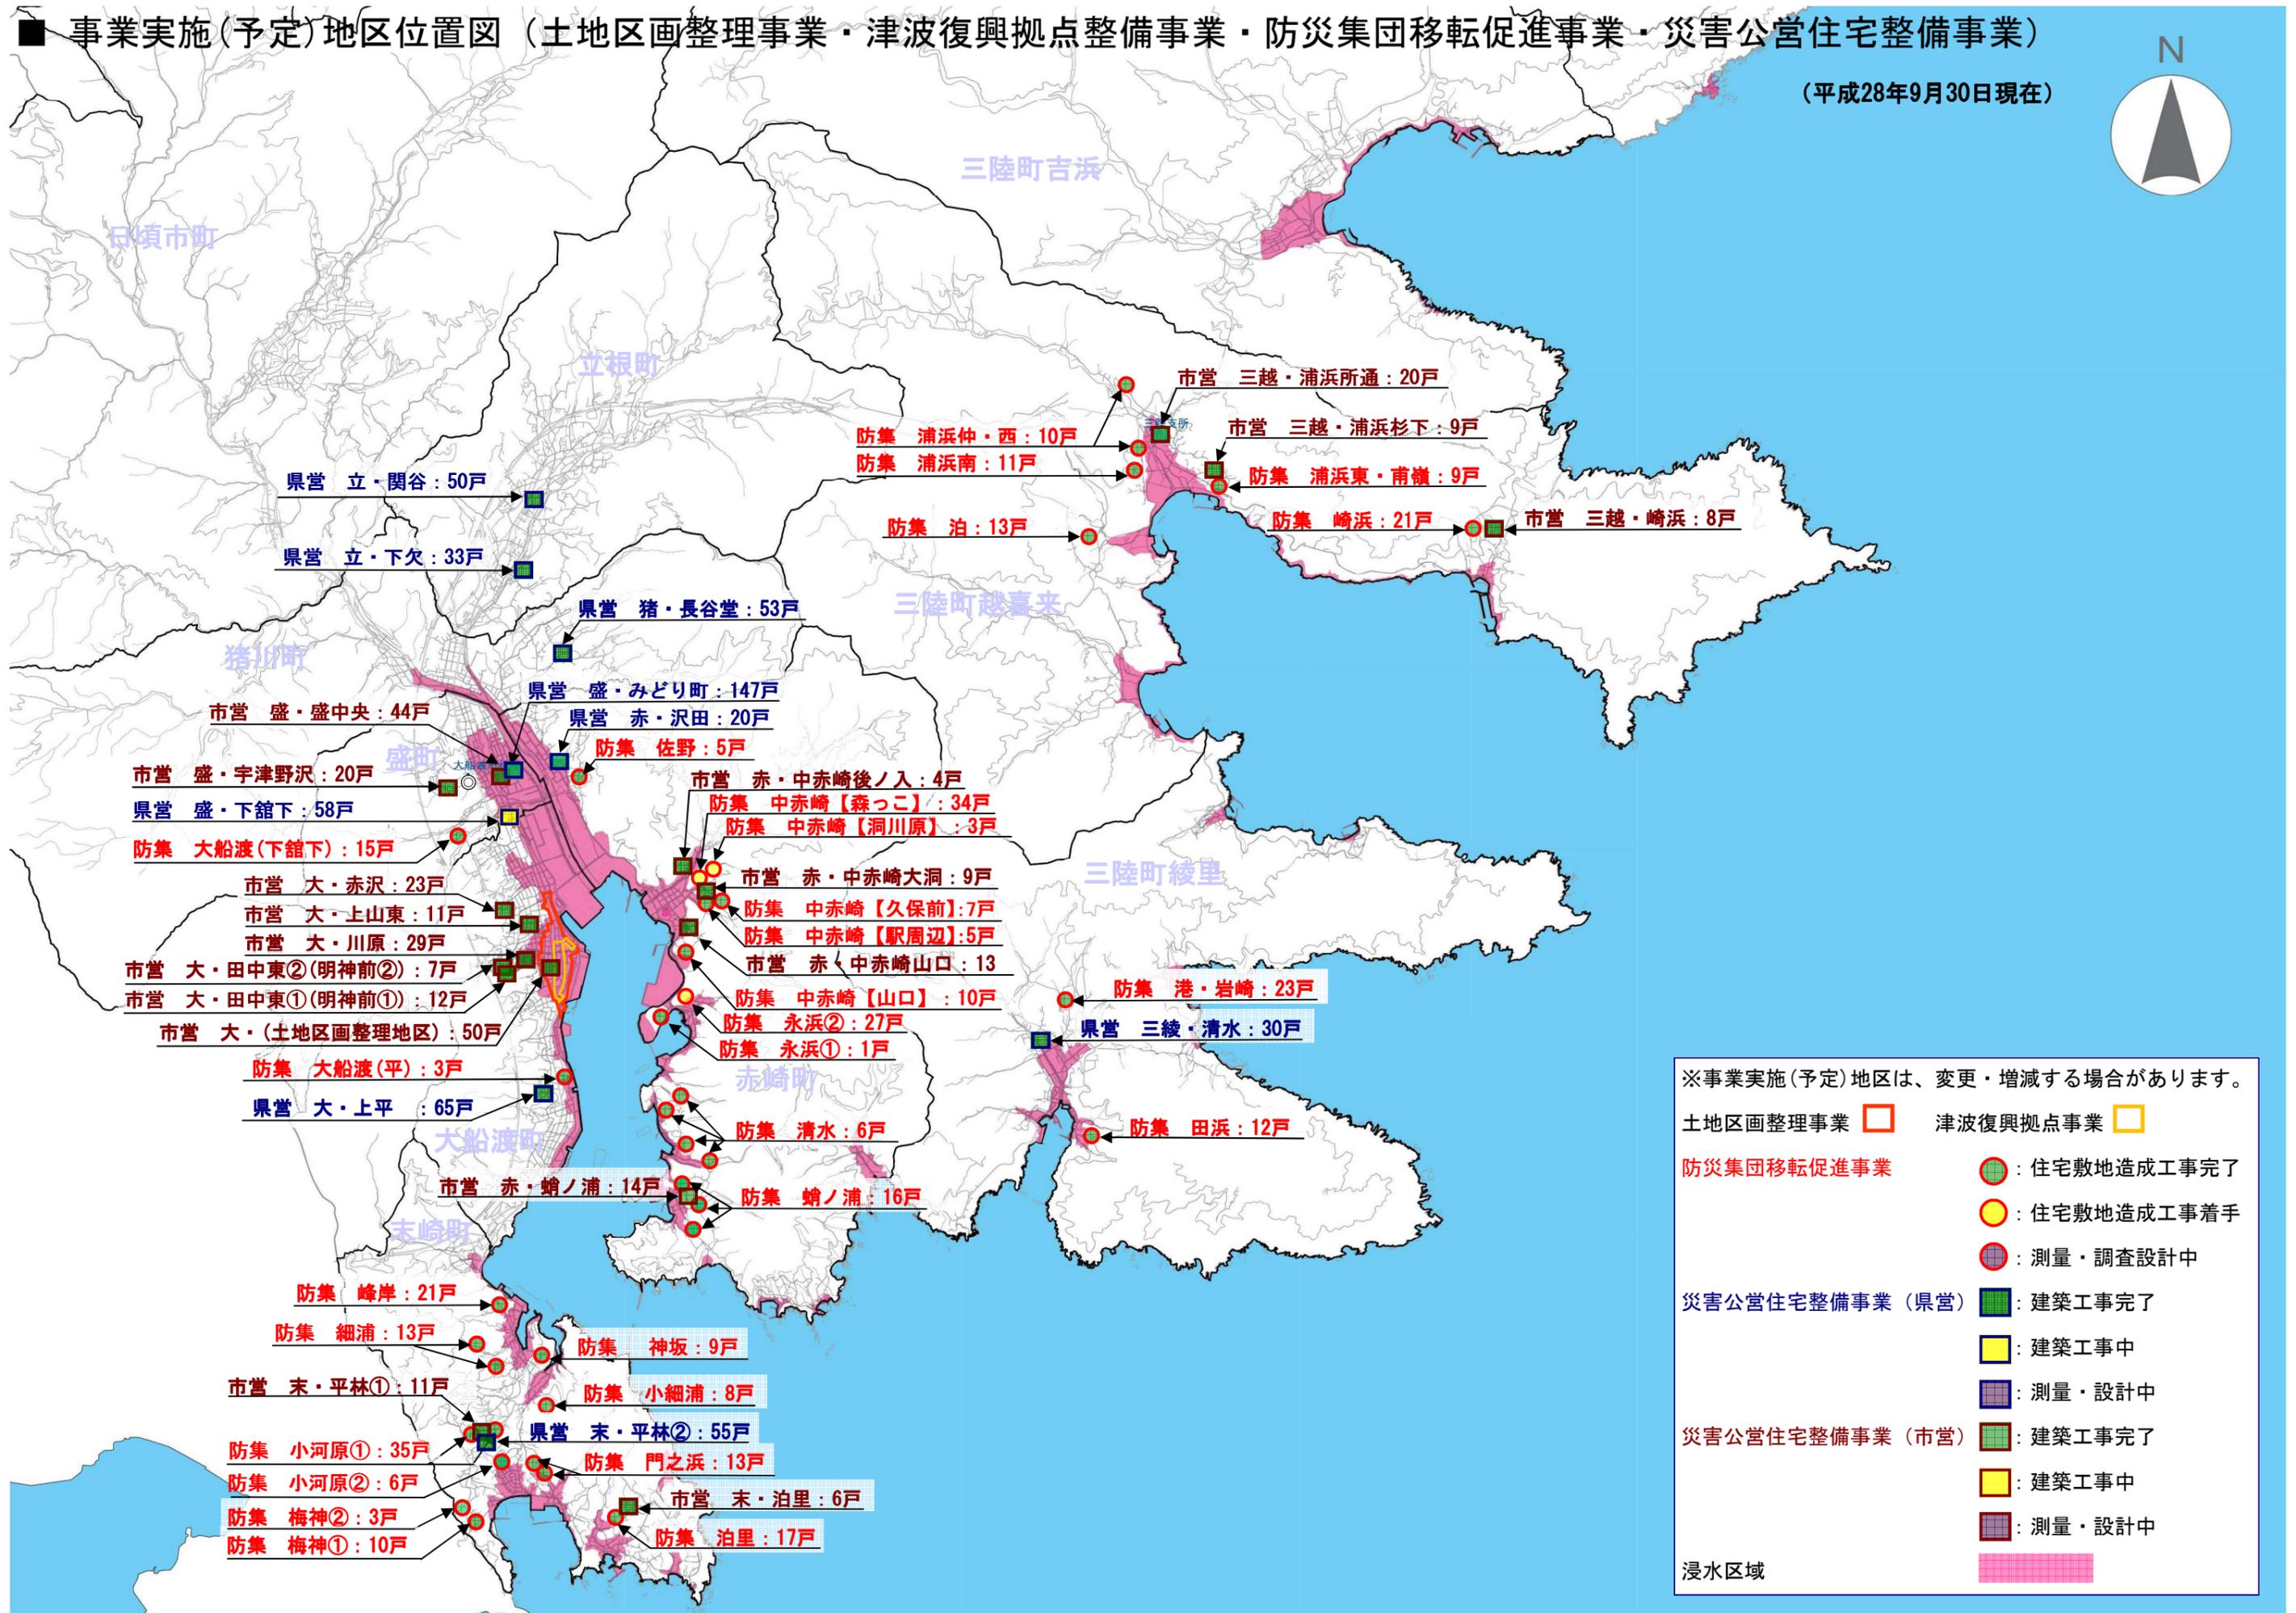

※事業実施(予定)地区は、変更・増減する場合があります。

土地区画整理事業 津波復興拠点事業

防災集団移転促進事業

- : 住宅敷地造成工事完了
- : 住宅敷地造成工事着手
- : 測量・調査設計中

災害公営住宅整備事業(県営)

- : 建築工事完了
- : 建築工事中
- : 測量・設計中

災害公営住宅整備事業(市営)

- : 建築工事完了
- : 建築工事中
- : 測量・設計中

浸水区域
