

被災跡地利用の検討 地区別進捗管理表

資料6-1

[凡例] ● 実施済(あり) ○ 実施中 - 該当なし(なし) △ 検討中


○土地利用方針を改定する地区(実現化方策の策定)

| No. | 地区名 | 状況 | | | | | 土地利用方針の改定に向けた作業 | | | | | | | 事業の実施 | | | |
|-----|------|---------|---------|------|------|------|-----------------|----|-----|------|---------|-----|------|-------|----|------|------|
| | | H23利用方針 | 復興組織の有無 | 提言書等 | 土地買収 | 土地集約 | 復興組織の検討状況 | | | 素案作成 | 素案合意(※) | 懇談会 | 素案修正 | 議会説明 | 公表 | 実施調整 | 事業着手 |
| | | | | | | | 準備 | 検討 | まとめ | | | | | | | | |
| 1 | 地ノ森 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 2 | 下船渡 | ● | - | ● | ○ | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 3 | 細浦 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 末崎中央 | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | 泊里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | |
| 6 | 碁石 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | 赤崎 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| 8 | 綾里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | | | |
| 9 | 甫嶺 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 10 | 泊 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 11 | 浦浜 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 12 | 崎浜 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | | | |

(※)復興組織の合意状況

○土地利用方針を改定しない地区

| No. | 地区名 | 状況 | | | | | 改定しないことへの合意 | | |
|-----|--------|---------|---------|------|------|------|-------------|------|------|
| | | H23利用方針 | 復興組織の有無 | 提言書等 | 土地買収 | 土地利用 | 方針検討 | 地域説明 | 地域合意 |
| 13 | 盛 | ● | - | - | ○ | △ | | | |
| 14 | 赤土倉 | - | - | - | - | - | | | |
| 15 | 蛸ノ浦 | ● | - | ● | ○ | △ | | | |
| 16 | 長崎 | ● | - | ● | ○ | △ | | | |
| 17 | 合足 | ● | - | ● | - | - | | | |
| 18 | 小路 | - | - | - | - | - | | | |
| 19 | 野々前・白浜 | ● | - | ● | - | - | | | |
| 20 | 砂子浜 | ● | - | ● | - | - | | | |
| 21 | 小石浜 | ● | - | ● | ○ | △ | | | |
| 22 | 小壁 | - | - | - | - | - | | | |
| 23 | 吉浜 | ● | - | - | ○ | △ | | | |
| 24 | 扇洞 | ● | - | - | - | - | | | |
| 25 | 根白 | - | - | - | - | - | | | |
| 26 | 千歳 | ● | - | - | ○ | △ | | | |

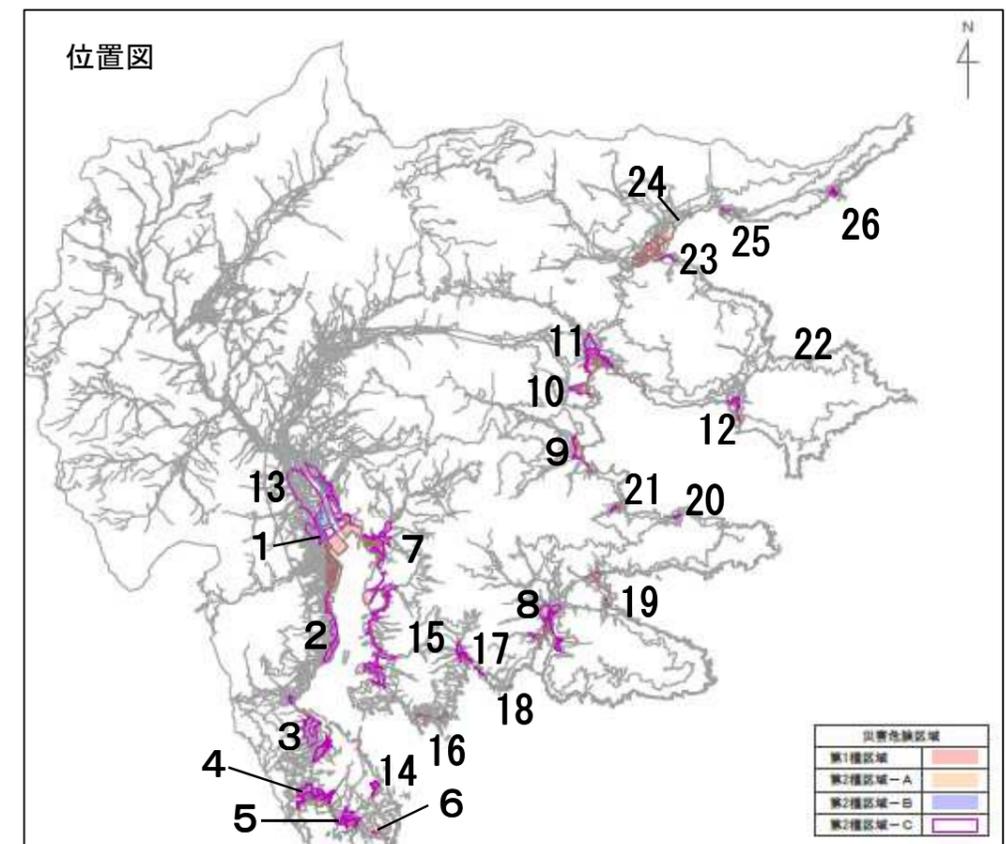

| 内 容 | | H27/4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H28/1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------|---------------|-----------|---------|------------|--------|-----------|-------|---------|
| 都市計画 | 議会 | | | | | 議会説明 | | | 議会報告(立案過程) | | | | 議会報告 |
| | 都市計画審議会 | | | | | | | 審議会諮問 | 審議会説明 | | | | 審議会諮問 |
| | 都市計画マスタープラン | | | | | | 土地利用方針の反映 | 策定委員会検討 | 策定委員会検討 | 住民説明会 | パブリックコメント | 最終案作成 | 策定委員会検討 |
| | 用途地域の変更 | | 方針検討 | 素案作成 | 県協議 | | 住民説明会 | 公告・縦覧 | 決定告示 | | | | |
| | 準防火地域の変更 | | | 素案作成 | 県協議 | | 住民説明会 | 公告・縦覧 | 決定告示 | | | | |
| 統合型GISの更新 | 仕様検討・各課調整 | | | | | 更新作業 | | | | | 切り替え | | |
| 被災跡地利用 | 復興交付金申請 | | | | | | | | | | | | |
| | 崎浜 | 資料確認・懇談会 期日調整 | ★ 記者会見(5月下旬) | 懇談会 (下旬) | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | | | 事業着手 | | |
| | 浦浜・泊 | 資料確認・懇談会 期日調整 | ★ 記者会見(5月下旬) | 懇談会 (6/2予定) | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | | | 事業着手 | | |
| | 甫嶺 | 資料確認・懇談会 期日調整 | ★ 記者会見(5月下旬) | 懇談会 (6/3予定) | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | | | 事業着手 | | |
| | 綾里 | 資料確認・懇談会 期日調整 | ★ 記者会見(5月下旬) | 懇談会 (下旬) | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | | | 事業着手 | | |
| | 地ノ森・下船渡 | 大船渡町議員団との調整・素案作成 | | 復興推進組織及び地権者への説明・調整 | | 実現化方策図の修正・調整 | 懇談会 | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | | |
| | 赤崎 | ファシリテーター選任 | | 復興推進組織による方針検討 | | 素案の作成・すり合わせ | 懇談会 | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | | |
| | 細浦 | 復興推進組織による方針検討 | | | | 土地利用方針(素案)の作成 | 素案のすり合わせ | 懇談会 | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | |
| | 末崎中央 | 復興推進組織による方針検討 | | | | 土地利用方針(素案)の作成 | 素案のすり合わせ | 懇談会 | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | |
| | 基石・泊里 | 復興推進組織による方針検討 | | | | 土地利用方針(素案)の作成 | 素案のすり合わせ | 懇談会 | 方針図反映 | 決裁・公表 | 事業実施調整 | | |
| | ワーキンググループ | | | 進捗に応じたワーキング検討 → 庁内合意 | | | | | | | | | |

水産会社の計画に従って用途地域の変更手続きを進める。準防火地域の変更もこれに併せて行う。
