


大船渡市復興計画事業の進捗状況

平成26年12月31日現在


[1] 事業の進捗状況

進捗状況	事業数
未着手	3
検討中	4
着手済	169
実施済	81
計	257
整理・統合等	16

[1]

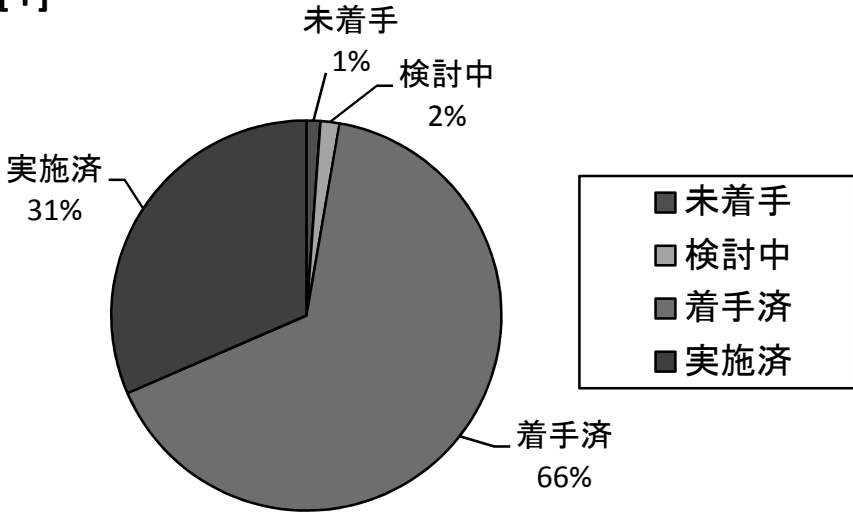

[2]

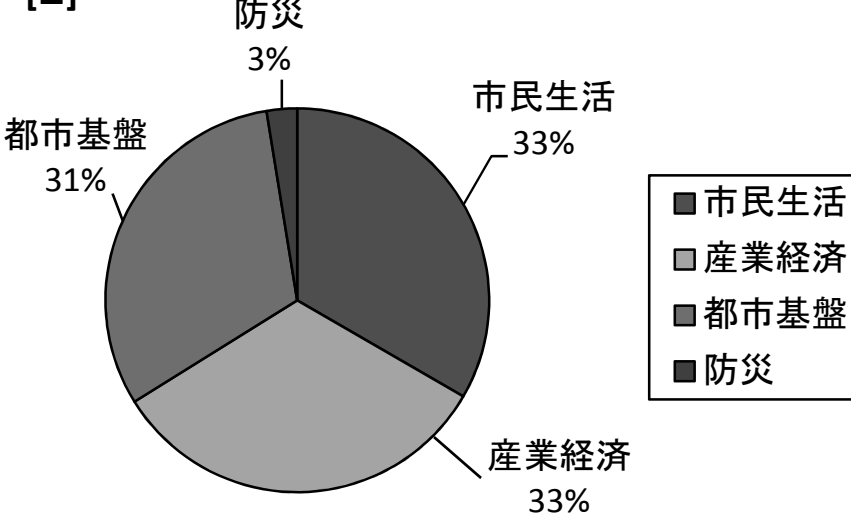


[2] 事業費の内訳(※現時点で把握可能な概算事業費によるものです)

復興計画の柱	全体計画（百万円）															
	事業費	財源内訳（百万円）					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源										
市民生活の復興	136,676	49,296	22,906	2,549	47,445	14,480	18,468	20,154	24,066	27,096	29,469	13,129	1,956	1,786	276	276
産業・経済の復興	134,298	44,543	63,827	3,291	16,010	6,627	8,110	17,744	31,314	50,524	24,068	666	471	469	467	465
都市基盤の復興	128,249	28,690	59,008	5,297	28,886	6,368	3,859	10,240	17,733	37,924	32,610	13,524	7,098	3,600	1,192	469
防災まちづくり	10,484	2,283	6	97	6,321	1,777	131	2,152	2,415	5,064	246	252	56	56	56	56
合 計	409,707	124,812	145,747	11,234	98,662	29,252	30,568	50,290	75,528	120,608	86,393	27,571	9,581	5,911	1,991	1,266
	復興計画の期間別事業費（全事業費に占める割合）						156,386（38.2%）			234,572（57.3%）			18,749（4.6%）			
(H26.9.30現在)	408,957	124,370	145,431	12,346	98,625	28,185	30,463	50,087	75,518	130,859	80,892	22,405	9,587	5,905	1,983	1,258
	復興計画の期間別事業費（全事業費に占める割合）						156,068（38.2%）									


①市民生活の復興

進捗状況	事業数
未着手	0
検討中	1
着手済	53
実施済	23
計	77
整理・統合等	0

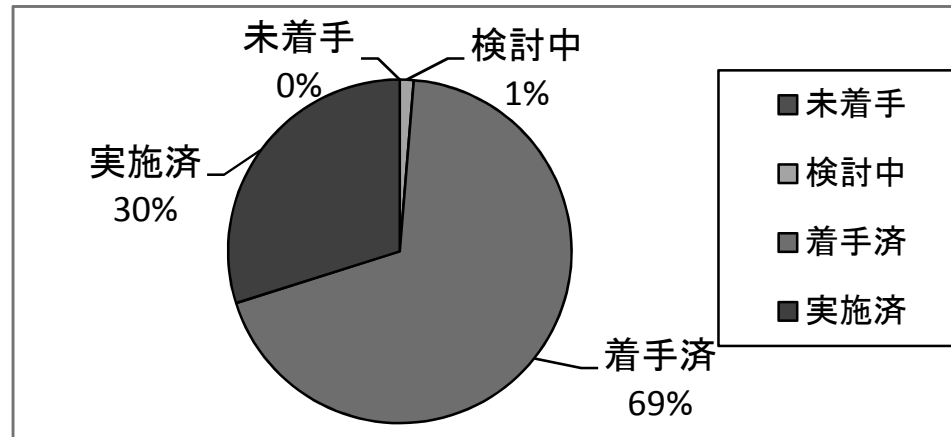


②産業・経済の復興

進捗状況	事業数
未着手	0
検討中	2
着手済	58
実施済	36
計	96
整理・統合等	12

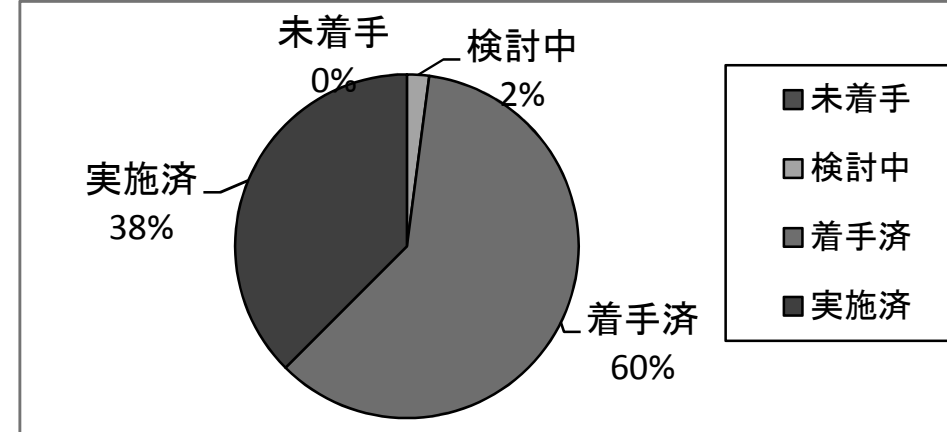


③都市基盤の復興

進捗状況	事業数
未着手	2
検討中	0
着手済	32
実施済	10
計	44
整理・統合等	2

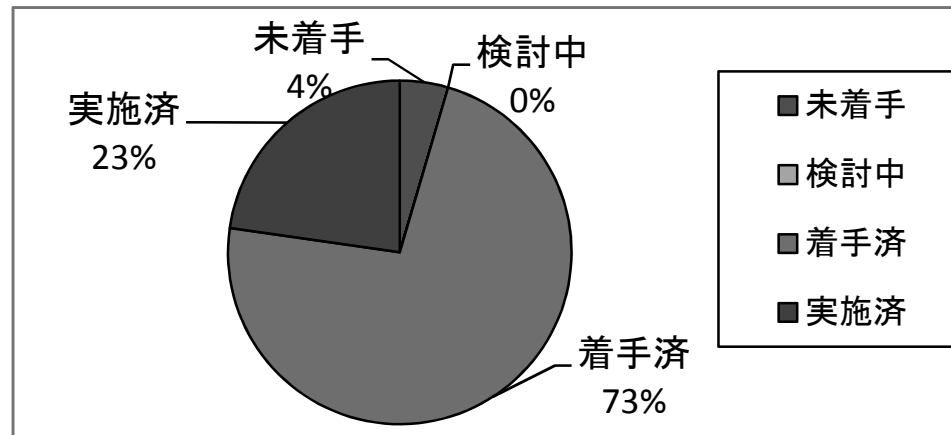

④防災まちづくり

進捗状況	事業数
未着手	1
検討中	1
着手済	26
実施済	12
計	40
整理・統合等	2

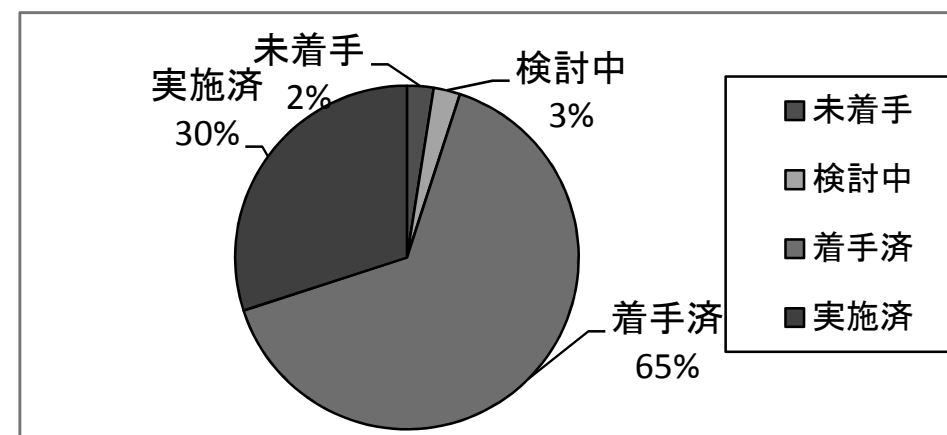

	事業名	事業概要	事業主体	事業期間	進捗状況	復興交付金	現状と課題	全体計画						事業費(千円)												担当課
								事業費(千円)	財源内訳					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度			
									国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源													
38 ◎	被災学校復旧事業 (津波)	津波により被災した大船渡小学校及び綾里小学校の補修	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	155,598	138,079				17,519	103,518	43,155	8,925									生涯学習課	
39 ◎	被災学校復旧事業 (地震)	地震により被災した日頃市小学校、第一中学校、末崎中学校及び越喜来中学校の補修	市	H23～H24	実施済		【現状】 ・工事終了 【課題】 ・特になし	69,435	40,780				28,655	55,195	14,240										生涯学習課	
40 ◎	被災給食施設復旧事業	被災した赤崎学校給食共同調理場の復旧と併せた北部学校給食センターの整備	市	H23～H25	実施済	有 ※有	【現状】 ・平成26年3月に北部学校給食センター建設工事終了→「炊き出し」機能を付加 【課題】 ・特になし	888,819	72,865		433,500	132,439	250,015		26,759	862,060									生涯学習課	
41 ◎	学校施設防災機能強化事業	旧耐震基準の学校施設の耐震補強工事などを実施 ・盛小学校:屋内運動場 ・末崎小学校:校舎 ・蛸ノ浦小学校:校舎、屋内運動場 ・猪川小学校:校舎、屋内運動場 ・日頃市小学校:校舎、屋内運動場 ・大船渡北小学校:校舎、屋内運動場 ・綾里小学校:屋内運動場 ・第一中学校:屋内運動場 ・綾里中学校:校舎 ・越喜来中学校:校舎、屋内運動場	市	H23～H30	着手済		【現状】 ・「大船渡市立学校施設耐震化整備計画」を策定し、対象施設の耐震第2次診断等を実施中 【課題】 ・校庭に応急仮設住宅が設置されている学校での円滑な工事の実施	2,877,600	828,500		1,434,000		615,100				400,000	659,600	291,600	763,200	763,200				生涯学習課	
42 ◎	認定こども園整備事業	震災の影響により工事中止となった綾里こども園舎の整備	市	H23～H25	実施済		【現状】 ・工事終了(平成26年3月) 【課題】 ・特になし	293,013			263,400		29,613		15,721	277,292									生涯学習課	
施策ウ 被災した児童生徒などが、安心して就学できる環境を整えます。																										
追 12 ◎	仮設校庭整備事業	応急仮設住宅が建設されている学校における代替グラウンドなどの整備→9校(盛小、末崎小、蛸ノ浦小、猪川小、大船渡北小、第一中、大船渡中、末崎中、綾里中)	市	H24～H25	実施済	※有	【現状】 ・平成24年度:大船渡中学校の仮設テニスコート整備済 ・平成25年度:赤崎中学校の仮設テニスコート整備済、第一中学校、末崎中学校、盛																			

